


JOURNAL de FOUILLES
N° XX
du 18 Février 1948 au 12 Mars 1949
Page 77 suite Journal de Fouille
N° XIX
du 31 Octobre 1948 au 12 Mars 1949



XX

—

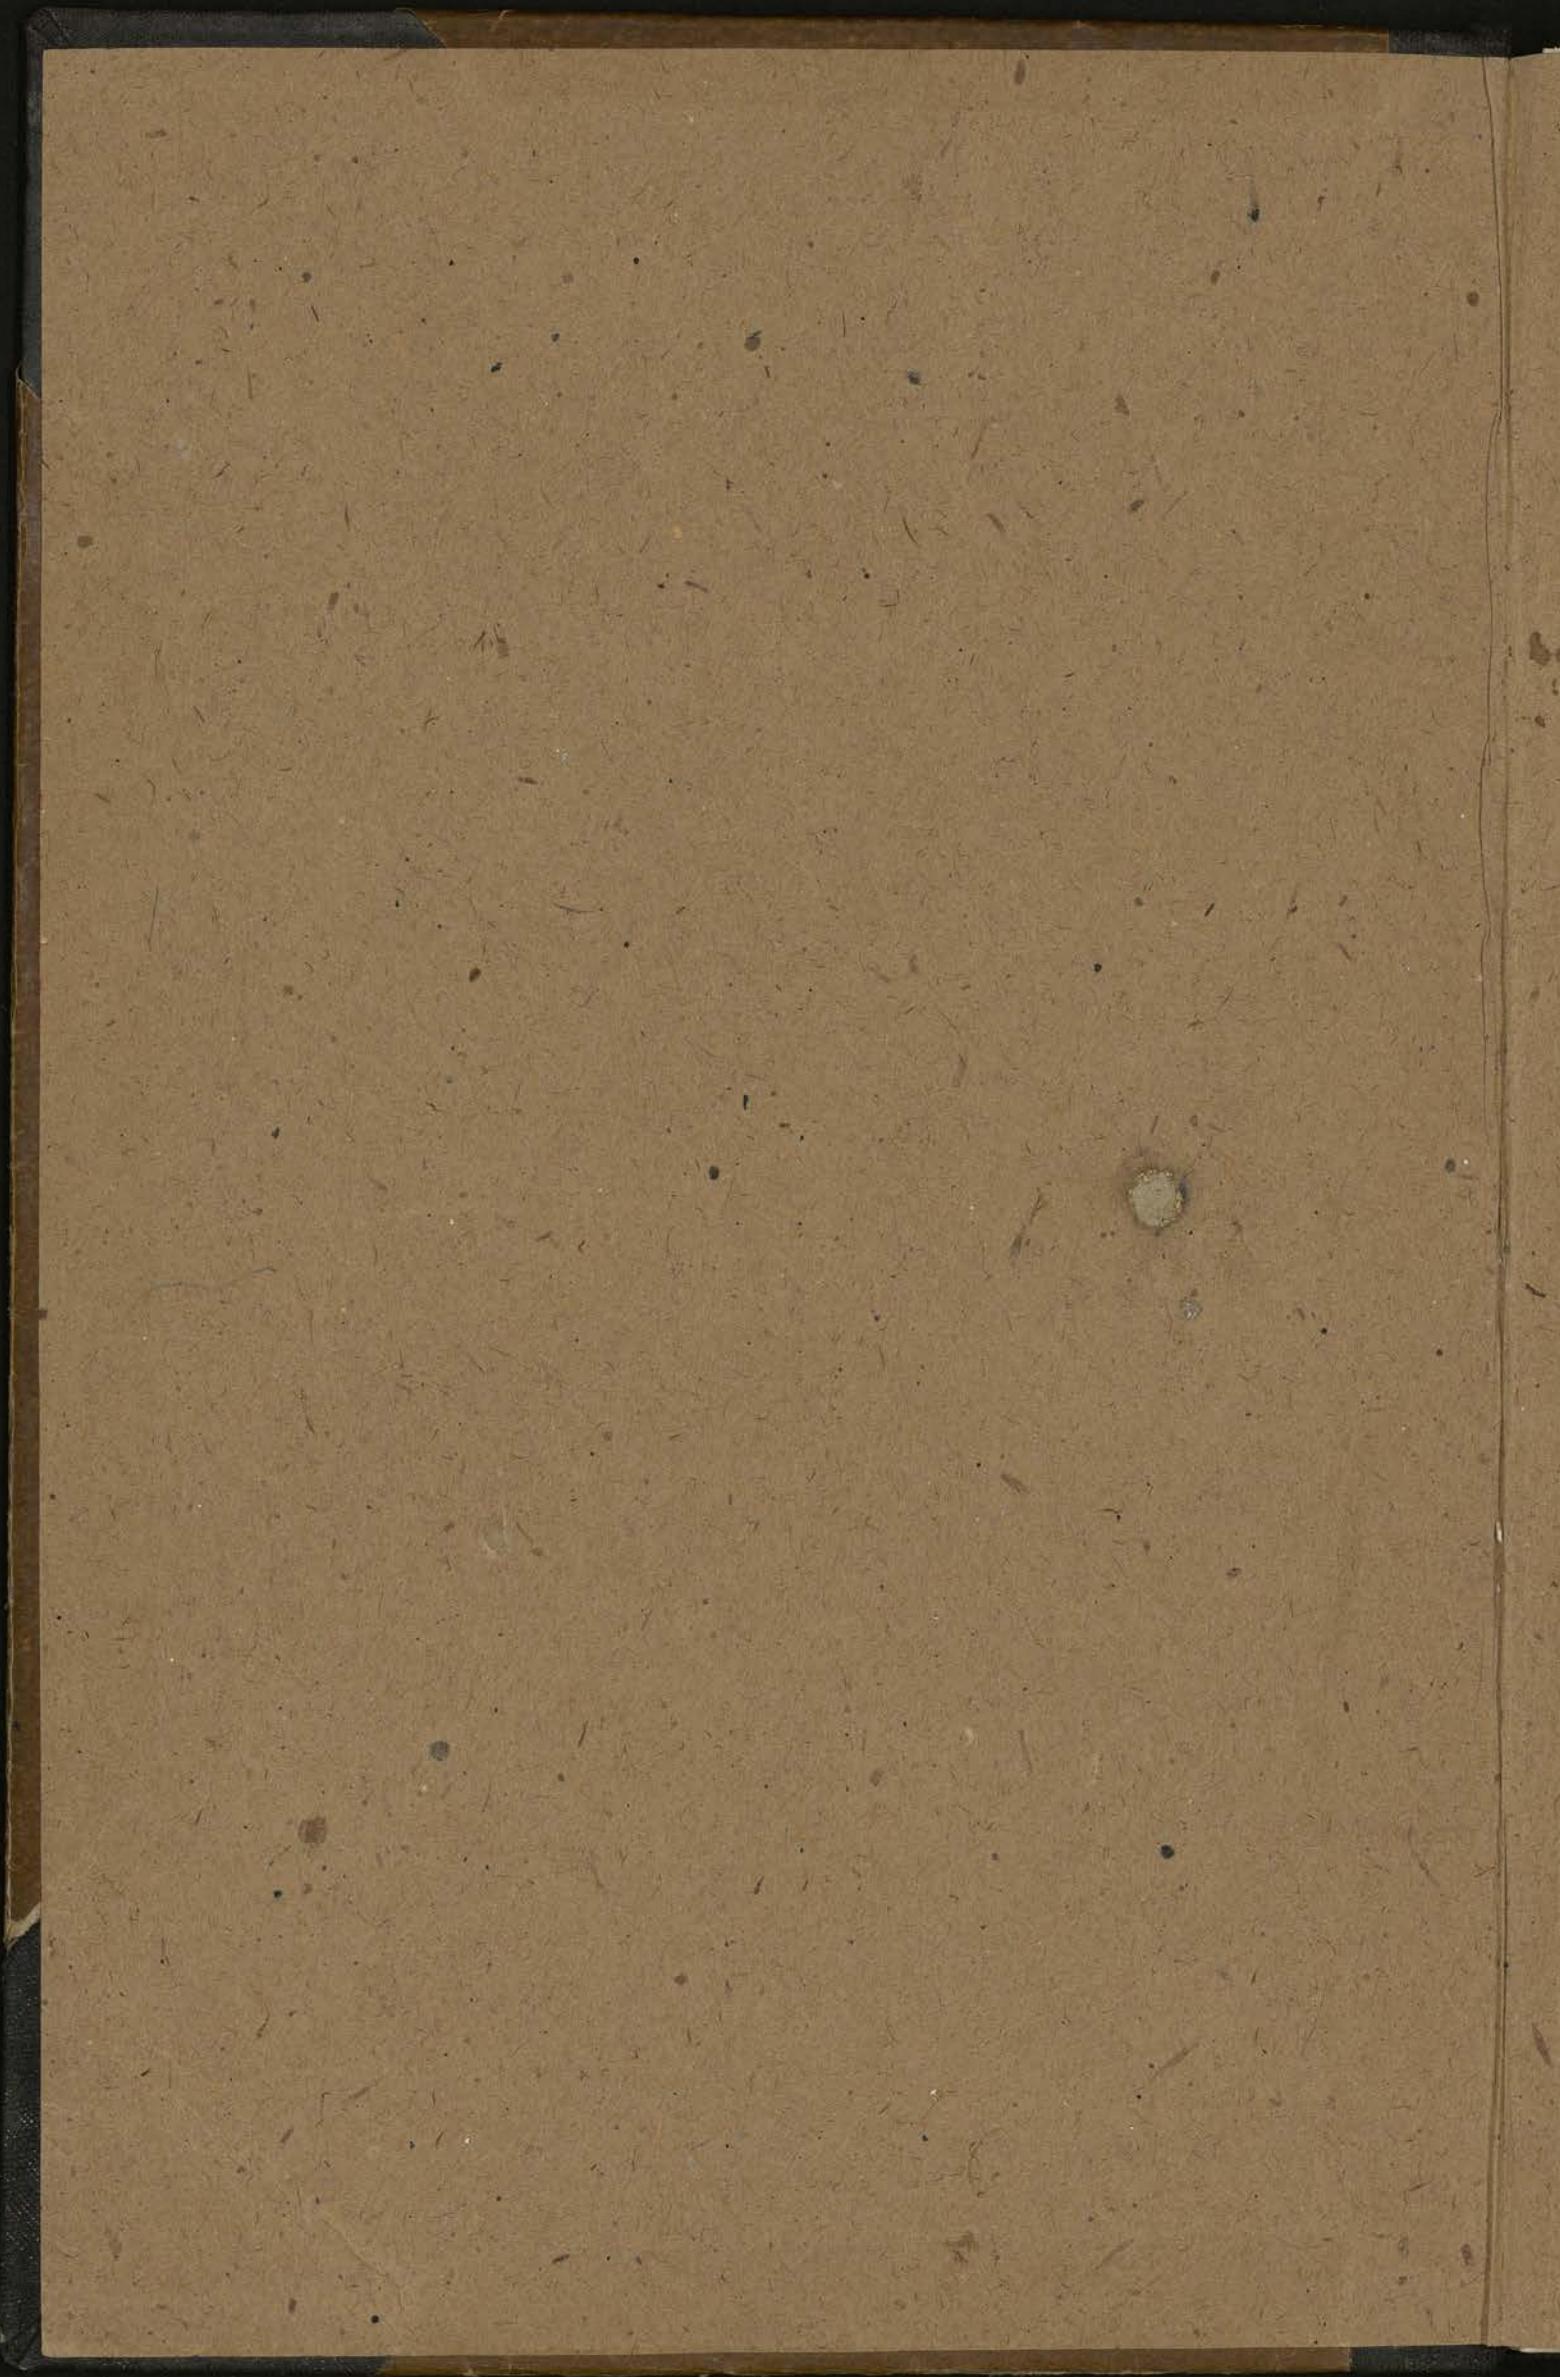

Journal de Fouilles
XX

1948

Suite du J. de F. marchal XIX à la
page 77

about 10 hours

XX

8481

to XIX hours in T do. T about 2

11 eggs

CONSERVATION D'ANGKOR

CAHIER DE FOUILLES DE M^E LAGISQUET

MOIS DE FÉVRIER 1948

arrivé de France à Saïgon le 3 février 48, M^r Mallaret m'a remis un ordre du Service du d^e de l'Ecole Française, m'encouragant de rejoindre Siem Reap pour conseiller M^r Marchal dans ses travaux -

Parti pour Phnom-Penh le 6 février, j'ai été retardé par les fêtes du Têt, et je suis reparti pour Siem Reap que le 16 février, arrivé à Siem Reap le 17 février à midi -

18 Février.

Visite avec M^r Marchal de ses chantiers :

Angkor Vat, Baphuon, Porte de la victoire, Terrasse du Roi Lépreux - Je ne donne pas le détail de ces visites, un compte rendu détaillé étant donné par M^r Marchal few in journal.

19 Février.

Visite avec M^r Marchal des mêmes chantiers que ci-dessus plus le Phnom-Bakeng. M^r Marchal me demande de prendre en charge le chantier de l'Angkor Vat -

20 Février.

ANGKOR-VAT. Avec M^r Marchal et M^r Brunet, nous allons au chantier d'Angkor Vat pour décider des mesures à prendre pour arrêter un pro-

27

gramme de travaux apres de consolider
les murs et pilier de la galerie Sud
cote Ouest qui menace de s'effrouler —

M^r Marchal indique que il est impossible
de déposer les pierres du bas relief pour
les remonter ensuite, car cela entraînerait
autant de dégats qu'un effroulement, et
nous nous rangeons a son avis, qui est
que il faut consolider le mur sans avoir
a le démonter —

Nous venons un programme qui peut se
résumer comme suit — :

1^e étayer solidement le mur des bas
reliefs avec des bois de charpente bou-
lonnés —

2^e déposer les pierres des voûtes sauf
la dernière assise. 3 assises a enlever
plus le couronnement — contreforts,

3^e placer des étais extérieurs au bâti-
nement, venant soutenir le mur des bas
reliefs — et trouver un système de
fermants ou de chainage pour soutenir
les piliers qui portent la voûte —

Il y a urgence a enlever les pierres des
voûtes et a élager solidement — des
étais déjà en place seront renforcés —

Dans l'après midi, au bureau j'arrête
un dessin d'étais en bois, et je passe
commande des bois a un entrepreneur de
la place — M^r TAN-KIM-SAN —

28 Février.

ANGKOR-VAT. Pendant que M^r Marchal va a ses autres
chouétiers, je m'arrête a angkor val et
finis en détail la galerie Sud côte

3

ouest, où l'on est en train de travailler -
je fais les constatations suivantes, qui confir-
ment les observations déjà faites par M.
Marchal dans ses rapports de décembre et
janvier 48 -

Voir dessin de la galerie Sud partie Ouest
Joint au rapport de janvier -
Si l'on se place face à la galerie, regardant
vers le Nord on constate :

je rappelle que la galerie a environ 93^m.60 et
est composée de 39 travées de 2^m.37 environ.

En commençant par la gauche :

1^o) 10 travées - la fente située à 1^m du sol
C. ad. à la 2^{me} arche en partant du sol est très
peu accusée - la route côté bas relief est un peu
descendue - Infiltration d'eau assez accusée
à la 10^e travée -

2^o) de la 10^e à la 20^e travée, fente située à
1 mètre du sol peu marquée - 1 millimètre
environ - route côté bas relief descendue -
Infiltration d'eau à la 20^e travée -

3^o) de la 20^e à la 28^e travée - semble être
la partie la plus mauvaise et qu'il y a
l'air d'élargir d'urgence solidement -

Le joint de 1 mètre de haut-eau qui part de
1 mil. de large atteint ensuite 4 et 5
millimètres de largeur - Les pierres de la
route côté Bas relief sont descendues de 20
à 30 centimètres -

4^o) de la 28^e travée à la 35^e travée : ou a travaillé
dans cette partie, on a redressé les pierres de la
route pour les rendre horizontales, on a ancré
les pierres entre elles et on a bouché avec du
béton le joint qui s'était formé entre les

(1) dans ces 7 travées joint à 1^m du sol ouvert de
4 millimètres environ - un tensiomètre placé en juillet 1947
montre un mouvement de la partie supérieure des pierres -

les 2 pierres des voutes de la 20^e travée en partant du haut - à vide pour enchoir atteint 30 centimètres - comme ces pierres étaient jointives au début, cela veut dire que la voute s'est ouverte de 15 centimètres de chaque côté - ^{et dans la partie précédente,}
~~inclinaison des murs et des piliers -~~ Dans cette partie, j'ai vérifié que le mur du bas relief s'est penché vers l'extérieur et présente une inclinaison de 8 à 9 centimètres - Mesure prise de la corniche au sol - (sous corniche) - mesure pris à la 26^e travée -
Au même enchoir les piliers intérieurs qui mesurent 3m. 08 de hauteur, présentent une inclinaison sur leur hauteur de 10 cm vers l'extérieur de la galerie - et les petits piliers extérieurs présentent par enchoir une inclinaison de 13 centimètres sur 1m. 70 de hauteur ce qui est énorme -
5% de la 35^e travée à la 39^e travée -
4 travées à peu près intactes - joint à 1m du tel les peu ouvert - voutés en place -

Conclusion. La partie la plus démodée qu'il ya lieu d'élayer solidement se trouve entre la 20^e et la 28^e travée -

Je demande à faire renforcer les étai provisoire placés à l'intérieur de la voute et à l'extérieur du bas relief -

Piliers Tous les piliers sont creux ne sont pas inclinés de la même façon - en partant de la gauche - on constate que le premier est incliné de 1cm, les 2 autres tout inclinés

(5)

de 3 cm — le quatrième de 4 cm — puis cela augmente pour aller dans la partie la plus au sud avec une inclinaison de 9 à 10 cm — 11 cm au 120 piliers — 9 cm au 15° et au 18° pour ne plus avoir que 2 cm — au 30ème pilier — le 3ème pilier en partant de la droite est à peu près vertical —

Ces piliers intérieurs se sont enfouis de 8 à 10 centimètres environ du fait des nouvelles fondations — par rapport aux petits piliers extérieurs —

A noter que l'inclinaison du pilier intérieur entraîne la demi-voute et que cela entraîne l'inclinaison du petit pilier — il est donc impossible de renverser le petit pilier extérieur sans toucher à la demi-voute et au pilier intérieur —

Il pourrait être utile de faire dresser par le dessinateur un tableau de l'inclinaison de tous les piliers —

Ecartements des murs des Bas-reliefs mesurés à l'extérieur
Si on regarde le mur de la galerie en se plaçant le dos au nord et au partant au sud droit on a : 12° travée = 3 centimètres
16° travée : 6 cm 5, 21° travée : 8 cm 5
mesure prise sous corniche. Sur une hauteur de 4 m environ —

Autres galeries, je fais le tour des autres galeries pour essayer si je y a bien de craquelé le même phénomène que dans les galeries Sud — 19° galerie Est (côté Sud) 5 couleuvrins d'un importants qui abiment les bas-reliefs — route en bon état — pas de fissure à 1 m du sol —

6/

les écoulements d'eau vers l'intérieur semblent provenir de 2 causes : 1^o fissure dans la corniche extérieure 2^o manque de couronnement sur la voûte extérieure - 2^o galerie Est côté Nord. 2 infiltrations comme ci-dessus - le reste en bon état - 3^o galerie Nord côté Est : 1 grande infiltration - le reste bon état - 4^o galerie Nord côté ouest : 2 infiltrations - le reste bon état - 5^o galerie Ouest côté Nord - Bon état pas d'infiltrations - 6^o galerie ouest côté Sud - pas d'infiltrations bon état - quelques fissures verticales à boucher près de l'angle Sud-Ouest -

22 février

Repos.

23 février

Auxton Vat -

Visite du chantier d'Auxton Vat - toute l'équipe est employée à déplacer l'échafaudage et ensuite commence à déposer les pierres supérieures de voûte de la 27^{me} travée -

Louren écrit à Mr Paul Lévy au sujet des travaux en cours -

Visite de la Conservatoire reporté au sujet d'une demande du nouveau Colonel qui devra habiter cette bâtiment -

Utilité de faire poser des serrures, et de terminer l'installation électrique et les canalisations d'eau -

24 février

Visite des chantiers avec Mr Marchal : P^{te} de la victoire

Baphûon, Angkor Vat -

Angkor Vat

on a commencé à descendre à terre les pierres des voûtes de la 27^e travée - depuis hier 14 blocs de pierres sont descendus - les pierres du côté des murs des bas reliefs sont descendus dans la cour intérieure - et les pierres du côté des piliers sont descendus dans la galerie -


Prise de ³ photos par chine de la voûte en cours de dépose -

je calcule que dans une travée il y a environ $5 \times 7 = 35$ blocs de pierres - et qui il faudra environ 3 jours pour enlever les pierres d'une travée - pour les 8 travées en mauvais état il faudrait donc de 24 à 30 jours -

Nécessité de faire marquer la date des témoins à l'encre de chine par le deminat -

l'indique à Soun de qui elle fait, il y a lieu de marquer les pierres descendues -

Il faut que chaque travée ait une lettre A, B, C etc... qui sera reportée sur les pierres de la travée correspondante - et il faudra marquer cette lettre sur la travée elle-même - Ensuite chaque pierre sera marquée par 2 numéros - indiquant sa position par rapport aux autres - j'ai demandé aussi à ce que toutes les pierres d'une travée soient groupées ensemble -

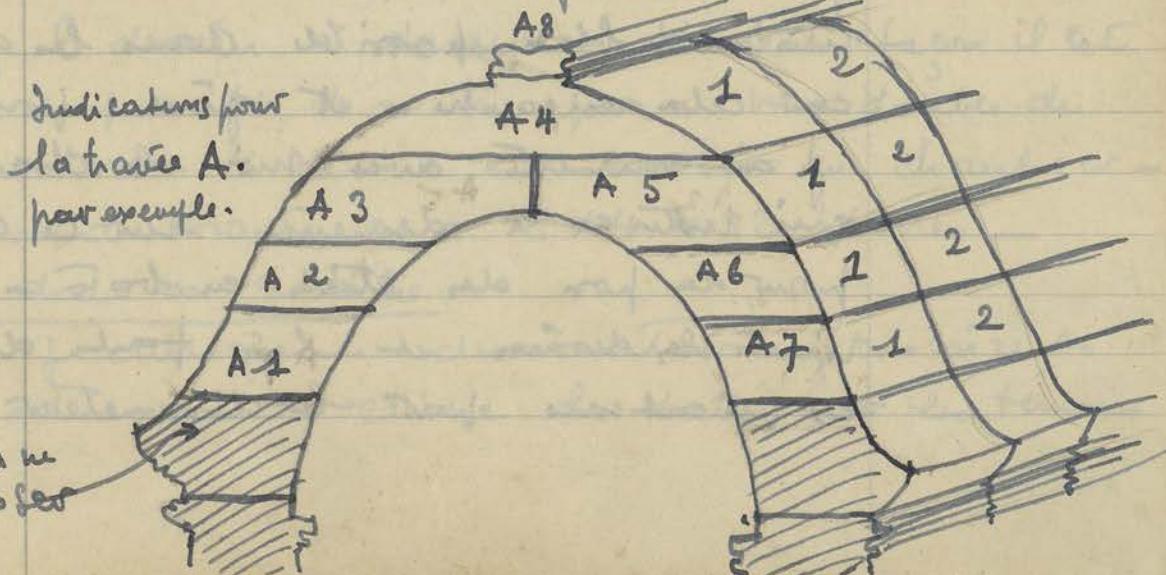

8)

25 Février

J'accompagne dans leur visite des Ruines,
M. Bate sculpteur, M. Couteau administrateur,
et une élève architecte -

Visite du Bayon, terrains du Roi le Preux
Pranh Pallay, Palais Royal, Battambang.
Rien de particulier à signaler -

Travail de bureau. J'appris hier pour mettre
au point les dessins des couloirs à faire
à Angkor Vat. (galerie Sud côté Ouest)

26 Février

Angkor Vat

Transport au chantier d'Angkor Vat des
petits bois destinés à la pose d'étais solides
contre le mur de bas relief -

Transport au même endroit de boulons
prêté par M. Brunet (T.P.)

Il y a lieu d'acheter pour notre magasin
du ciment, des boulons, des ferrures
afin de ne pas être toujours obligé à
l'emprunter aux T.P. -

On continue à enlever les pierres de la 24 et
26^e travée - (faire remettre les travées sur
place par des volontaires) -

Côté court on a descendu 37 blocs


Côté galerie " 19 blocs

Total 56 blocs -

Je demande au caporal de descendre le
moins de blocs possible dans les galeries
car cela encombre et gêne pour étaguer -

J'ai emmené avec moi le charpentier
qui reste à demeure sur ce chantier
pour la pose des étais en bois - Je lui
remets les dessins et lui fait dormir des
escales carées par le dessinateur -

(9)

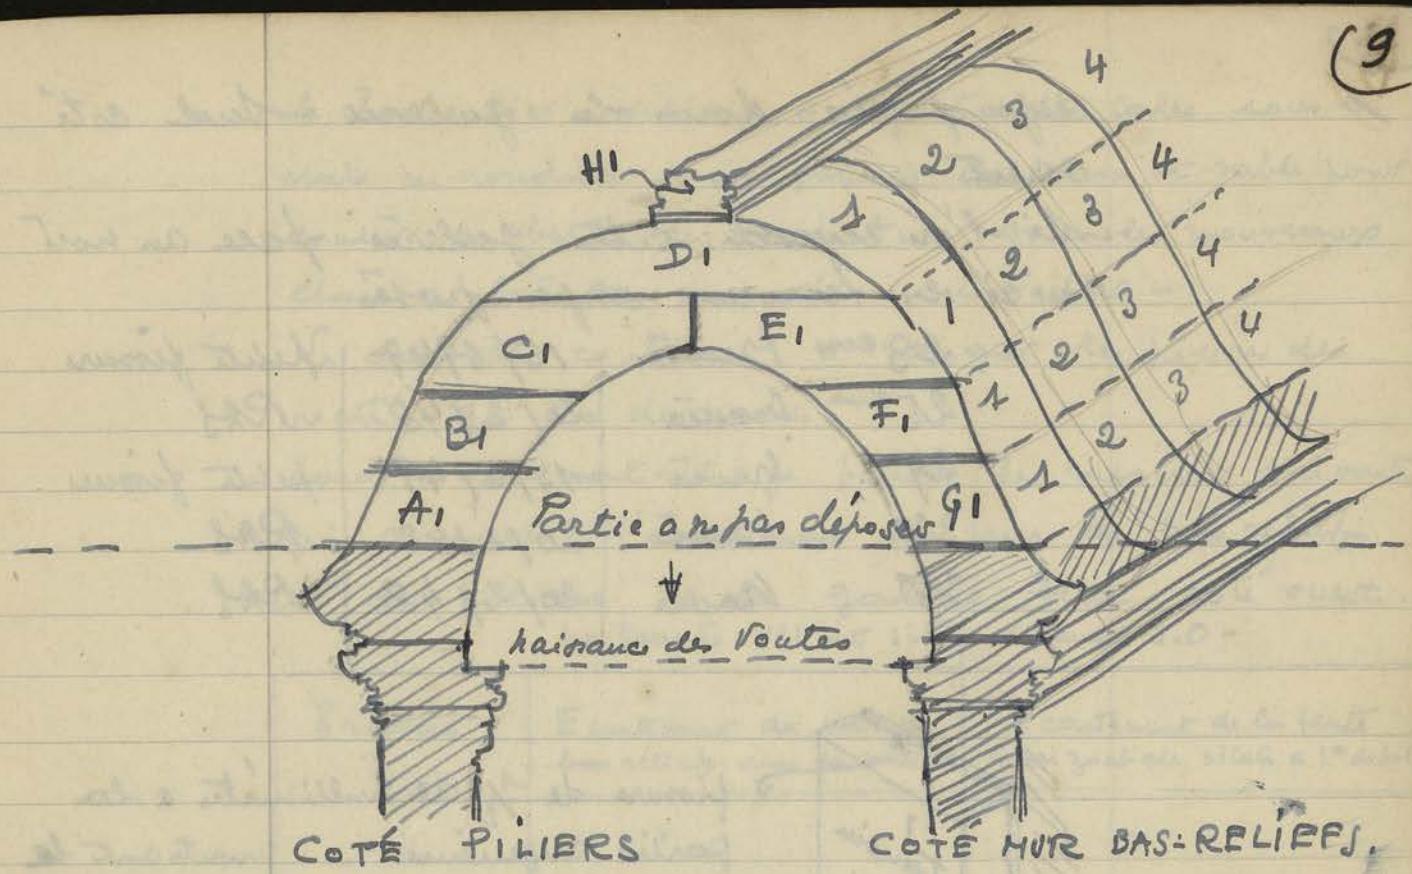

En attendant que le menuisier ait tous ses bois
je lui donne des indications pour couvrir les
étais provisoires en bois - pose de cales à la
partie inférieure -

Numérotage des pierres des routes - Je constate que le caporal
n'a pas suivi mes suggestions pour le numérotage
des pierres des routes que l'on dépose -
je fais arrêter la dépose des pierres - de façon
à bien ranger au sol toutes les pierres des
routes - en placant en premier les pierres basses
puis les autres -


Je revois le numérotage et charge le dessinateur
de numérotier les pierres à l'encre de chine selon
le dessin ci-dessus - de cette façon il est
impossible de se tromper - une double du
dessin ci-dessus est laissée au chantier -
une travée on a $8 \times 4 = 32$ pierres -

Témoins dans la galerie
je charge le dessinateur d'inscrire à
l'encre de chine les dates sur les témoins

10/ déjà posés dans la galerie Sud côté ouest -

Si l'on regarde cette galerie face au nord voici les témoin déjà posés

23 ^e travée	15/6/47	petite fissure
25 ^e travée	20/2/48	RAS
29° travée	15/6/47	petite fissure
38° travée	20/2/48	RAS
15° travée	20/2/48	RAS.

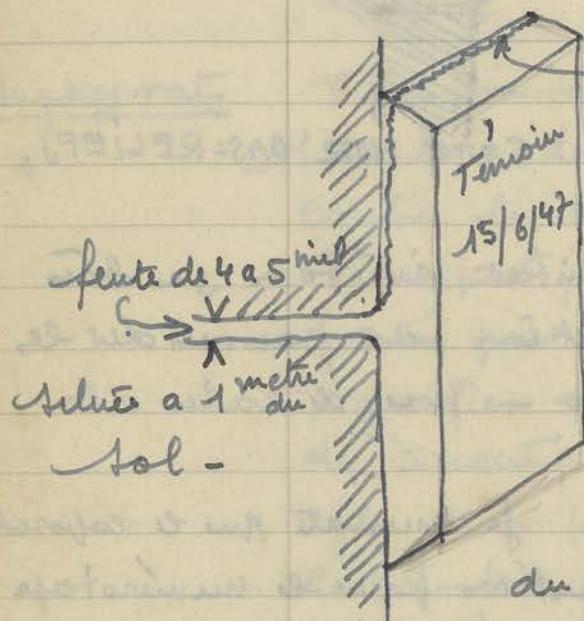

fissure de $\frac{1}{3}$ de millimètre à la partie supérieure — montreant le mouvement de la partie supérieure du mur par rapport à la partie basse —

Les 2 témoins placés le 15/6/47 à la 23^e travée et à la 29^o travée, à 1 m du sol présentent une légère fissure comme cela est indiqué sur le dessin ci-dessus —

Je donne des instructions pour la pose de nouveaux témoins aux travées :

2, 12, et 20 —

nécessité de commander des fer plates de 4 a 5 cm de large sur 0,005 d'épaisseur —

27 février

Banteay Kdei — Dans l'après midi du 26/2, j'ai accueilli —

Ta Prohm — nos Bat et coutoum à Banteay Kdei et à

Ta Prohm — Rien de spécial à signaler

Angkor vat — Dans la matinée, nous transportons à Angkor vat des pièces de bois 12x18 pour les étais, et du ciment —

le charpentier continue à apporter des cales sous les clés en rondins - on prépare cailloux et sable pour couler le béton de fondation sous les nouveaux clés au bout que nous allons installer -

Le cabosse continue à ranger les pierres des routes qui va descendre -

avec le démarreur je prends les mesures suivantes qui document l'écartement du mur des bas reliefs et des piliers à la galerie sud côté ouest.

La travée N°1 est située à l'angle S.O -

Travées num.	Ecartement du mur des bas reliefs avec la verticale	Ecartement de la fente horizontale située à 1 ^m du sol.
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	3 mil	0
6	3 mil	0
7	3 mil	0
8	3 mil	0
9	5 mil	0
10	2 cm	1/2 mil -
11	3 cm 5	1 mil 5
12	5 cm	2 mil
13	3 cm	1 mil .
14	2 cm	1/2 mil
15	2 cm 5	1/2 mil
16	3 cm	1/2 mil
17	4 cm	1/2 mil
18	5 cm	1/2 mil
19	7 cm 5	1 mil 5
20	6 cm	1 mil
21	6 cm	1 mil 5
22	6 cm	2 mil -

K2

	Brouées	Ecartement mur	Ecartement fente réduite à 1 ^m du tel.
	23	7 cm 5	2 mil
	24	8 cm	2 mil
	25	7 cm 5	3 mil
Travée en cours d'ouverture (trouée)	26	5 cm 5	2 mil 5
Travée démontée (route)	27	6 cm	4 mil
- d° -	28.	6 cm	4 à 5 mil.
Route réparée	29	4 cm 5	4 à 5 mil
- d° -	30	4 cm	3 mil
- d° -	31	5 cm	1 à 2 mil
- d° -	32	2 cm 5	1/2 mil
- d° -	33	1 cm	1/2 mil
- d° -	34	1 cm 5	1/3 mil
- d° -	35	1/2 cm	1/3 mil
pas touchée	36	1 cm	1/3 mil
- d° -	37	5 mil	0
- d° -	38	1 cm	0
- d° -	39.	0	0

Nota l'écartement maximum du mur se trouve aux travées 18 à 29 allant de 5 à 8 cm environ - l'écartement maximum de la fente se trouve aux mêmes travées allant de 1 millimètre à 5 millimètres -

Piliers

je mesure ensuite l'écartement des piliers grands et petits - par rapport à la verticale je rappelle que les grands piliers ont 3^m.05 de hauteur , et les petits 2^m.16 - les dimensions du tableau sont prises tous les chapiteaux C. a. d. pour des diamètres de - grand pilier = 2^m.60 environ petit pilier = 1^m.60 -

Teravées ou piliers.	grands piliers - inclinaison vers l'extérieur en cm.	petits piliers - inclinaison vers l'extérieur en cm.
1	vertical	vertical
2	3 cm	vertical
3	1 cm	2 cm
4	4 cm	3 cm
5	6 cm	3 cm
6	3 cm	2 cm
7	4 cm	3 cm
8	5 cm	4 cm
9	6 cm	3 cm
10	3 cm 5	4 cm 5
11	2 cm 5	3 cm
12	4 cm	3 cm
13	4 cm	3 cm
14	5 cm	3 cm
15	2 cm	4 cm
16	4 cm	4 cm
17	4 cm	4 cm
18	5 cm	7 cm
19	6 cm	5 cm
20	6 cm	5 cm
21	9 cm 5	6 cm
22	8 cm	7 cm
23	10 cm	6 cm
24	9 cm	6 cm
25	11 cm	6 cm 5
26	9 cm	5 cm
27	11 cm	6 cm
28	8 cm	7 cm
29	9 cm	12 a 13 cm
30.	9 cm 5	11 cm
31	8 cm	10 cm

piliers	écartement des grands piliers	écartement des petits piliers -
7	32	7 cm
6	33	6 cm
5	34	6 cm
4	35	6 cm
3	36	3 cm
2	37	3 cm
1	38	4 cm.
Venant de l'Est	39	

Nota La aussi l'inclinaison maxima
part à la galerie 18 jusqu'à la galerie 32
de 5 cm à 11 cm écartement maxima -

Conclusion - les travées qui sont le plus
à l'aplomb sont les travées de 18 à 32 -
Ce seront celles où il faudra placer en premier
les échafaudages puis les contre-forts -

Inclinaison du sol de la galerie - le sol de la galerie
est incliné, du fait du bassement des
grosses piles - j'ai noté à la 32°
trouvé une différence de 4 cm sur 2 mètres
entre côté mur et côté pilier -

28 Février

Rédaction du rapport mensuel - on continue au
papier des bois à Angkor Vat - et à couler le
béton pour recevoir la base des étai en bois -

29 Février.

Repos.

1^{er} mars.

Angkor vat. En arrivant à Angkor vat un gardien
nous présente qu'un témoin s'est brisé
dans la galerie Sud ouest -

En réalité il s'agit d'un témoin qui s'est décollé -

Témoins

on a posé de nouveaux témoins à la galerie sud ouest aux travées (de piliers) suivantes:


— 1, 2, 7, 13, 14 décollé, 20 et 28 —

a faire dater par densimétrie sur place —

Fausse fenêtre

je n'abrogois que les fausses fenêtres ne correspondent pas à chaque travée de piliers -

Il y a 39 travées de piliers et 32 fenêtres. les dimensions des fenêtres ^{sont} très variables mais la dimension courante est la suivante. (voir croquis.) -

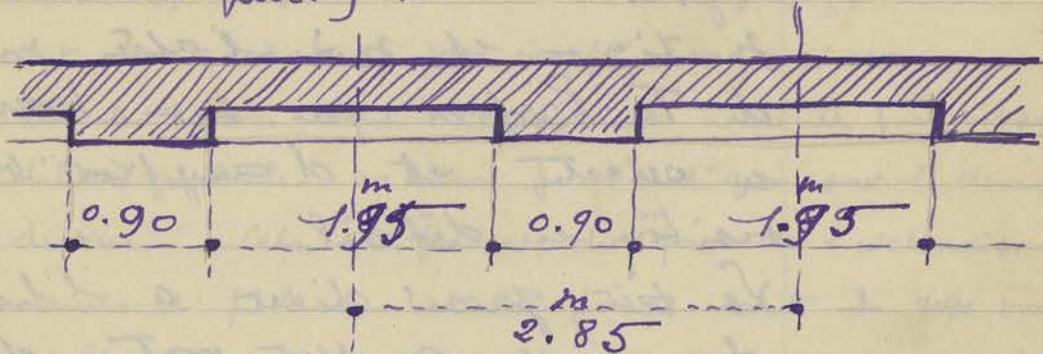

Ce qui donne 2^m.85 par travée, alors que pour le côté pilier la travée courante est de $1.94 + 0.48 = 2^m42$.

voici quelques dimensions de fausses fenêtres :
 $1.96 - 1.95 - 1.97 - 1.97 - 1.98 - 1.89$
 et de menuiseries : $0.90 - 0.89 - 1.00 - 0.87 - \dots$

Le menuisier a placé le premier étai en bois de charpente à la 28^e travée (fenêtre) ce qui correspond à la 28^e travée pilier toutes en partant de l'ouest - je fais confrir la colonne supérieure et demande à ce que le étai soit placé bien verticaux -

Enfin pour retenir la pièce de bois posée sur le béton ^{à fond.} je demande à ce qu'on remplace le piquet de bois posé dans le béton par 2 morceaux de fer rond de 0.02^{cm} de diam.

16/

4 semelles de béton de fondation sont déjà coulées — les coulés sont occupés à creuser les fondations pour couler le béton de fondation, à cause des cailloux et a chutes de table —

Il sera utile d'augmenter le nombre des coulés et de le porter à 12 au lieu de 10 —

Visiteurs.

L'amiral Boyd commandant l'escadre Britannique d'Extrême Orient et Mme Boyd ainsi que de nombreux officiers de marine Britanniques sont venus visiter Angkor — Mr Marchal les a fait visiter la matin — et moi l'après midi — visite de Ta Prohm que nous traversons d'Est en ouest et d'Angkor Wat que nous visiterons en détail —

Le soir grand dîner à l'hôtel suivi de danses à Angkor Wat devant le gabinete de Bas relief.


2 Mars.

Je traîne porte avec la camionnette du ciment et des pierres aux chantiers suivants : Porte de la Victoire, Baphuon, Bakheng — Angkor Wat

Angkor Wat. Le premier étai en bois de charpente et qui passe à la travée 28 (travée pilier.) on a posé en tout 3 étails puis — le 4^e est en cours — (en direction ouest) 8 bûches de fondation pour recevoir les étails sont terminées — le 9^e est en cours —

Je demande à ce que l'on pose des cales aux étai en rondins placés dans la galerie contre les gros piliers —

Je remarque que pour la partie de la route déjà réparée (travées pilier 29 à 35) les pierres A1, B1 C1, E1, F1, G1, H1, I1, n'ont pas été posées parfai-

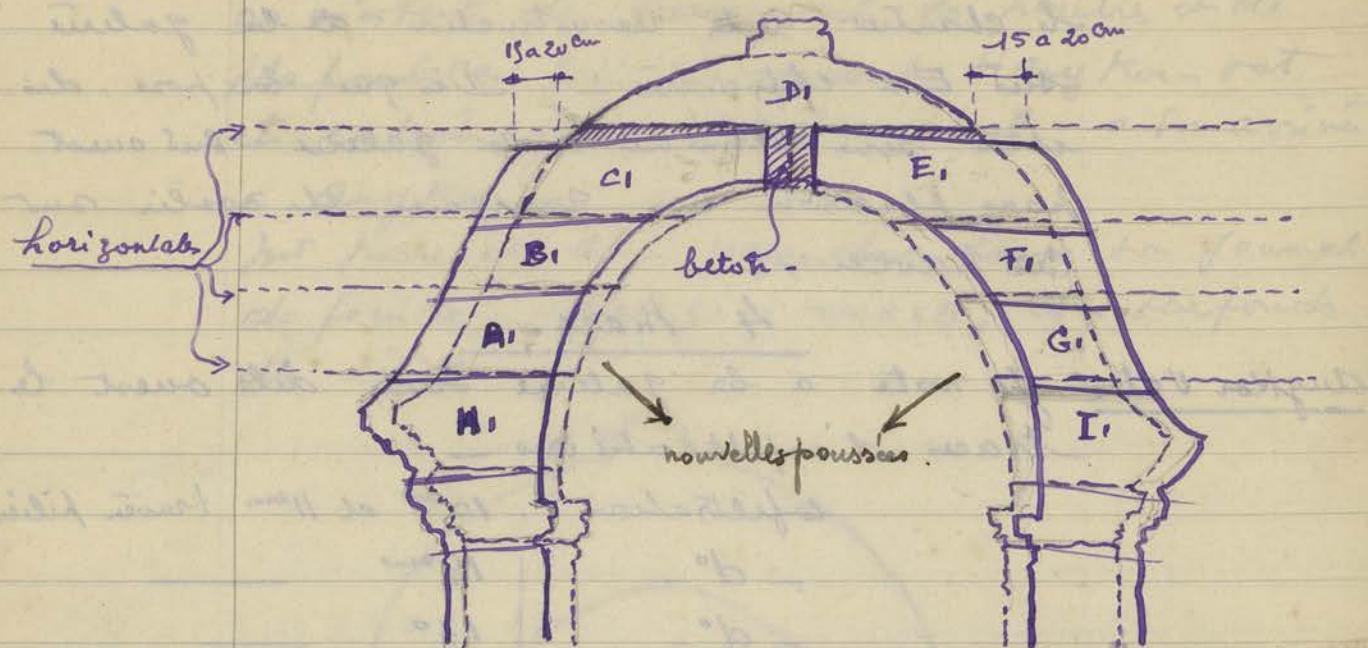

lement horizontale - j'ai vérifié avec un niveau - toutes les pierres sont légèrement inclinée par rapport à l'horizontale - comme je l'indique sur le dessin ci-dessus - Cela est fatal du fait de l'inclinaison des murs et piliers - et les joints sont \perp aux murs et piliers - mais de ce fait, on ne peut conclure que ces voûtes sont redevenues dormantes - et il y a certainement une poussée de voûtes sur mur et piliers - (mais dans le sens opposé à la poussée d'autrefois)

3 Mars.

Ruynkor Vat. Je donne des instructions pour que l'on place des étai de la travée 16 à la travée 31 (piliers) - mais comme les fenêtres sont plus large que les travées piliers cela fait en tout 14 fenêtres à étailler - j'indique sur place ^{de suite} les fenêtres à étailler -

Pour pouvoir reprendre la dépose des pierres des voûts sous arête le pose des étai - je prends 10 caillies supplémentaires sur ce chantier, que je préleve sur le chantier du gopura Ouest d'Ayukor Vat - Ces 10 caillies enlevées de ce dernier chantier seront remplacées demain - par de nouveaux caillies - je marquai moi-même la date 27/2/48 aux 6 témoins dont il est question, dans le journal du 1^{er} mars -

Avec soin j'étudie la possibilité de reprendre le chantier de la reconstruction de la galerie Sud Est effondrée - Dès que la pose des étaiis sera terminée à la galerie Sud ouest nous placerons une quinzaine de cales sur ces travées.

4 mars.

Angkor Vat. Je note à la galerie Sud ouest les traces d'infiltrations -

infiltration	10 ^{eue} et 11 ^{eue} travée pilier
- d° -	14 ^{eue} —
- d° -	17° —
- d° -	20° —
- d° -	22 à 26° —
- d° -	28 à 29° —
- d° -	31 et 32° —

Travées pilier - où les pierres des voûtes sont le plus en bascule : 21, 22, 23, 24, 25, 26 -

On continue à poser les étaiis en bois de charpente : 6 posé le 7^e en cours - dépose des pierres je fais redescendre les étaiis qui n'ont pas été posé bien verticaux - je fais acheter une clef pour servir les boulons -


5 mars.

Chantiers. Visite avec M^r Marchal des chantiers suivants:

Phnom. Bakheng, Porte de la victoire, Baphuon.

Angkor Vat. Je parle à M^r Marchal d'une solution qui permettrait dans la reconstruction de la galerie circulaire, (Sud Est) de poser des tirants en fer ou en béton armé, sans que cela se voit - pour cela il suffirait de construire de plafonds en bois, comme cela existait auparavant qui cacherait les tirants placés au dessus -

dans ce but, nous allons au dépôt de Bayon où existent des fragments de poutres et de plafonds en bois provenant d'Augkor - vat et enlevés pour par Marchal à son arrivée à Augkor -
Par Marchal doit rechercher dans son journal de fouille l'origine exacte, des morceaux du dépôt -

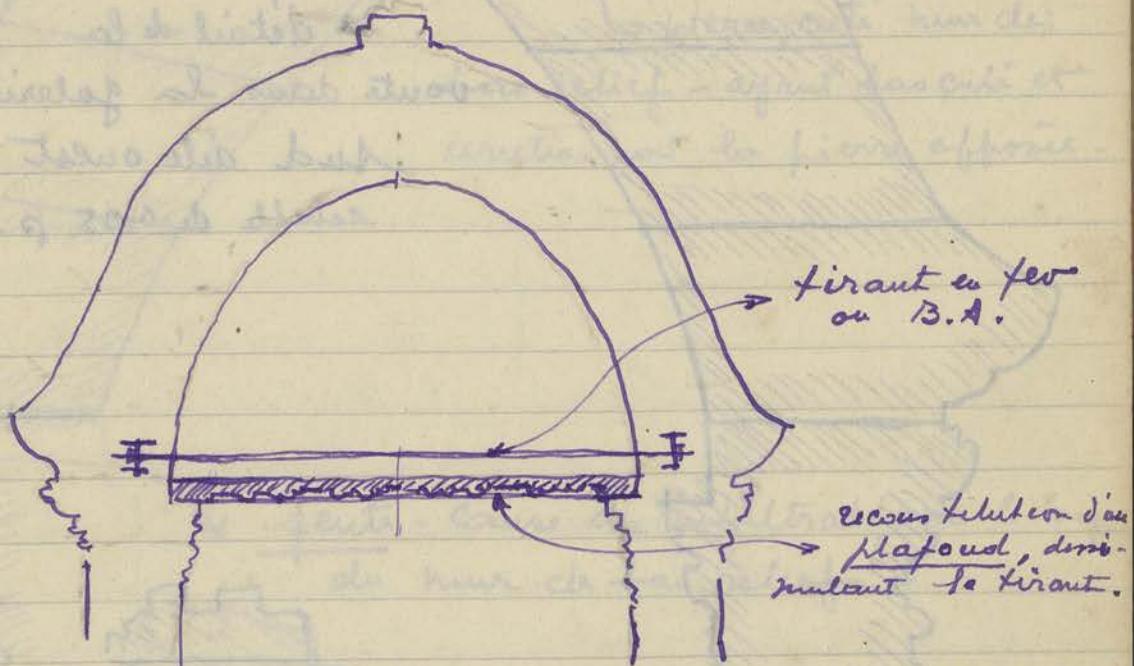


On continue la pose des étai en bois : 2 étai fermés - 3 nouveaux étais en cours de pose et l'on continue la dépose des pierres de la voûte à la 26° travée en numérotant toutes les pierres et en les rangeant par catégories, le reste à la suite des autres —


Voutes.

Je vérifie le relevé fait de la galerie -
Coupé à 0.05 p. M. et constate que le dessin n'est pas le même. dans la galerie sud ouest - et dans la galerie sud Est -
Dans la galerie sud ouest on trouve à la partie supérieure une partie horizontale de 90 cm environ - dans la galerie sud Est il n'y a pas de partie horizontale - voir les 2 dessins de la page suivante - je crois ensuite un dessin montant la bascule des pierres dans la galerie sud ouest et la fente cause des infiltrations -


20/

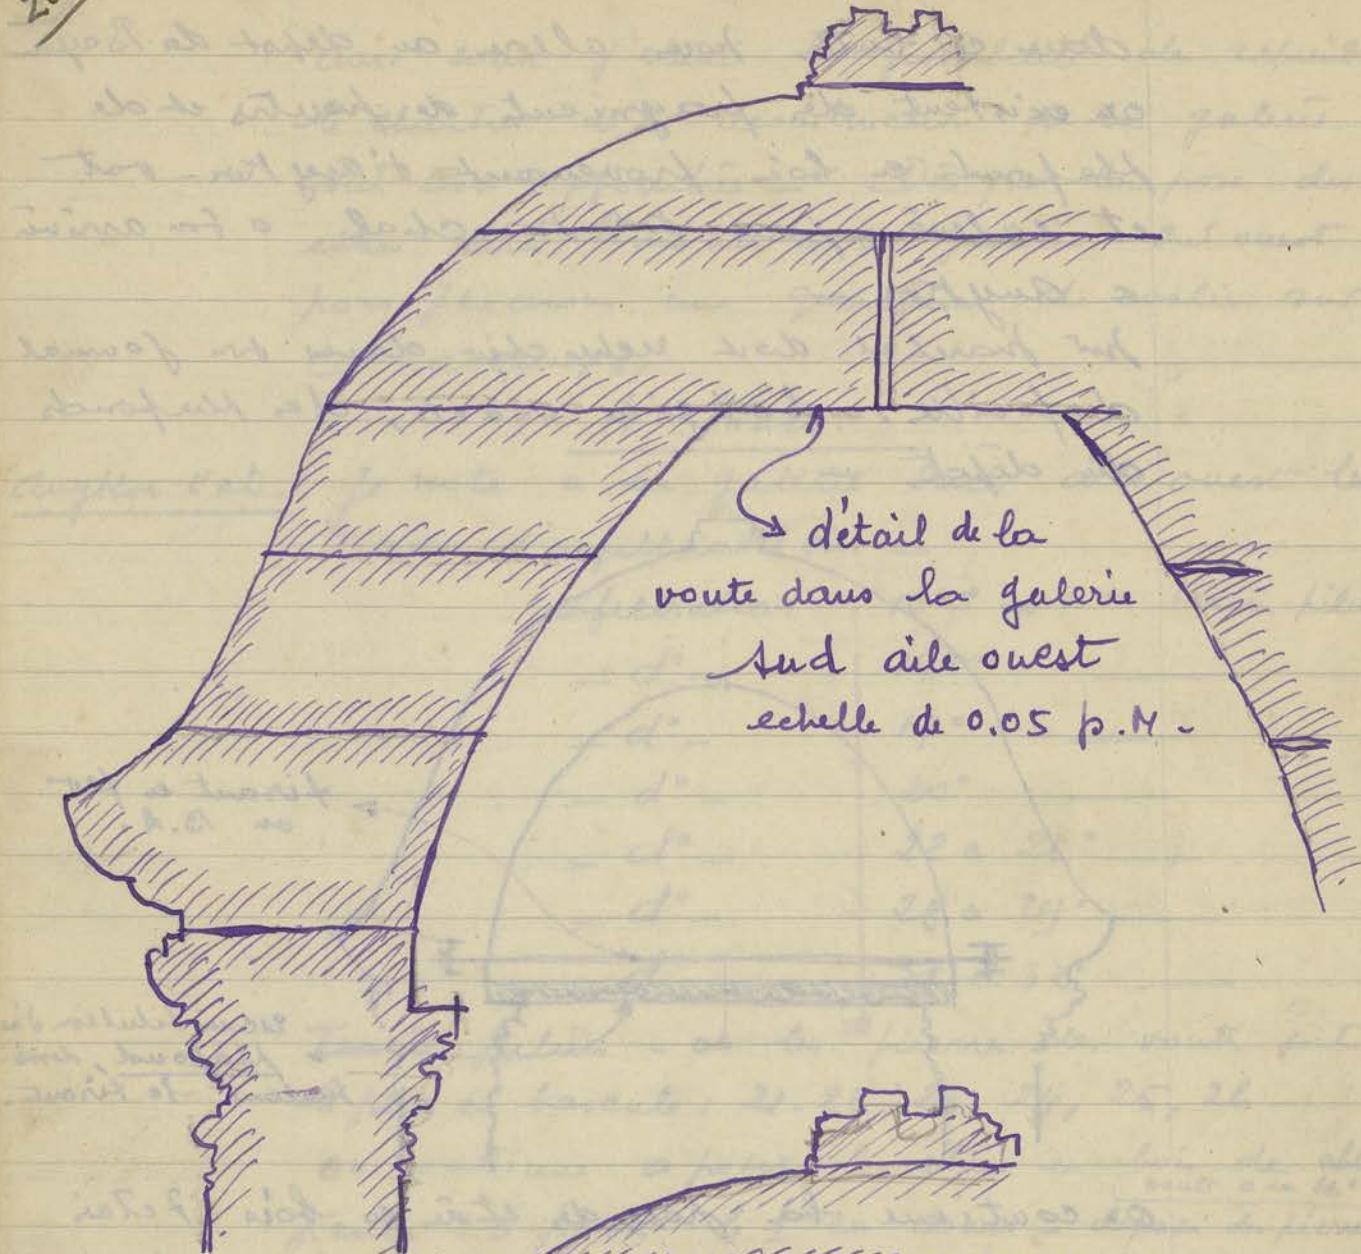

détail de la
voute dans la galerie
Sud aile ouest
échelle de 0.05 p.M.

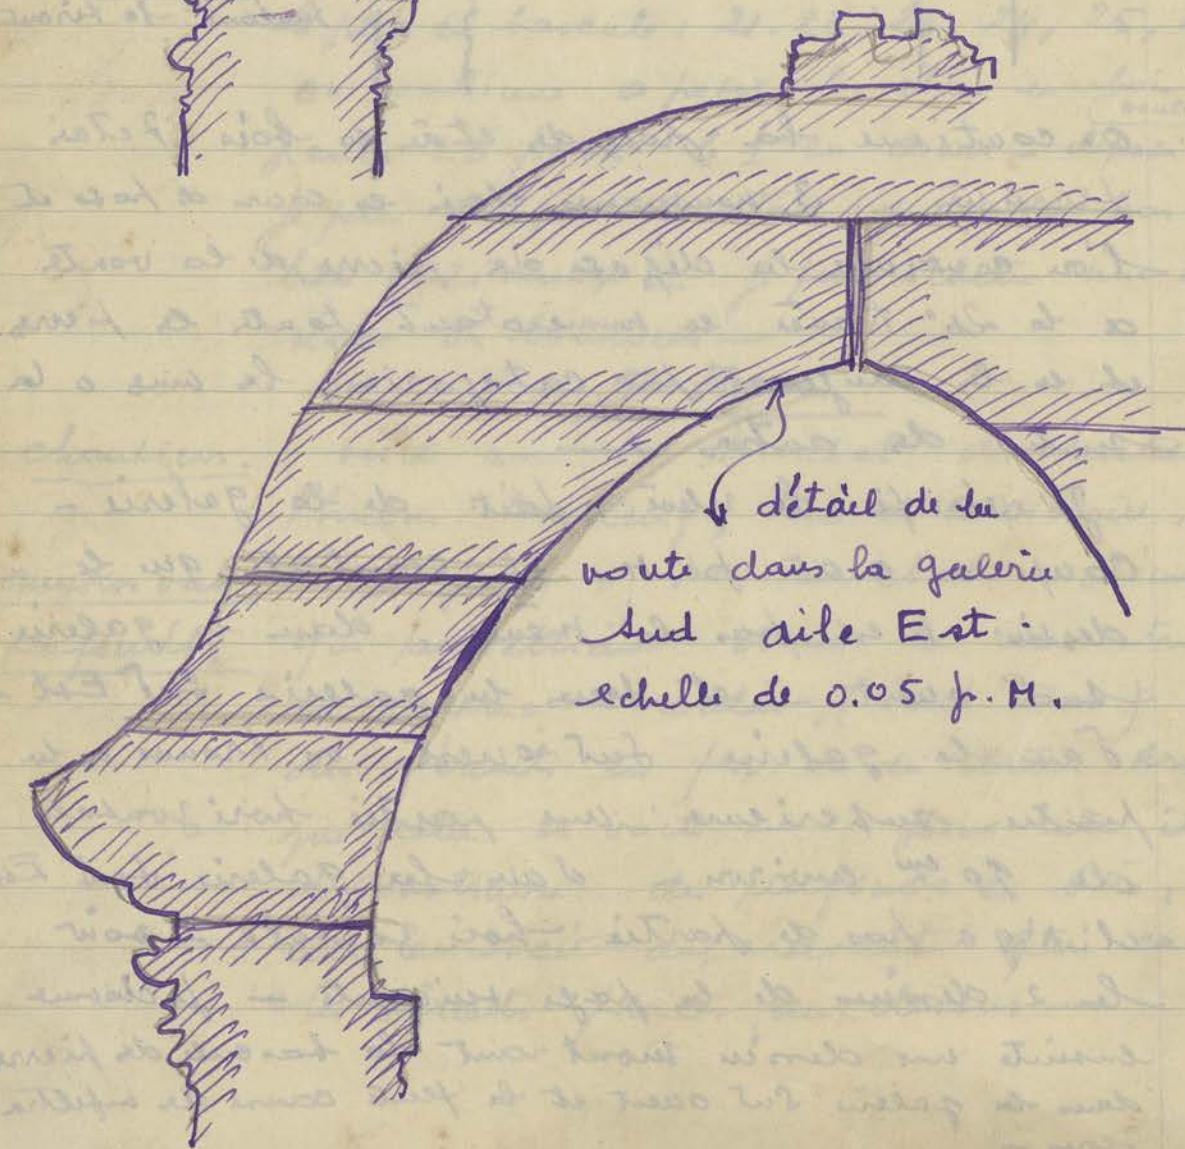

détail de la
voute dans la galerie
Sud aile Est
échelle de 0.05 p.M.

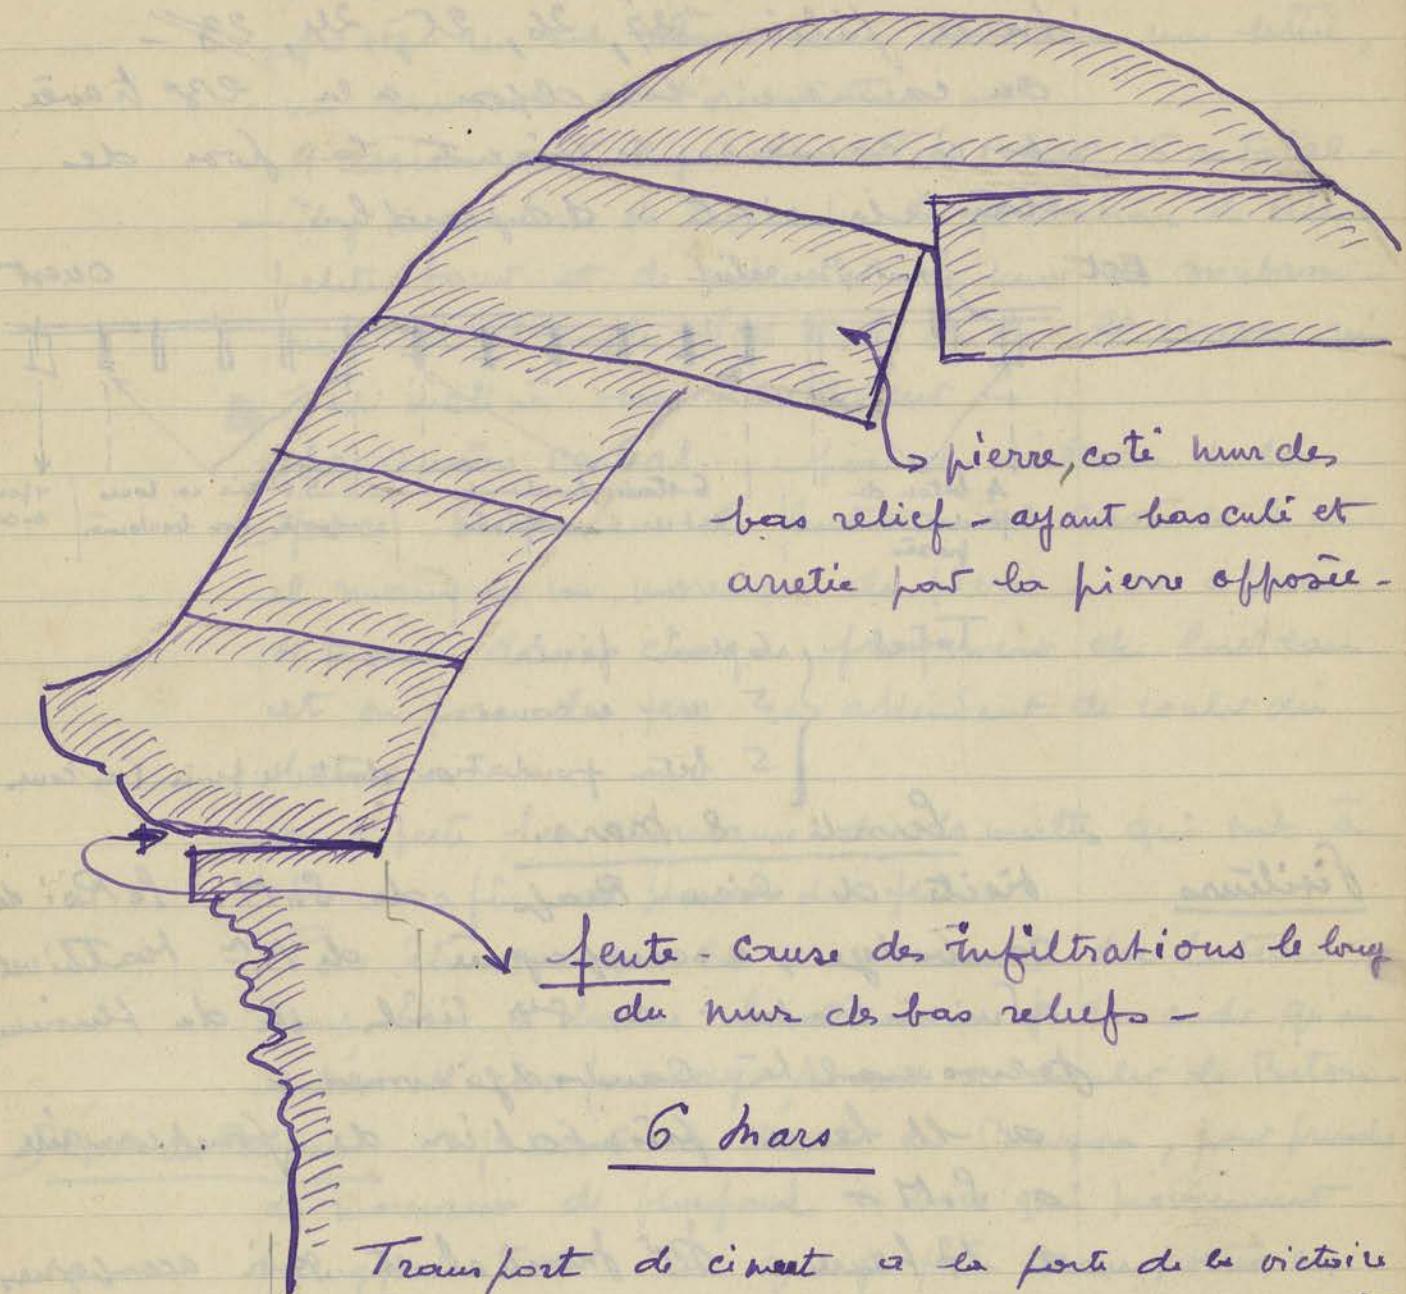

6 mars

Transport de ciment à la forte de la victoire au Baphoum, au Bretheng et à Augkor vat. Vente de l'oxygène pour faire le recuisement du fer et du ciment -

voici l'état du dépôt : fer roulé de 0,01 ^{ca} 150 à 200 mm

fer roulé de 0,02 fini

fer roulé de 0,15 fini

fer de 0,005 kilo } 2 rouleaux

fer de 0,008 kilo } de chrysos.

fer plat fini -

4 rails de 6 "^{me} pour wagonet


Ciment : Reste 83 sacs en magasin -

Augkor vat. Témoin Légère fissure au témoin posé
le 27/2/48 à la 13^e travée - aux autres RAJ.

27

Voute -

Dra a déposé les pierres de voute aux travées pilier 27, 26, 25, 24, ~~23~~ -
On commence à déposer à la 23^e travée -
Voici comment se présente la pose des
étais à la vîte d'aujourd'hui -

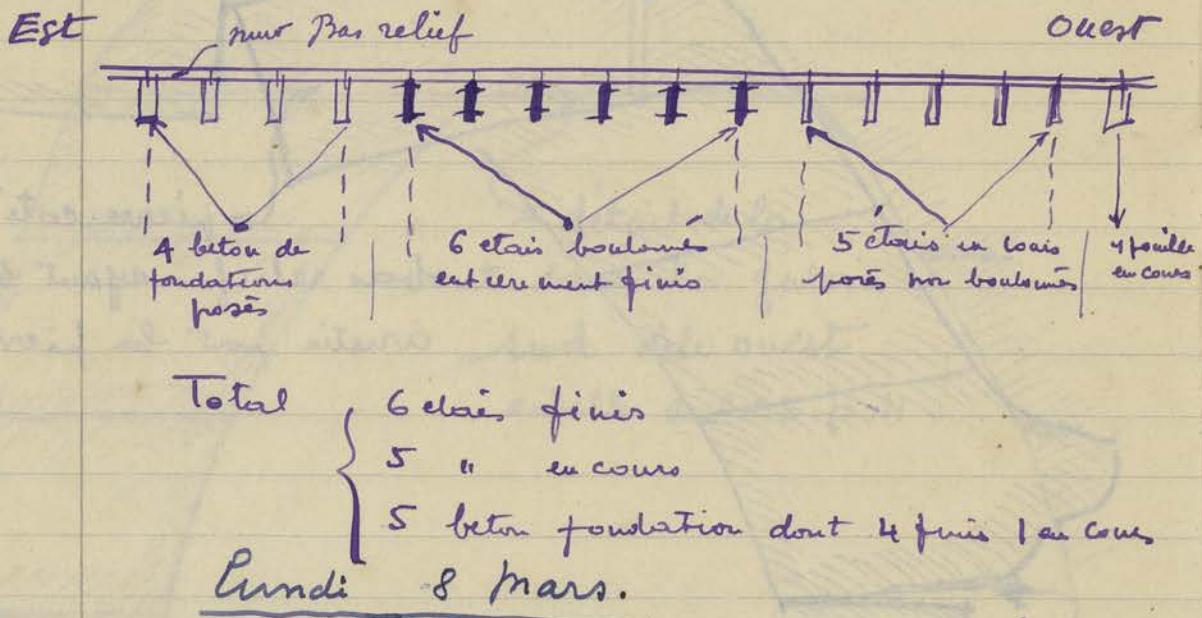Visiteurs

visite de Siem-Reap de S.M. le Roi du Cambodge, accompagnée de M^e Mathivat administrateur des sites khmers et de plusieurs personnalités cambodgiennes -

a 11 heures présentation de forest comme à S.M -

a 17 heures - Jour marchal et moi accompagnons S.M. au bouddha du Bayon, et à Angkor-vat - le soir prenent dîner suivi de danse à Angkor-vat -

du mardi 9 mars. au vendredi 12 Mars.

Royage à Phnom-Penh - avec nos marchands pour recueillir des ferrures et des outils divers.

Samedi 13 Mars.

Revenu seul de Phnom-Penh je visite les chantiers de M^e Marchal -

Phnom-Bakheng. On démonte la petite tour d'angle (Nord-Est) de la 20^e terrasse (en partant du haut) dont le sol s'est nettement tassé -

L.3

Les pierres de chaque assise sont démontées et posées au sol avec marquées avec un lettre, un numero - et l'orientation —

9 assises sont déjà démontées sur 15 au total -
Il y aura lieu de reprendre les fondations de cette
petite tour et de redresser le mur de 20 cm -
ment de l'angle Nord Est de la 2^e terrasse qui
l'est incliné vers l'extérieur —

Sanctuaire central : pose du linteau de la
face Sud — le linteau est cassé en 2 et
il manque un morceau de pierre - on a percé
4 trous dans chaque fragment du linteau
et on pose des fers en attendant de couler du
béton —

on a percé les morceaux de colonnettes qui tombent à
terre à fin d'insérer des fers —

Pour être sûr que les 2 morceaux du linteau
tombent bien à bonne hauteur - je demande qu'on
lève l'échafaudage avant de couler le béton —

Dépot du Bayon - je visite le dépôt du Bayon, pour prendre
des morceaux de plafond en bois qui proviennent
d'Angkor Vat - et que je fais transporter au
bureau pour en faire un relevé —

J'examine ce dépôt pour voir si on peut y
transporter les sculptures qui se trouvent à
l'ancienne conservation - Ce dépôt est bien
encombré - et d'autre part l'intérieur est très
sombre - et à mon avis il n'y a pas lieu de
l'encombrer davantage —

Baphuon : pose de gradins en latérite à l'angle Nord-
Est et renforcement de pieux à côté -
6 coolies travaillent au chantier - 9 sont allés
chercher des blocs de latérite et de bois —

Pt^e de la Victoire - le grand échafaudage qui se trou-


24

vait devant la porte côté ouest a été enlevé -
on dresse un petit escaut-pandage à l'intérieur
de l'enceinte côté nord pour remettre en
place l'éléphant tricéphale —

Amy Kot vat
Plafond en bois


Sous n'ayant signalé qu'un morceau de
plafond en bois restant encore en place dans
la galerie du gopura ouest d'amphor vat —
je me rends sur place et le fais déposer, afin
d'en prendre des photos et d'en faire un
rélevé — Il s'agit d'une planche de 0^m.30
de l'arête environ et de 2^m.85 de longueur —
décorée de six motifs semblables représentant
une fleur d'lotus — Le croquis ci-dessous
donne l'emplacement de la planche de

Plafond —

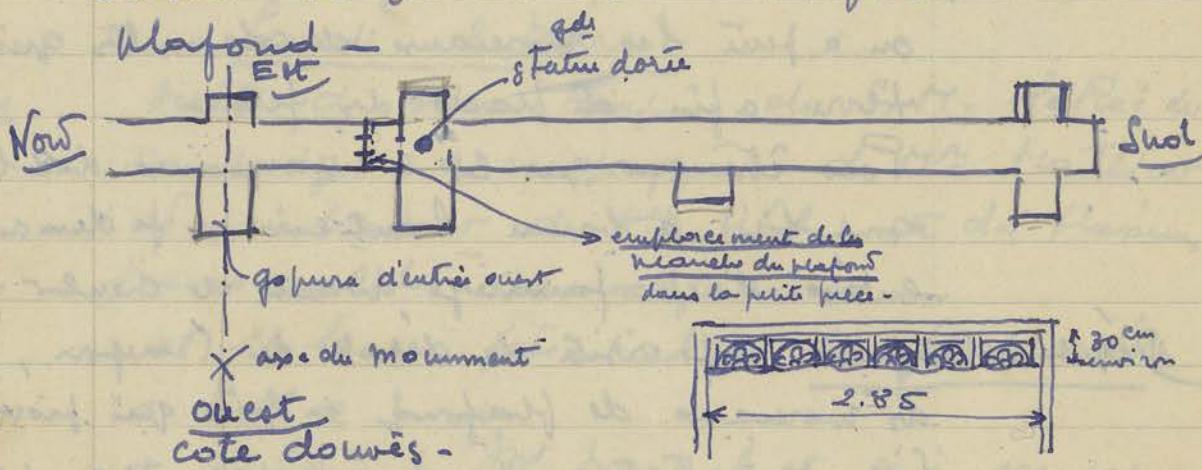


Il est difficile d'affirmer que ces bois datent
de l'époque du monument — Soun affirme
qu'en 1907 ils s'y trouvaient déjà —
Soun n'ayant dit qu'il y avait d'autres
pièces de plafond en bois encore en place nous
allons les examiner ensemble —

Sur la terrasse supérieure — au Sud du
soubassement central — sur la galerie — il reste
une porte en bois très bien conservée — et
placee au dessus de la porte avec
2 trous pour recevoir les montants
des portes —



a la Four Nord-Ouest de la terrasse supérieure il reste encore 4 portes doubles dont 3 sont fermées en bois plein ne sont pas décorées — au dessus de ces portes se trouvent des linteaux ^{moulurés} en bois comme à la porte située au sud du sanctuaire central — (voir croquis ci-dessous) —

Devant le ~~porte~~ grand escalier, face ouest qui accède au sanctuaire central — une porte assez importante s'est produite au pilier S.O — Je demande à faire de faire poser des coffrages en fer battu et de cimentier l'intérieur de la porte —



Aux portes Galerie Sud face Ouest.

les 16 élans en bois soutenant le mur des bas reliefs de la galerie histrique sont en place — on continue la dépose des pierres des moulures et les murs de travées "piliers" 23, 24, 25, 26, 27, 28, sont déposées et bien rangées. Terre — Je fais poser des étais en rondins entre les gros et petits piliers de la galerie — Des cailloux sont occupés à chercher du sable et d'autre à casser des cailloux pour faire les contreforts en béton armé —

Galerie Sud — Je fais enlever la base d'un pilier et ^{qu'il} face Est — les dalles de la galerie afin de voir comment sont constituées les fondations des grands piliers —

Bon falou des Ruines.

à mon retour, je viendrai au Bon falou des Ruines, occupé par la troupe pour examiner les locaux en vue de l'installation d'une usine — cela me paraît trop important pour faire seulement une usine —

Lundi 15 mars.

Bengalow des
Ruines.

je laissons le dessinateur au Bengalow des Ruines pour faire un plan des Bâtiments à l'échelle de 0.009 - p. 4 -

Batkheng.

hauteur tour N.E du 2^e étage - 10 assises sont relevées et rangées - 11^e assise en cours de démontage -

Il serait intéressant de faire faire un relevé du plan d'une ou plusieurs assises - car le dessin des pierres et des assemblages est assez imprécis, l'intérieur du Sanctuaire central face Sud - je demande de remonter la partie gauche de 2^{me} environ - avant de couler le Beton au milieu -


Pt^e de la Victoire

on démonte les pierres de la partie supérieure de l'éléphant tricéphale de l'autre intérieur N.O - Etablissement d'un échafaudage à l'extérieur côté Sud pour reparer les routes -

Angkor Vat

Chantier du gopura Ouest -

la remise en place de 5 pierres d'entablement au sud de l'entrée ouest est terminée - l'équipe travaille maintenant à l'ouest, une partie de la galerie se trouvant au nord de la partie extérieure de la galerie (porte des éléphants - voir croquis) — on a déposé la

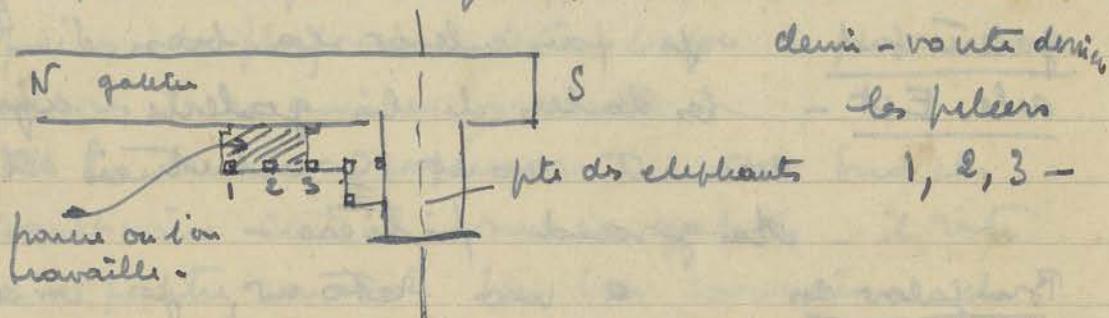

les bouteaux ont été déposés et l'on procède au redressement des piliers - il y aura lieu de placer des portes sous le étendillon -

Angkor Wat galerie sud aile ouest — on continue
à déposer les pierres à roulis de la traverse N°
29 — et l'on va déplacer l'échafaudage —
Le menuisier — installe des étais en rondins
aux 4 fenêtres situées à l'ouest, des fenêtres
clayées avec des bois de charpente et boulons —
Galerie Sud aile Est — ouverture d'un
nouveau chantier sur la demande de M.
Paul Lévy, pour remettre la galerie éroulée —
15 coolies pour l'instant seulement — une
équipe placée au N de la galerie — dans la
cour, recherche les pierres formant la partie
supérieure des fenêtres —
une autre équipe — fait un sondage sous un
grossier du mur de la galerie, à façon à déterminer
la nature exacte des fondations —

Palans.

Sous me signale qu'il n'y a plus de
palans pour ce nouveau chantier — utile
de commander 2 nouveaux palans, si on
ne veut pas arrêter les autres chantiers —
voici l'affectation des palans :

Pt. victoire : 2 palans —

Baphuon : 1 "

Batkheng : 1 "

entrée Angkor Wat ouest : 1 "

galerie Sud ouest. Ang. Wat. : 2 "

Total = 7 palans

H en transport au moins 2 , à la Galerie
S.E. d'Angkor Wat —

Mardi 16 Mars.

Bornes.

Pour signaler les monuments, on a placé des
rênes sur des blocs en latérite taillé —
Il serait utile de repasser les lettres qui indiquent
les monuments —

je demande à Soun de mettre une équipe pour nettoyer les bornes, enlever la mousse, réparer les titres -

De plus il y auront lieu de réparer des bornes pour signaler les monuments qui n'ont pas leurs dis bornes - au dépôt du Bayon on a 6 stèles qui pourraient être utilisées à cet effet -

Sciens Il y a lieu de débiter des planches pour faire les coffrages des contre-forts en B.A. du mur des Bas reliefs de la galerie Sud ouest d'Angkor Vat - je demande à Soun de recueillir 4 sciens le plus tot possible - Utilité de faire un modèle de contre-fort en bois pour la même galerie avant de passer à l'exécution - arrêter les dessins.

Baphuon. Je demande de faire réaliser au dépôt une statue (buste sans bras) dont la tête se détache et qui se trouvait au gopura Est du Baphuon côté Nord - Je demande en outre de faire enlever une terrasse qui recouvre un bas relief à la porte Est du niveau de la galerie couverte - le palan mis au Baphuon n'étant pas nécessaire, je le fais transporter au Angkor Vat -

Construction des gradins en latérite et renforcement de pierre à l'angle N. Est en cours -

Credits Tourisme. Pour répondre à une demande de nous directement tendant à fixer des crédits nécessaires à demander au Tourisme - je vais visiter les domes d'Angkor Thom, et d'Angkor Vat et arrêter les travaux suivants :

a) Angkor Thom - 3/ douves de la Pt Nord
 les abords de la chaussée sont bien dégagés
 et nos coolies d'entretien, pourront se char-
 quer de la petite brousse à enlever -
 b) Porte de la victoire - il y avait lieu
 de dégager les abords de la chaussée qui ont
 encrépié d'arbres - Tous furent qu'avec
 5 coolies et 1 caporal pendant 1 mois cela
 serait suffisant - Coût 5 coolies à $3.50 \times 30 =$
 $5 \times 3.50 \times 30 = 525 *$ pour 6 caporal =
 $1 \times 6.00 \times 30 = 180$
 Total $705 *$

c) Pt des morts - mêmes travaux - soit
 pour les 2 portes 1500 à $2000 *$
 d) Douves d'Angkor vat - Il faudrait construire
 par les douves ouest côté Sud -
 il faut prévoir 15 coolies et 1 caporal pendant
 un an - Coût $15 \times 3.50 \times 30 \times 12 = 18.900 *$
 caporal $1 \times 6.00 \times 30 \times 12 = 2.160 *$
 Total $21.060 *$

Soit une dépense de l'ordre de $20.000 *$ au
 minimum - pour A. Vat - avec $30.000 *$
 on pourrait améliorer les douves d'Angkor vat et Angkor
 Thom et refaire des formes pour les m^{ts} -

On dispose les pierres de la partie haute
 de l'éléphant tricephale de l'angle N.O -
 échappements extérieurs côté S.E. en colonnes
 pour refaire des routes côté Sud -

Angkor vat au chantier du gopuram ouest à
 la partie extrême Sud - on a redressé les
 2 piliers dont j'ai parlé (piliers
 1 et 2 noir croqués) et remplacé les linteaux -
Galerie Sud aile Est - on a fini les trous
 pour déterminer qu'elles sont les fondations
 des grands piliers de la galerie - sur le

base des pilier on a une dalle en pierre qui répartit bien la pression sur des blocs de latérite placés en dessous - je vais faire faire un relevé par le dessinateur de ces fondations - Il semble à première vue nulles de renforcer ces fondations -

La nouvelle échafaudage placé sur ce chantier tire les pierres du mur de bas relief à renouveler - et installe un échafaudage pour placer un palan - je fais mesurer la verticalité du mur de bas relief avec un fil à plomb - Il semble que le mur penche à l'extérieur de la galerie de 2 cm environ sur 3 m de hauteur -

Galerie Sud aile ouest (A.V.) on déplace l'échafaudage pour la disposition des pierres de route - et on continue à placer des étai en rondins aux trous fentes trouées à l'ouest de celles déjà étrangées -

Visiteurs.

Dans l'après midi, je fais visiter à Mr Garnier ingénieur au chef du Bureau du Cochinchine (T.P.) Angkor Vat, la Tenure du Roi Lépreux, le palais Royal.

Visiteurs

Visite avec Mr Garnier du Phnom - Bakong - du Bayon, du Baphuon, du Phimeanakas, du palais Royal - de Prasat Palilay - Mr Garnier est accompagné de 2 colonels et de leurs familles. La visite tourne N.E où la 20 tenue

P. Bakong

39

est complètement démontée jusqu'aux fondations — Le linteau de la porte fut du sommet à la base principale de la terrasse supérieure est en place - et on a coulé du béton entre les 2 morceaux — on prépare au sol éclatantes —

Jeudi 18 mars.

Relevés

je fais relever par le dessinateur à l'échelle de 0.10 J.P.M. les 2 morceaux de plafonds en bois provenant d'Ayukor VAT, donc un a été pris au dépôt de Bouyon - et l'autre à Ayukor VAT au gopura ouest côté Sud — je fais fresche des photos —

Scieurs.

4 scieurs seront engagés à partir de lundi prochain pour débitter des planches destinées à faire des coffrages pour A.VAT —

jeux courrois des gros scieurs :

1 scieur à 5^{fr}.50 par jour

4 scieurs à 4^{fr}.80 "

location de 2 scies à 0^{fr}.80 par jour —

Rte à la Victoire on construit un échafaudage

à l'est et à l'ouest de la route extérieure au sud de la porte, afin de déposer les pierres de la route Sud —


Descente à terre au fond des pierres de l'éléphant tricéphale à l'angle N.E —

Baphnouk, on a relevé la terrasse qui mesurait le bas relief reproduit par Arnaudie fl IX bulletin 1913 —

on continue la pose de gradins en latérite et la pose de pierres en bois à l'angle N.E de la terrasse supérieure —

Ayukor VAT gopura ouest — dépôt de deux routes et du deuxième fronton — bois croquis —


32

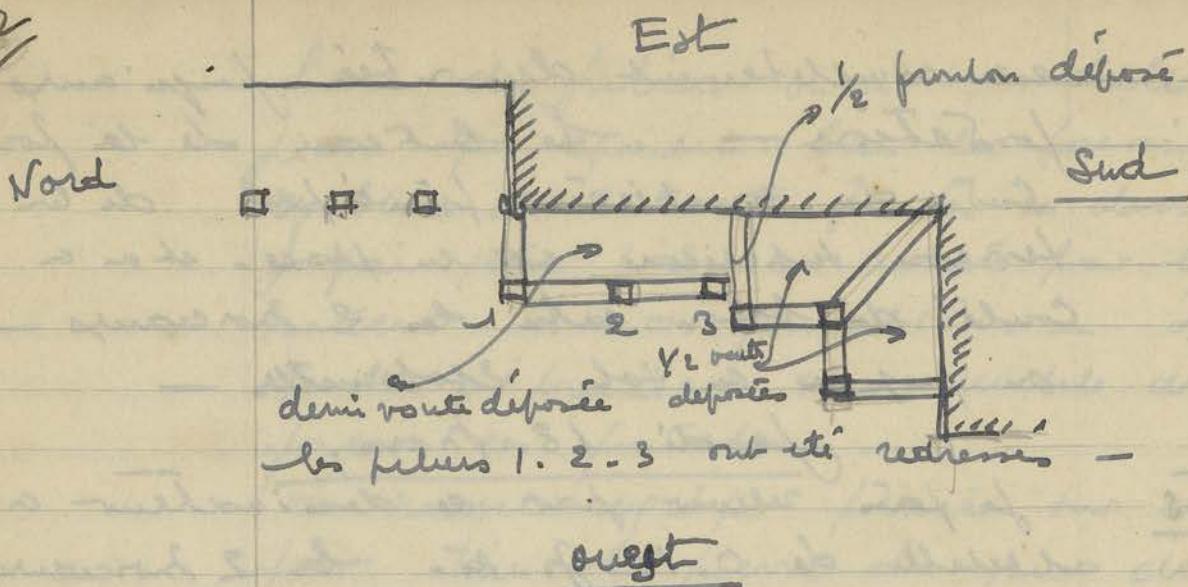

Angkor Vat galerie sud ouest la toute de la travée
les a été déposée - on commence la dépose
des pierres du mur de la 22^e travée -
on a étagé avec des rondins 6 fenêtres à
l'ouest des fausses fenêtres étagées avec des
bois de charpente -

galerie Sud Est établissement d'échafaudages pour remonter les pierres supérieures
du mur de Bas relief - au niveau du
linteau de fausses fenêtres - un palan
est mis en place -

Relevé par le dessinateur sur les fondations
du gros pilier de la galerie -
en gros on a des fondations suivantes -

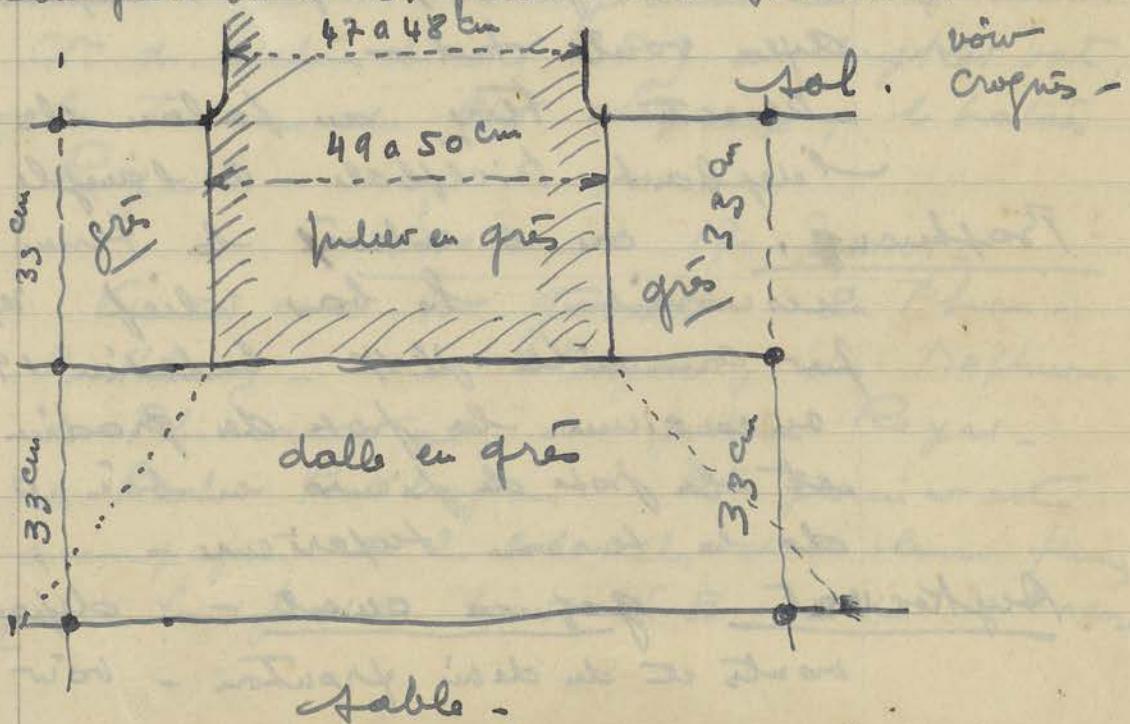

Vendredi 19 Mars.

Envoi de la camionnette à Phnom Penh pour ramener Mr Marchal.

Travail de bureau - je donne des indications au dessinateur pour arrêter les dessins suivants:

1) dessin des armatures de Béton armé des contre forts à poser au milieu des fenêtres -
2) dessin des armatures en B. A. de cadre ass. à poser dans les fenêtres -

3) dessin d'un plafond en bois à poser dans la galerie S.E d'Angkor Vat pour cacher les fissures si l'on repeint la voûte -

4) liste des ferrures nécessaires pour les travaux de Béton armé -

Samedi 20 Mars.

M. Fure me prête une voiture pour aller au chantier d'Angkor Vat -

J'examine en détail les ferrures qui se trouvent au dépôt -

a) fil de fer pour ligatures - 1 grand rouleau suffisant pour l'instant.

b) φ de 4 et 5 mm pour étriers. 2 grands rouleaux suffisants pour l'instant -

c) φ de 8 mm. 1 rouleau -

d) φ de 10 mm 160 à 200 m environ.

e) φ de 20 mm 10 mètres environ à Angkor Vat.

En toiture il manque des ferrures de 20 mm 15 mm et 12 mm.

Angkor Vat gopura ouest - on continue à redresser les piliers 1, 2 et 3 du dessin de la page précédente et l'on remet en place les deux derniers - frontons -

Angkor Vat ailes galeries Sud.

Je fais remarquer à Soun que les ~~grosses~~ pierres cassées pour B.A. sont trop grosses - 3 ou 4 centimètres pour la plus grande des morceaux.

34

Dosages -

Le dosage du Beton se fait sur le chantier avec des caisses qui ont les dimensions suivantes 0,35, 0,30 0,19 (voir croquis) Cela donne comme Volume de la Caisse 90 litres -


Sous m'a dit que les dosages adoptés pour le B.A. sont les suivants: 2 Vol. sable
4 vol. gravier
1 vol. ciment.
Ce qui donne, 400 litres sable
800 litres gravier
200 litres ciment

pour qu'il y ait 300 kgs de ciment, ce qui est un bon dosage il faut donc que le litre de ciment pese 1 kg. 500 - / à vérifier -

Bungalow des Ruines. Mr Brunet a reçu du 5^{me} du Trésor 300.000\$ de crédit pour remettre les chambres en état - il a commandé les sanitaires pour l'ensemble, et 100.000\$ de menuiseries - 27 chambres, celles situées au Sud sont en cours de réparation - en avance note directeur -

Angkor vat - galerie sud - aile ouest on continue le dépôt des pierres des voûtes - on est arrivé à la 20^e travée pilier - on démolit le joint en ciment qui se trouve sous la première assise de la voûte - Ce joint a été bouché de ciment pour empêcher les infiltrations -

bien vers l'est


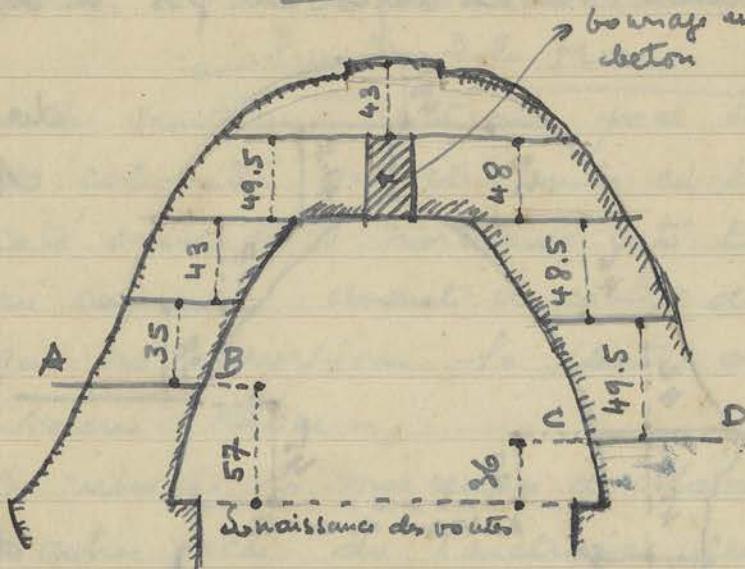


dans la galerie
sud aile ouest
dans la route
démontée je
note que la
hauteur des
assises n'est
pas la même
des 2 côtés
pas rapport à
la hauteur des
routes le point A-B est à 57 cm et le point C-D est à
36 cm cette disposition serait gênante, si
l'on voulait poser des tirants —

Aykor vat galerie sud aile Est je note qu'il y a
14 fenêtres à réparer —


le palan de ce chantier est cassé et doit être
réparé — Son prochain de prendre le palan du
Bakheng — 4 blocs ont été remontés au
niveau du bûcheau des fausses fenêtres côté le
plus à l'ouest — on prépare les blocs au
sol —

Fondations du grand pilier dans la galerie S.E. d'Aykor vat

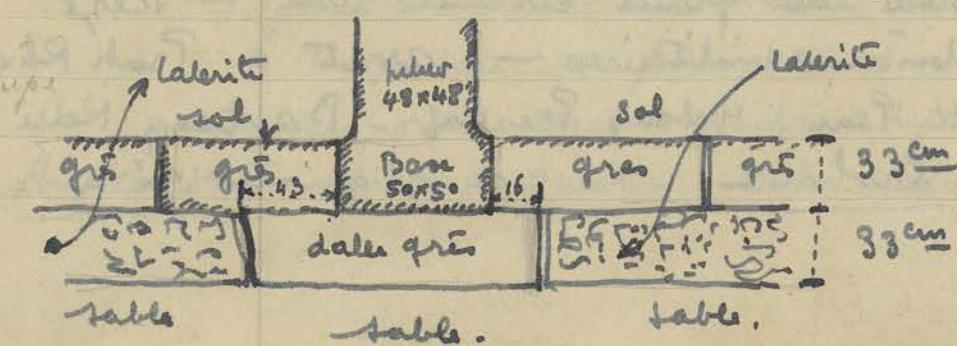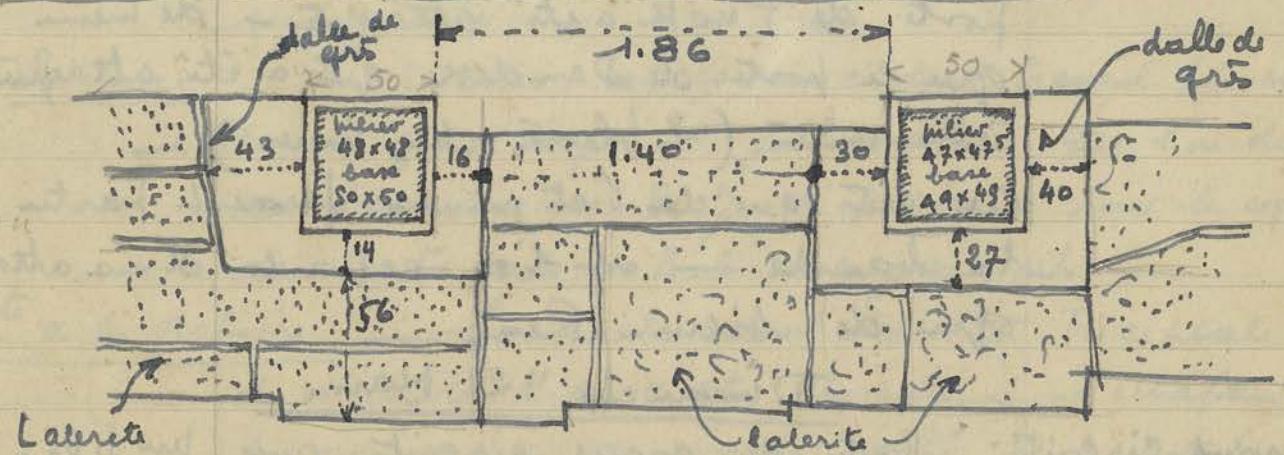

j'ai fait dégager
les fondations de
2 piliers dans

la galerie sud elle ouvre sous les piliers on a des dalles de grès de 30 à 33 d'épaisseur

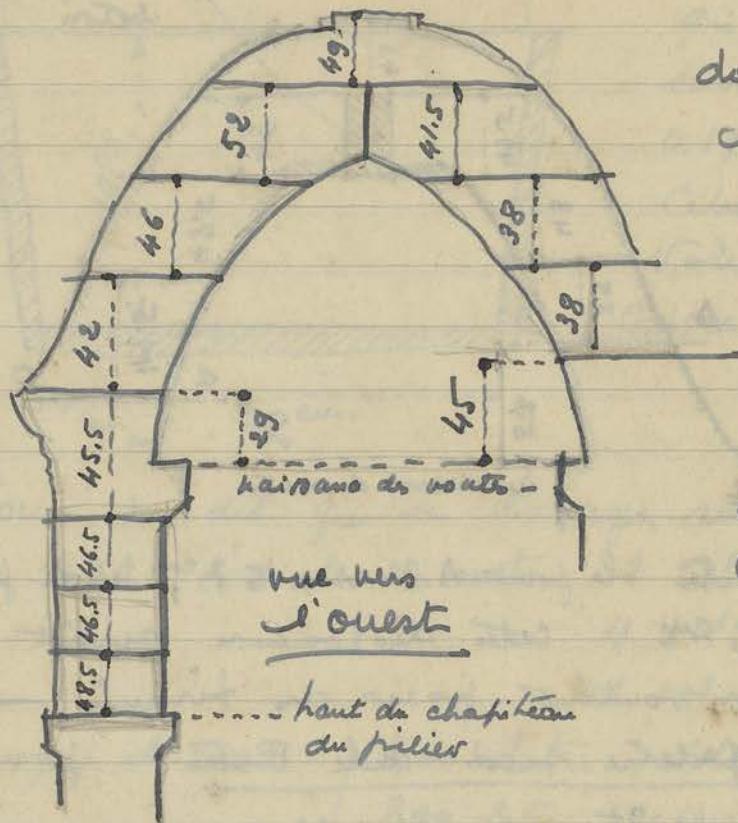

dans la galerie sud elle ouvre Est
j'ai mesuré les arêtes des voûtes à droite et à gauche celle ci ont d'inégales hauteur Ce sera gênant pour la pose des tirants

Visiteurs

M. Salze du 8^e fédéral de l'information de Saïgon est à Angkor pour 8 jours - il a l'intention de prendre des photos et un film de cinéma - Il m'a demandé de l'accompagner et j'ai accepté -

Français.

Recrudescence du mouvement Issarak dans la province de Siem Reap - le poste de Phnom a été attaqué - de même que le poste de Damdet qui a été attaqué cette nuit (2 blessés chez nous.) - On dit que des Viet minhs feraient partie de la bande - et l'on rapporte d'une attaque de Siem Reap -

Dimanche 21 Mars.

grand circuit: Visite du grand circuit avec M. Salze et plusieurs militaires - arrêt à Pras Khan Neak Pean, Melon, Pre Rup - Banteay Kdei Ta Prohm - à signaler qui a

32

Prah Khan a l'entrée ouest une des premières bornes à droite s'est renversée -
Lundi 22 Mars.

Bakheng. au sanctuaire central face sud, des fragments de colonnette ont été remis en place - 4 morceaux côté ouest et 4 morceaux côté Est - je demande au caporal avant de couler du béton d'attendre que nous apportions la photo des colonnettes du Phnom. Kroum -

On recherche les morceaux de colonnette pour ces 3 autres faces du Sanctuaire central -

A l'angle N.E de la terrasse en haut et du haut, la petite tour a été entièrement démontée - le mur de soutènement de la terrasse côté Est penchait vers l'extérieur - on est en train de la démonter, sur 10 m environ de longueur jusqu'à la tour se trouvant immédiatement au sud de celle démontée - Il faudra ensuite remonter le mur vertical - remettre du remblai et sans doute faire une dalle en béton, comme fondation de la tour N.E -

Baphuon. construction du gradins en bâtière et enfoncement de pierre à l'angle N.E de la terrasse supérieure -

Sciens. Les sciens ont commencé leur travail près du dépôt du Bouyon - Je demande que l'on débute des planches de 30 mm d'épaisseur pour les coffres des contre-forts en B.A. d'Angkor vat -

Pt de la Victoire La moitié de l'éléphant tricéphale de l'angle N.O a été démonté - L'échafaudage pour le dépôt des voûtes côté sud est terminé au palan. est posé et l'on a commencé à déposer les pierres de la partie supérieure des voûtes -

Hukor vat gopura ouest - côté sud. Remis en place

du deuxième fronton sur pilier 1 - dépose des dernières pierres des 1/2 routes à l'angle -
Au p'tit bout - galerie Sud - côté ouest - dépose des pierres des routes de la 20° travée piliers - 9 travées tout déja déposées -

Angkor vat - galerie Sud côté Est. On a remis en place 6 pierres de la 7° assise du mur des bas reliefs en partant de l'ouest - travail de remontage arrêté toute de palau - une équipe sur sol recherche les pierres qui seront à remonter par la suite - une autre équipe dans la galerie replace les dalles de grès qui ont été enlevées pour vérifier les fondations des piliers 8 et 9 de la galerie S.E -

Lundi mardi 23 Mars.

Travail de Bureau dans la matinée -

Angkor vat - galeries Sud - Ouest et Est -

Visiteurs - visite de ces galeries avec M^r Garnier ingénieur des Ponts et chaussées adjoint à M^r Vernisse a P. Pêch - et M^r Vassal ingénieur de Centrale chef du Bureau technique du T.P a P. Pêch -

je montre à ces ingénieurs les chantiers en cours et les projets pour l'établissement de contre forts en B.A - Cadres en B.A. pour les fausses fenêtres - Mafnuds - Tirants etc.... Ces messieurs dans l'ensemble estiment que ces projets connaissent - proportion de faire des contre forts en bêton non armé étant donné qu'ceux ci, travaillent à la compression -

Mercredi 24 Mars -

Chantiers -

paye -

M^r Marchal étant rentré la veille de P. Pêch nous allons ensemble faire la visite de tous les chantiers et procéder à la paye des coolies -

39

jeudi 25 Mars -

accident -

Un accident s'est produit dans l'après midi du 24 Mars au Bayon -

Le chef de bataillon Louvet en visitant ce monument est tombé de la terrasse supérieure dans une petite cour, faisant une chute de 5 ~~mètres~~ - Le capitaine médecin Michel et sa femme qui accompagnaient le C^t Louvet l'on retrouvé à l'étage inférieur évanoui après sa chute - ramené d'urgence à Siem Reap le C^t Louvet a été hospitalisé et soigné par le Capitaine Coret du centre chirurgical -

Après avoir craint un éclatement de la rate, le C^r Coret m'a indiqué que le C^t Louvet avait 2 côtes cassées, et qu'il crachait du sang -

Il faut attendre quelques jours avant de déterminer la nature exacte des contusions internes -

J'eus rendez sur place avec le docteur Michel, qui m'a indiqué l'endroit où l'accident s'était produit - cet endroit est situé à 2 ou 3 mètres au nord de la sculpture découverte par M^r Parmentier (Fronton avec le Kavara) - Il semble que le commandant Louvet, est tombé sur une pierre formant balustrade et que celle ci ait basculé entraînant le C^t dans sa chute - Il est certain que si le C^t n'était pas monté sur la pierre balustrade, l'accident ne pouvait pas produire - je ferai demain un relevé des lieux -

Perte -


Sur la demande de M^r Marchal, j'avais emmené avec moi, au Baphuom et à la porte de la victoire M^{me} Gilot, le docteur Michel et sa femme - Je des descendu du Baphuom par le côté Est, M^{me} Gilot a perdu une bouteille en or ancienne - une récompense de 200 \$ a été promise aux coaliés qui retrouveraient la bouteille.

40

Vendredi 26 Mars -

Monsieur Marchal étant fatigué par son antreax, je continue à visiter les chantiers.

Batkieng -

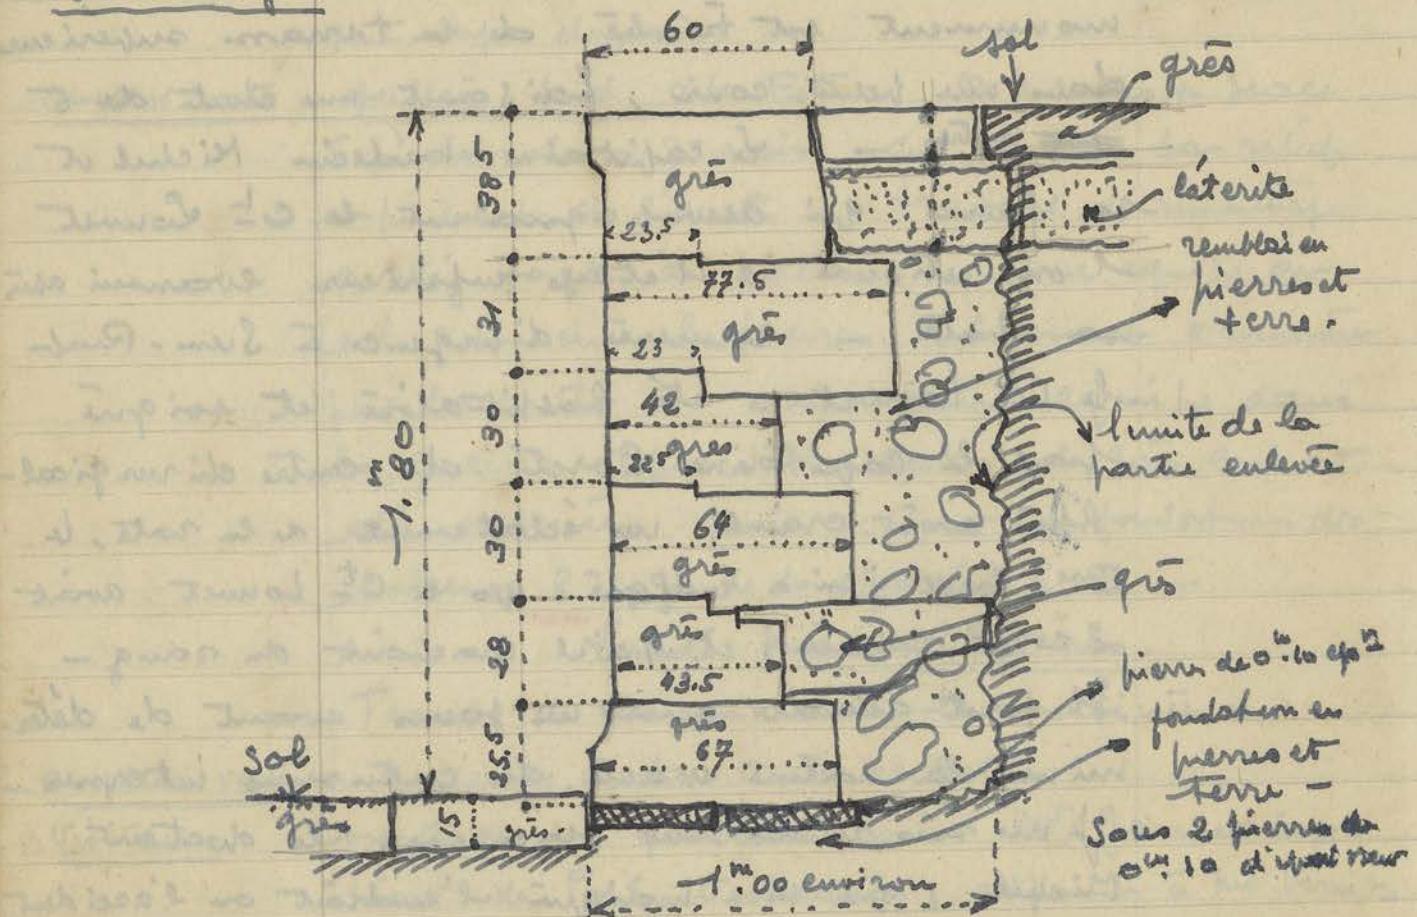

Prise de 2 photos - l'une montrant toutes les pierres déposées de la tour N.E. de la 2^e terrasse - l'autre la dépense du mur de soutènement à l'angle N.E. côté Est -

je donne ci dessus un dessin côté montant la coupe sur le mur de soutènement qui est déposé. Ce mur est constitué par un parement en grès de ses angles d'inégales largeur - la largeur de ce mur est suffisante, $\frac{1}{3}$ de sa hauteur - mais les fondations de ce mur sont constituées par des pierres cassées et de la terre sont insuffisantes $\frac{6+3}{6}$. La terrasse supérieure, recherche de morceaux de colonnettes pour la porte ouest - 5 morceaux retrouvés --

hauteur de la colonnette sous l'eau 2.^m 70

(1) après vérification il y avait sous le mur 2 pierres de 0.^m 10 d'épaisseur qui répartissaient la pression sur le sol -




du mur de soutènement de l'angle N.E. de la 2^e terrasse une équipe est occupée à refaire les fondations du mur et au dallage avec des pierres cassées —

accident survenu au commandant Louvet - Relévi
des lieux de l'accident

Echelle 9' 02 P.M.

Bayon

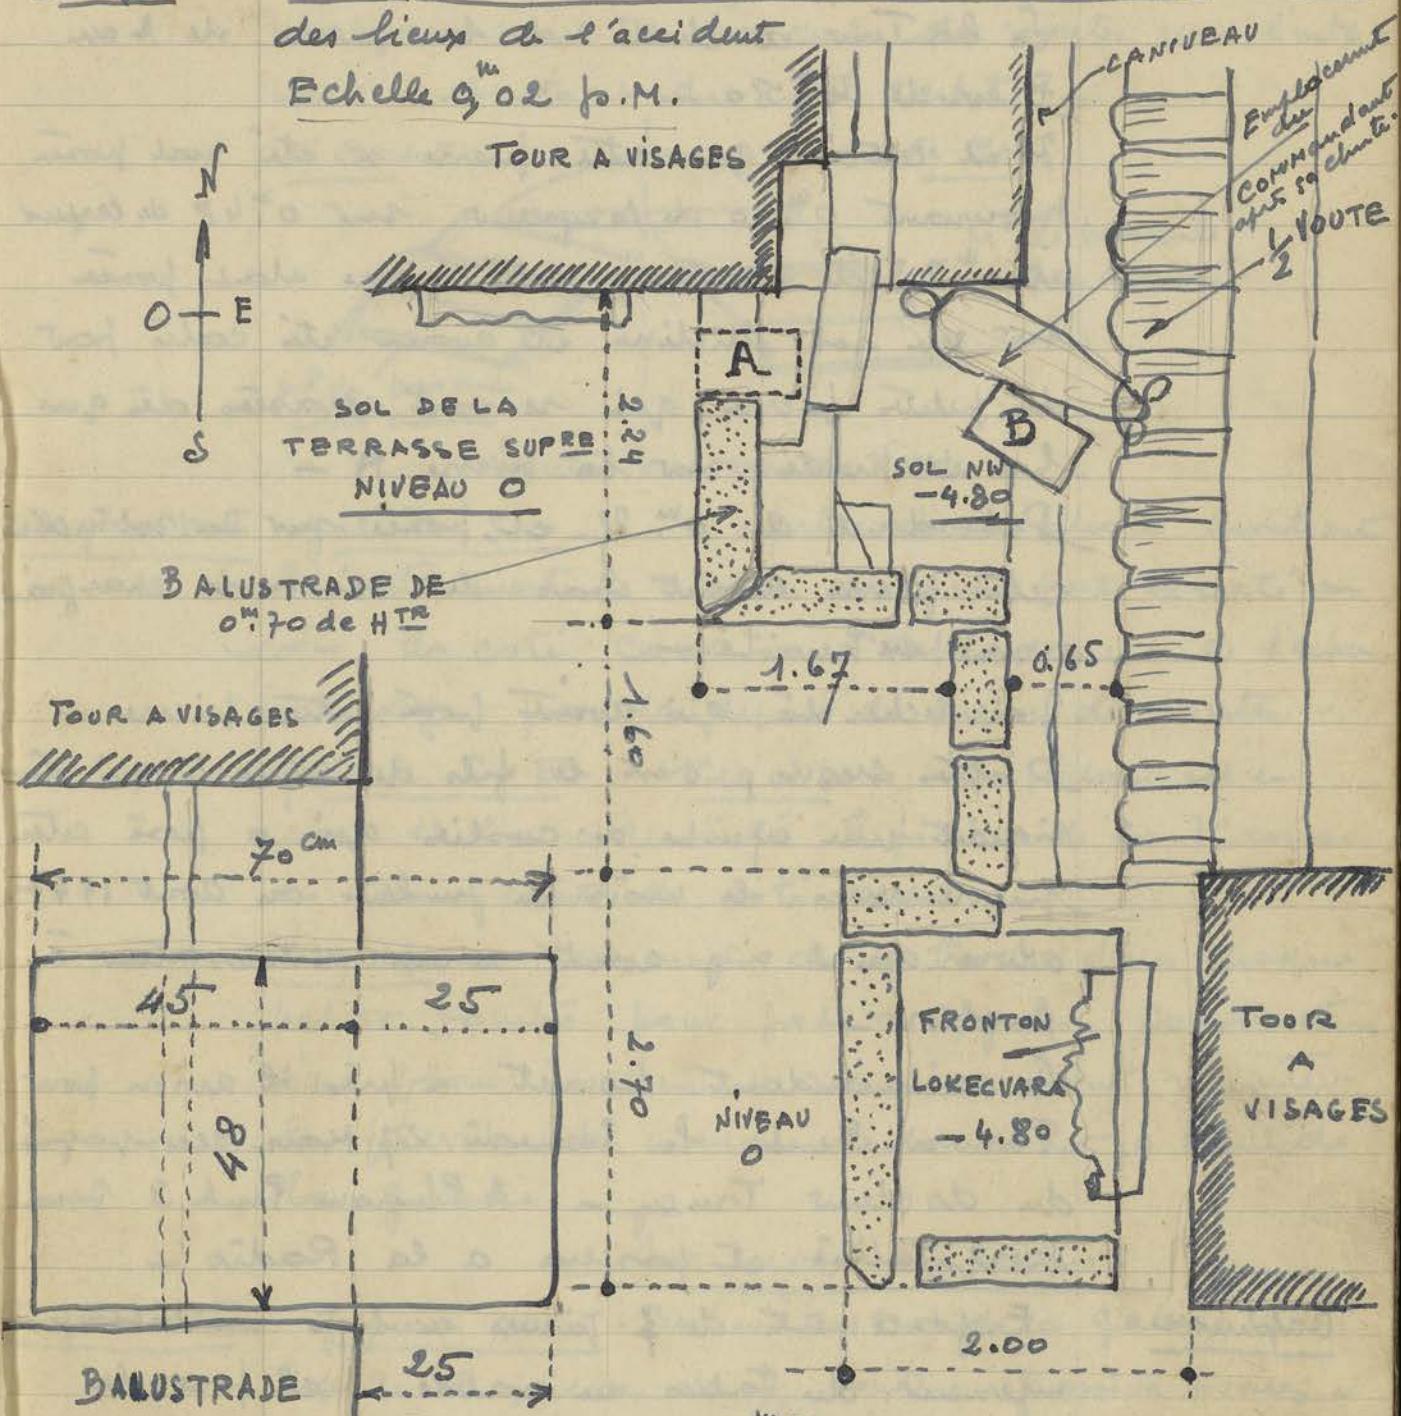

PLAN ECH:

10 cm. P.M.

face,
sculptée

COUPE A 10cm P.M.
MONTRANT LA POSITION DE LA
PIERRE AVANT LA CHUTE

pierres de
support
inclinées

burrage
avec
petites
pierres

4.80
SOL COUR

AV

Le relevé des lieux de l'accident montre que le commandant Louvet est monté sur une pierre de balustrade et que celle-ci a basculé entraînant le commandant dans sa chute -
Le hauteur de chute de la pierre de A en B est de 4^m.80 -

Il est certain que cette pierre a été mal posée mesurant 0^m.70 de longueur sur 0^m.48 de largeur et 0^m.33 de hauteur, cette pierre était posée sur un sol incliné et avait été calée par des petites pierres qui se sont écrasées dès que l'on est monté sur la pierre A -

Pébordant de 0^m.2f et posée sur un sol incliné cette pierre devait basculer si on la chargeait à son extrémité -

J'ai recherché qui avait posé cette pierre - D'après mon, c'est le fils du Kruoch qui dirigait une équipe de coolies qui a posé cette pierre vers le mois de juillet ou aout 1947 alors qu'il n'y avait aucun conservatoire à Angkor -


Le commandant Louvet a pris l'avion pour Phnom-Penh le Samedi 27 Mars accompagné du docteur Trucy - A Phnom-Penh il sera hospitalisé et passera à la Radio -

Enfoncement de 7 pieux en bois au niveau inférieur du talus en sable - en pose de bloc en latérite à l'angle N.E du gopura E de la terrasse supérieure pour faire une fondation au dallage en grès -

Pour les pieux on a planté déjà 3 rangées de 6 pieux et l'on commence la 4^e rangée de 7 pieux -

Pt de la Sictoire on commence à remettre en place les

blocs inférieurs de l'éléphant tricéphale de l'angle N.O - après enlèvement de la terre -
on a déposé une quarantaine de pierres de la
voûte côté Sud - Les pierres déposées montrent
un mouvement de bascule des voûtes vers l'inté-
rieur - Autour du côté Ouest -

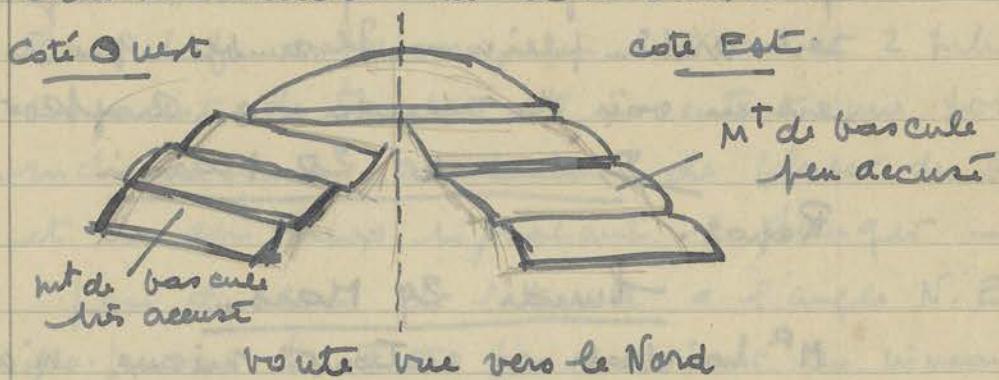


voûte vue vers le Nord

Anykor vat galerie S.O - prise d'une photo montrant
les étais et le modèle de contre fort excentré en
bois du côté Cour - déplacement de l'écha-
faudage pour la dépôse de pierre de voûtes -
galerie S.E 1^{re} étage - le palan est en
place et l'on a remonté 8 pierres de la 7^e assise
en commençant du côté Ouest -
degrés : percements de 4 trous dans chaque
piliers tombés pour pose de fers - construction
d'un plan incliné en rondins pour remonter
les pierres du niveau de la cour à celui de
la galerie -

Mercredi 27 Mars -

Anykor vat gopura ouest - extrémité Sud de la galerie -
Repose des pierres des 1/2 voûtes - 2 assises posées -
galerie Sud Est 12 pierres de la 7^e assise remontées
percement de trous dans les gros piliers -
galerie Sud Ouest déplacement de l'échafaudage
terminé - Reprise du palan - 191 pierres
de voûte vont être déposées sur une longueur
de 19 mètres - ,



on constate toujours
un M° de bascule du
côté du mur de bas
relief. 0.15 cm.
6 pierres seulement
disponibles -

Visiteurs

dans l'après midi sur la demande de M^r Vergoz, je fais visiter Angkor vat à M^r l'ambassadeur des Etats Unis au Siam - et a sa suite -

De nombreux touristes sont arrivés de Saïgon par avion pour les fêtes de Pâques - l'hôtel est très plein - Il semble que le tourisme est en voie de reprendre à Angkor -

Dimanche 28 Mars -

Repos.


Lundi 29 Mars.

M^r Marchal se sentant mieux m'accompagne sur les chantiers -

Sciens - j'ai oublié d'indiquer que le lundi 27 mars j'ai été voir l'équipe de sciens chargée de déblayer des franches de 3^m d'épaisseur pour les coffrages d'angkor vat (galeries Sud E et Sud O) - Deux sciens seulement travaillaient -

Aujourd'hui Jour me fait connaître que l'équipe s'est augmentée de 2 sciens - (4 en tout) -

Batkheng. à l'angle NE de la 2^e terrasse, côté Est on a refait les fondations du mur - Remise en place des pierres de la première assise -

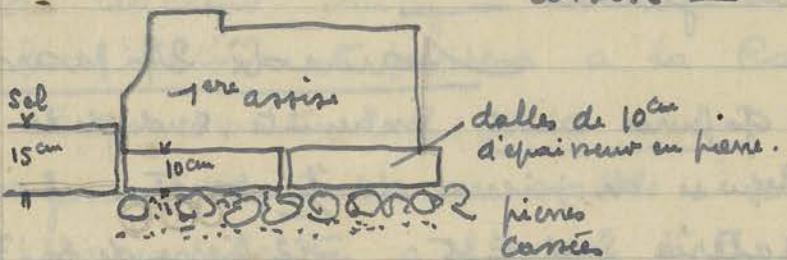

À la terrasse
supérieure
ou continue
à redonner

les morceaux de colonnettes des baies du donjon central -

porte ouest 4 morceaux côté Sud
4 " " " Nord

porte sud 4 " " " ouest
5 " " " Est



porte Est devant

porte Nord 2 m^o coté Est -

Bayon. Je monte à mur Marchal l'endroit où s'est produite l'accident du CT Bouvet -

Sur un signal qui a la bibliothèque de l'angle N.E située immédiatement derrière le mur des Bas reliefs extérieurs, un linteau et 2 piliers menacent de tomber et présentent une forte inclinaison - on décide de placer des barrières et des écritures signalant le danger -

Baphuon. pose de blocs de latérite à l'angle N.E du q-pura 1 Est pour arriver au niveau du dallage - Enfoncement de pieux au bas du talus -

Pt de la Victoire Remise en place des pierres de base de l'éléphant tricephale de l'angle N.O - devant les deux pierres de route, de la voute situées immédiatement au bout de la face Sud - côté Ouest -

L'éléphant tricephale de l'angle S.O qui a été reconstruit ne donne pas entier satisfaction La tête de l'éléphant central repose en calérite Il endroit présente une forme nulle - on décide de faire brûler la partie supérieure -

Ankor Wat q-pura ouest - côté sud extrémité de la galerie - on a remonté toutes les pierres. Il reste à placer des portes en B.A. tous les ½ frontons et leurs linteaux -

Galerie Sud ouest on décide de commencer l'incrustation de 4 contre forts en B.A - avec des portes de 20^{cm} de hauteur à la partie supérieure -

Galerie Sud Est. côté mur des Bas reliefs 18 pierres de l'arcise N° 7 sont en place -

Perçage des piliers de la galerie pour placer des goujons - Coffrage des fausses fenêtres en cours -

Mardi 30 et mercredi 31 Mars.

Rédaction du Rapport mensuel - Mme Marchal a été visiter tous les chantiers ce matin 31 Mars.

Jeudi 1^{er} avril

Bakheng.

Le mur de soutènement situé à l'Est de la petite tour de l'angle N.E de la 5^e plate forme est remonté jusqu'à la 4^e assise - 5^e assise à moitié morte - on donne le remblai par couches successives derrière le mur et au fur et à mesure que celui ci se remonte - Il sera ensuite utile de faire le même travail pour le mur de soutènement côté Nord -

Colonnettes du sanctuaire central - Sur la face ouest et sur la face Sud on a coulé des morceaux de Béton pour remplacer les parties manquantes Les colonnettes ayant été posées de travers je fais faire les corrections utiles - le constat d'avoir des règles et des fils à plomb sur les chantiers -

Scieurs

je vous montre les scieurs qui sont installés près de la route allant du Bouy à la porte Ouest - Il y a 4 scieurs - qui débloquent des blocs de 3 cm d'épaisseur, 0["], 20 de largeur, 5["] de longueur - Bois de Jeang -

Bris de Sculpture au pied de la pyramide se trouvent des grands à Baksei - statues - Buste d'un côté, corps de l'autre - sur ChamKrong. le buste 4 bras cassés et une tête - la tête qui était en place a été brisée dernièrement - et est tombée sur le sol en morceaux.

Les miliciens ^{du port de} la porte sud d'Angkor Thom prétendent que 2 soldats français il y a 15 jours environ ont tiré 4 coups de fusil sur la tête de la statue - demande d'enquête à établir - L'écriteau de Baksei ChamKrong en bois a disparu - Souvou soupeur des militaires de l'avoir emporté -

Angkor Vat ^{2 coulois} une équipe ¹⁴⁷ est occupée à redresser les fers de 0,60 pour B.A. Je remarque que ces fers sont rouillés et demande à Soun de le faire nettoyer avec une brosse en Fer pour enlever la rouille avant de les utiliser —

Galerie Sud ouest A.V. Le démontage des pierres de voutes se poursuit on est arrivé à la travée pilier N° 17. Construction de armature de poutres pour les fausses fenêtres - 2 terminées - 2 en cours -

Au sujet du démontage des voutes, il me paraît inutile de continuer à démonter toutes les pierres du côté des piliers - car celles-ci sont presque en place et il sera difficile de les poser n'importe où - je fais arrêter le démontage de ce côté et donne l'ordre de poser quelques-unes et ainsi à l'intérieur des voutes pour éviter la bascule de ces pierres —

Galerie Sud Est 22 pierres de la 7^e assise sont en place côté ouest - à cet endroit comme il est difficile de remplacer les pierres - on décide de remonter les pierres de la 7^e assise en partant de l'extrémité Est -


Percement de ⁴ trous dans 8 gros piliers en cours - Construction d'un échafaudage à l'extrême ouest de la galerie effondrée pour reprendre la dernière travée qui n'a pas été effondrée mais dont les pierres ne sont plus en place - Il reste côté ouest 6 travées non effondrées - dont une à renover -

En tout 27 travées de 2^m.50 environ total 67^m.50 env. nécessité d'emprunter 20 mètres de fers de 15^{kg}/m à M. Brunet pour établir des crampons aux endroits les plus saliens du mur de bas relief.

Vendredi 2 avril.

Baksei Chamkrong - Je retourne sur place voir la statue dont la tête a été brisée —

HS

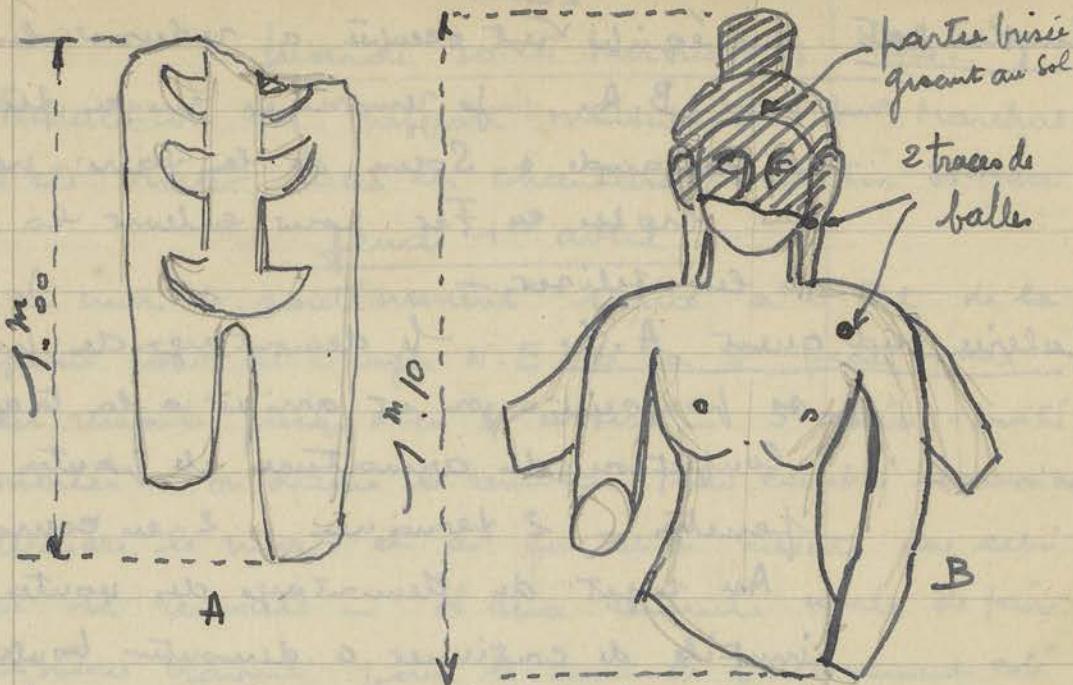

Il s'agit probablement d'un Vishnou, sur le torse (B) on retrouve la trace de 2 balles de fusil - la partie de la tête brisée sur le dos est brisée en plusieurs morceaux et est détachée du reste -

Bakheng.

Ramener en place des dernières assises du mur de soutènement Est - à l'Est de la tour reliée à l'angle N.E - 5° plateforme - Reste à faire le remblai derrière le mur sur 0^m.80 de hauteur environ -


Colonnettes - à la porte sud du sanctuaire central, on a remplacé les 2 colonnettes vides - je demande à ce que l'on corrige les accrochements dans les murs -

Porte ouest - les 2 colonnettes ont aussi été remplacées - travail en cours -

linteau - on a retrouvé un linteau mesurant 0^m.61 de hauteur et 2.00 de longueur et qui semble provenir du sanctuaire central - Le linteau déjà posé à la porte Sud mesure 2^m.20 x 0.70 -

les petits linteaux des 4 sanctuaires secondaires n'ont que 1^m.84 de long -

On a retrouvé d'autre part un demi linteau qui mesure $0^{\circ} 70 \times 1.10$ de longueur — on décide de remplacer le linteau retrouvé à la face Ouest et de dresser un échafaudage — je demande au corporal de rechercher les autres linteaux — Photo à prendre de la face Sud terminée —

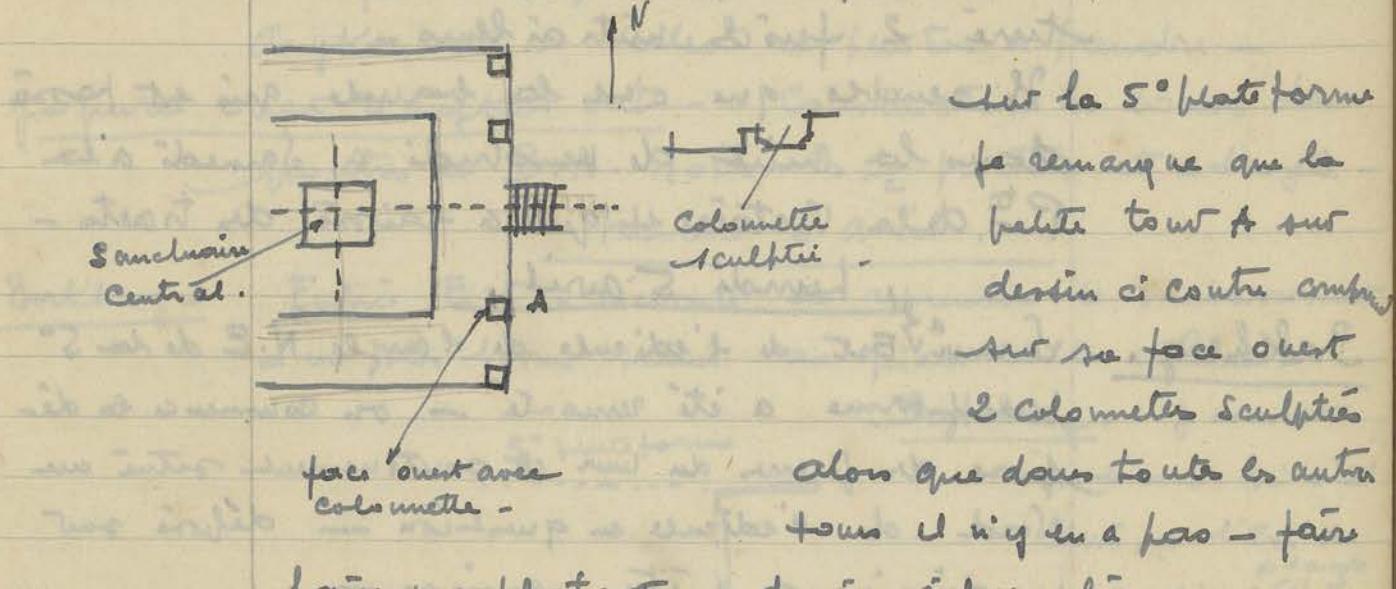

Sur la 5^e plate forme
je remarque que la
petite tour à sur
dessin ci contre complé-
tur sa face ouest
2 colonnettes sculptées
alors que dans toutes les autres
tours il n'y en a pas — faire
faire une photo et un dessin si il y a lieu —

Pour y voir plus clair dans ce monument il serait
utile de ranger toutes les pierres de la même catégorie
ensemble — linteaux — colonnettes — figures — etc....

Angkor Vat

Galerie Sud Ouest — troué pour de bois pour
encauter les coffrages des contre-forts — coquetterie
des armatures pour poutres — déplacement de
l'échafaudage pour la dépense des voûtes —
spire d'étai à l'intérieur pour tenir les pierres
des voûtes contre piliers —

Galerie Sud Est — Recherche des pierres de la 7^e
assise en partant de l'Est — percement des
houles dans gros piliers — Construction d'un écha-
foudage à l'ex-hemiti Ouest de la Galerie effon-
drée — Je pense qu'il sera nécessaire à certains
permettre très abîmés de construire un voile en
Béton armé à la place des caches prévus —

Samedi 3 avril

Isaraku —

Travail de Bureau — M^r Marchal va sur les
chantiers et trouve des messages laissés par les
Isarakas à la Pt^e de la Victoire —

Dimanche 4 avril -

I Maraks.

Un accrochage a eu lieu a Ph - Ampelie
situe a 8 Km a l'Est d'Angkor Vat -
4 combattants Cambodgiens ont ete tués, il
y a eu 4 blessés français et Cambodgiens et
il paraîtrait que les I Maraks auraient cap-
ture 2 fusils mitrailleurs -

Il semble que c'est la bande qui est passer
dans la nuit de vendredi a Samedi a la
Pte de la Victoire et qui a laissé des traits -


Lundi 5 avril

Bakheng.

Le mur d'Est de l'édicule de l'angle N.E de la 5^e
Meleiforme a été remonté - on commence la dis-
position des pierres du mur de soutènement située au
Nord de l'édicule en question - dépose sur
une dizaine de mètres environ -

Sanctuaire central - face ouest - l'échafaudage
pour la pose du linteau est en place - mais
il manque un palan pour remonter le linteau -
pour le linteau qui est en 2 morceaux - on a
percé des trous dans la bête de 3 fermes -

Colonnettes

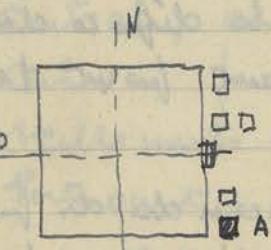

A la petite tour en briques A, située a
la base de la pyramide et a l'Est,
il y a une colonnette à peu près complète -
je prends un relevé - Il semble
d'après cela que les colonnettes posées
au sanctuaire central face Sud et face Ouest,
ne répondent pas exactement au dessin de la
colonnette - question à revêtir - faire photo prochainement
la colonnette de la tour A -

Angkor Vat

Galerie Sud Ouest - dépose des pierres de route -
construction d'un appui de contre fort -
galerie Sud Est - pose de 13 pierres de la 7^e
assise en partant de l'Est -


percement de trous dans les gros pilons - et COU d'un
échafaudage à l'extrémité de la galerie Est
éroulée -

Plafonds en bois Angkor vat - j'envisage M. Marchal pour
les portes en bois qui restent en place à la
beste forme supérieure du sanctuaire entier à
Angkor vat - relevé et photos à prendre -

gopura ouest d'angkor vat - construction en cours de
portes en B.A. sous les $\frac{1}{2}$ portes et à l'angle -

Mardi 6 avril .

Bakheng - Entrée Est - nécessité de reprendre le soulevement
d'un des lours resté au pied de la colline -

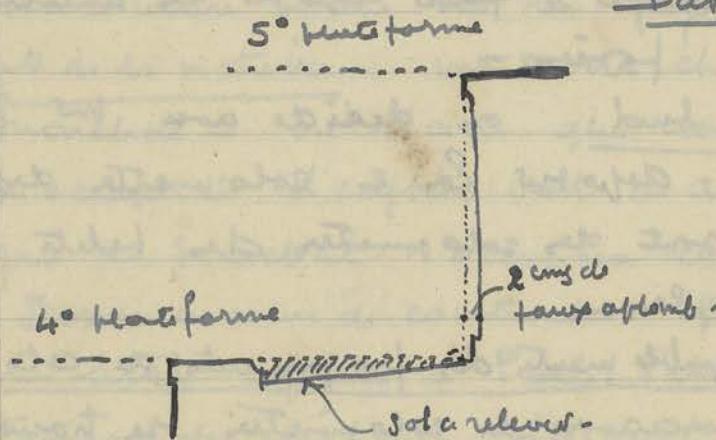

Bakheng - je constate
que le mur qui a été
relévé à l'Est du
petit édicule N.E
de la 5^e plateforme
est légèrement
incliné vers l'ex-
terior - 2 cm
environ de taux
aplomb - cela vient du fait que l'on n'a pas de fil à
plomb sur les chantiers -

D'autre part, le dallage est mal posé et ne se raccorde
pas à la pierre extrême de la 4^e plateforme -

je donne ces ordres pour que le dallage du sol de la 4^e
plateforme soit relevé -

Dépose du mur au Nord de l'édicule de l'angle N.E de
la 5^e plateforme - exécuté sur 10 mètres jusqu'à la
première assise -

Colomettes face Sud - les 2 colomettes se couvrent
pas - et doivent appartenir aux 4 sanctuaires
d'angle - à déposer -

face ouest - Il y a lieu de reprendre la base des 2
colomettes et les parties situées au dessous de la base
située au milieu de la colomette - je fais un dessin de
la colomette N. de la face ouest - Photo de 4 photos -

Visiteurs

dans l'après midi je fais venir le temple d'angkor vat a M^e Simon Sanni ? au Mission Radio - Radio reporter a la Radio diffusion nationale
mercredi 7 avril ^{charge des mission a l'etat} - que-

Batkheng. Dépose du mur situé au Nord de l'édifice de l'angle N. E a la 5° bret forme - on démonte les pierres de la première assise -

Dépose du dallage a l'Est de l'édifice en question - et repose apres avoir surveillé le sol -

Colonnettes. face Ouest - on a retrouvé 2 bases qui pourraient convenir mieux que celles déjà posées - (voir façade Phnom Bot) ^{photo N° 5028} je demande a faire déposer les anciennes bases déjà posées -

Face Sud. on décide avec M^e Marchal de faire déposer les 2 colonnettes déjà posées et qui sont des colonnettes des temples funéraires d'Angkor -

Rassemblement des fragments de colonnettes -

les morceaux de colonnettes se trouvent un peu partout, on décide de les faire tous ramasser au même endroit, sur la face Ouest de façon a choisir les morceaux qui manquent à la base du Batkheng. entrée Est. a la base du monument, le long coté sud menacé de tomber, on décide de faire venir l'équipe qui travaille a angkor vat, (entrée occidentale.) et qui a terminé ses travaux - cette équipe amènera son palan, commencera par remonter le drapéau du sanctuaire central du Batkheng face Ouest, et ensuite remontera le long en question une fois que le toit en latérite aura été réparé -

Photos du Batkheng - la photo N° 3022

leur rapport Janvier 1934 - représente une partie du
linteau que l'on peut remonter sur la face Ouest -
Photo 4029. leur rapport Juin 1936 - donne
une idée exacte de la partie supérieure des colon-
nes du Bakheng -

Photo N° 885 Il y a une erreur dans la descrip-
tion à la photo - ce n'est pas la Tero da de
l'angle côté N. face ouest - mais la tero-
da de la face Nord angle Est -

Baksei Chamkrong - je prends rendez vous pour demain avec
2 coulis d'entretenir pour couper des branches qui
empêchent de voir de la route le sommet du
sanctuaire perché sur la pyramide -

Baphuon et pt de la victoire visite des chantiers avec Mr
Marchal - on décide que dorénavant je
m'occuperais d'angkor vat et du Bakheng et
que Mr Marchal s'occupe des autres chantiers.

Bourneu - Dernier en cours de construction au dépôt du Bayon.
les lettres reparties à Phah-Petou - Baphuon et
Terrasse des éléphants laissent à désirer - voit
si possible trouver un ouvrier (T.P.) qui fasse
meilleurs les lettres -

Baphuon - on a retrouvé la petite morte en or de l'ile
d'Angkor -

Angkor vat galerie Sud ouest - 1 coffrage de contre-
fort fermière - le contre fort sera coulé demain
à la 6^e travée des étair en bois en commençant par
la gauche (Est) -

Galerie Sud Est - 24 pierres de la 7^e assise
remontées - échafaudage à l'ex-hémisphère ouest
fermière - percement de trous dans les
grosses piles -

Phnom-Krom - visite du Phnom-Krom - un tiers de la
tour centrale côté ouest a basculé - a relever -
nécessité de mettre une équerre pour débrayer -

jeudi 8 avril

Bakheng. à l'Est du petit édicule de l'angle N-E de la 5^e plateforme - réunis en place des dalles du sol au Nord depuis du mur de soutènement jusqu'à la première assise -

Sanctuaire central. Colonnées - on a rangé à l'ouest du sanctuaire central tous les morceaux de colonnettes que l'on a trouvés - je demande de réparer les 90 morceaux trouvés - en distinguant les morceaux des grandes colonnettes du sanctuaire central, et les morceaux des colonnettes plus petites des 4 sanctuaires d'angle -
des colonnettes largeur des murs = 10 cm

Hauteur des murs = 16,5 cm

petites colonnettes largeur des murs = 9 cm

Hauteur des murs = 13,5 à 14 cm

Prise d'une photo de colonnette ~~du sanctuaire~~
la Tour en brique (A) située au bas de la pyramide côté est - voir journal de fouilles du lundi 5 avril (croquis) -

au sanctuaire central on a placé un palan devant la face ouest, pour remettre en place le linteau en 2 morceaux trouvé sur la terrasse supérieure - (photo 3022)

lors du Bakheng - une équipe installe un palan sur le bas Sud de la face Est au pied des Bakheng pour reproduire le socle en latérite qui est usé et qui menace de s'écrouler -

Angkor vat = dépôt des pierres de voutes de la 15^e galerie suivant traverse bilieux.

Betonnage du premier contrefort sur la court située au Nord du mur des bas reliefs

dosage du béton 1 ciment { ce qui donne 300
en volume - 2 Sable } Kgs de ciment pour
4 gravier 400 kgs de sable
et 800 kgs gravier.

Galerie Sud Est mise en place des pierres de la 7^e assise - échafaudage en bois de fortune à l'extrémité ouest du chantier - percement de trous dans les piliers -

Petit circuit Dans l'après midi j'accompagne le Radio-reporter Sang Simon à Takeo, Ta prohm, Preah Kroum - R.A.S.

Vendredi 9 avril.

Sisou ^{sud} à l'entrée Est de la nef du Baklung. - échafaudage pour installation d'un palan en cours - lorsque j'arrive sur le chantier, l'échafaudage sur lequel un couli était monté s'écroule - heureusement le couli n'en tire avec quelques égratignures - Remise en place de l'échafaudage - Baklung. Remise en place du dallage de la 4^e plate-forme, après surélévation du sol à l'Est de l'édifice d'angle N.E de la 5^e plate-forme - Sanctuaire central - mise en place du linteau sur la face ouest -

colonnettes - j'ai amené avec moi le derni vautour pour faire un relevé des colonnettes du qd sanctuaire - je fais disposer sur le sol les fragments des colonnettes et nous arrivons à un recouvrement à peu près complet - je laisse le derni vautour pour faire le relevé -

Angkor Wat galerie Sud ouest - je fais arrêter le coffrage du contrefort coulé hier - l'Ecart est de 7 cm entre le niveau de la 7^e assise et la 2^e assise. Dépose des pierres de routes en cours à la 15^e travée - démolition du joint de ciment côté cour sous la boute Confection d'un coffrage en bois pour le coulage d'un nouveau contre fort en B.A -

galerie Sud Est - pose de crampons sur les pierres de la 6^e assise - pose des pierres de la 7^e assise - En tout 49 briques renouvelées, 10 fenêtres fermées terminées sur 14 -

l'Échafaudage posé à l'Est de la 6^e travée en partant de l'ouest est terminé - on va être obligé de descendre les pierres des voûtes côté pilier, afin de remettre en place le linteau entre les piliers 5 et 6 - Ce linteau s'est déplacé au cours de l'assoulement -

Etait en bois le cours de pose, côté de la route du mur des bas relief que l'on ne touche pas -

Samedi 10 avril

Visiteurs

En compagnie de Mr Raus administrateur des S^{es} Célebs recommandé par M. Févre, et de quelques touristes, nous allons visiter le Bayon, la Terrasse du Roi lèpreux, Prah. Palilay, le Palais Royal, Phimeanakas, Baphuon -

Dimanche 11 avril

Angkor vat - Continuation d'un second contre fort en B.T. à la galerie Sud ouest d'angkor vat - le bâtonnage a fait dans la matinée - Pays de l'équipe d'angkor vat -

Lundi 12 avril

Fêtes du jour de l'an Cambodgien - Les couris demandent à ne pas travailler pendant toute la semaine -

Vendredi 16 avril

Départ pour Phnom-Penh - les foreins de la commissarie de la conservation ne fonctionnent plus il est nécessaire de monter à P. Penh pour la faire réparer -

Séjour à P. Penh du 16 avril au 23 avril -

je profite de mon séjour à P. Penh pour régler plusieurs questions -

Recours et cabane - 1^o les 10 tonnes de ciment qui ont été commandées sont parties par barge au début d'avril -

2^o fers - des fers plats ont arrivés à P. Penh je demande un envoi de 300 mètres linéaires -

39/ Palau - le balcon a été réparé et je le ⁵⁷ ramènerai -

40/ Pas de niveaux au magasin - pas de fil à plomb - pas de fils ronds -

Tirages des planches. Vu Mr Vassal chef du bureau technique aux T.P. - Mr Vassal me remet une notice pour le tirage des dessins sur calque - vendé les ateliers de tirage où l'on exécute sous mes yeux un tirage pour me montrer la manière de procéder - j'achète ensuite chez Portail le matériel nécessaire et dans les pharmacies les produits indispensables pour exécuter les tirages -

Voutes d'Angkor Vat. Mr Vassal me demande de lui adresser un relevé exact de la voute de la galerie Sud Est d'Angkor Vat, afin qu'il fasse une épure de stabilité - il me montre une épure faite sur une croûte que je lui ai renvoyée, dans laquelle le centre de gravité de la voute tombe à la limite du $\frac{1}{3}$ central -

Produits photographiques. j'achète chez un photographe les produits qui nous renvoient à Siem Reap : métal - hydroquinone etc ...

Visites de temples. Je profite de mon repos à P. Peuk, pour aller visiter Ta Prohm de Bati, Phnom Chisor et vat Neak au retour - à Ta Prohm de Bati - je constate qu'il n'y a plus de plafonds en bois dans le sanctuaire central, comme ceci est indiqué dans le guide mondiale de 1938 -

je constate par ailleurs que le fronton d'une tour située près de la pagode moderne menace de tomber - Ce fronton a été étagé par les bouzes à l'aide de quelques bâts - et ayant insuffisant -

au Phnom Chisor j'au mis en débouchant sur le temple une batterie de latrias construite en maçonnerie du plus déplorable effet - à l'intérieur le débouchement laissé à désirer -

au Sat Nokor je constate que la période moderne est construite au milieu du temple ancien - Certaines parties du Temple ont été brûlées par les forces - un bouddha doré entre autres -

Mardi 24 avril.

Batkheng - on remonte le mur de roubaisement côté nord, à l'angle NE de la 5^e plateforme - la 4^e assise est remontée - 5 pierres de la 5^e assise sont déjà remontées -

Colomettes du sanctuaire central - porte ouest 2 colomettes sont en place dont il manque 2 fragments - porte sud - des fragments de 3 colomettes sont reconstituées au sol mais il manque de nombreux morceaux - un tirage du dessin de la colomette sera fait pour le chantier -

Sous du Batkheng. on vient ^{Est} de la colline - dégagement des marches de l'escalier au départ - on enlève tous les blocs de latérite qui se disloquent et l'on fait chercher des blocs de latérite au Angkor vat pour les remplacer -

Angkor Vat - on continue à enlever les pierres de voûtes de la galerie Sud ouest - on est arrivé à la travée N° 10 - ~~jeudi~~

lundi 16 avril.

Batkheng. Colomettes du sanctuaire central - j'emmène avec moi le dessin n° 1 et les dessins des colomettes - Porte ouest - je vérifie les dessins et fais qq. corrections - je donne l'ordre de poser définitivement les 2 colomettes de la porte ouest et de couler du béton entre les 2 parties du linteau - quand ce travail sera terminé on s'occupera des colomettes de la porte sud - et de celles des petits sanctuaires -

amphor bat.

je fais décoffrer le contrefort en B.A : du 59
premier contrefort coulé le 8 avril C.A.S. depuis
18 jours - Mr Vassal m'a dit que je pourrais
décoffrer au bout de 8 jours - il y a quelques
trous à boucher - je fais tinter la face extérieure
des contreforts -

galerie Sud Est - toute la pierre de la
70 arrache sont en place - percement des trous dans
les piliers - Remis en place du pilier à
l'extrémité ouest de la galerie -

Mardi 27 avril .

amphor bat

on coule le 4^e contrefort en B.A - et on
décoffre le 2^e contrefort déjà coulé - batteuse
des faces externes -
Le coulage du Beton dans les contreforts , dosage
manipulations etc... arrêtage des coffrages - est
surveillé par Sion et exécuté dans une matinée
galerie Sud coté Est . au moment où j'arrive



on incline avec chaînes et palan
la fut du premier pilier de
l'extrémité ouest de la galerie .

après avoir soulevé le chapiteau et
l'architrave au dessus A'

on va percer les 4 trous à la
base du dit fut en B pour
placer les 4 goupions en fer dans la conserte -
l'opération delicate sera le redressement du
pilier dans l'équilibre des autres piliers .

Tirage

Essai de tirage au burin avec les
renseignements et produits ramenés de
P. Pech - après 91 tâtonnements on arrive
à des résultats intéressants -

Mercredi 28 avril

Bakheng

Colonnettes du sanctuaire central - P⁴-ouest
on a remis en place les 2 colonnettes de cette porte

60

après pose de goussets en fer - coulé un bloc de béton à la colonnette sud, bloc octogonal sans moulure juste sous le milieu de la colonnette - h. tot 15 cm environ - colonnette nord - même travail en cours, manque 15 cm au dessous de la chequerette, l'intérieur - préparation des coffrages pour le coulage du béton -

Mur de soutènement de la 5^e plateforme.

Côté Nord, le mur a été entièrement remonté - nécessité de reculer quelques pierres de l'arcade supérieure pour faire le raccord du mur renouvelé avec le reste du mur qui s'est incliné légèrement vers l'extérieur - Le sol de la 4^e plateforme au Nord du mur qui vient d'être renouvelé est à refaire - il y a lieu de remonter légèrement le niveau du dallage qui s'est enfoncé -

Augmentation de la galerie Sud Ouest. dépose des roches de la galerie côté Nord jusqu'à la 9^e travée déplacement de l'échafaudage qui porte le palan - il sera utile de déposer encore 1 travée et demie - à la partie supérieure des voûtes, les pierres qui ont basculé se présentent bien qu'un espace de 20 3 cm seulement -

On place le coffrage du 5^e contrefort en B.A.




Destruction du Bas Relief de la Galerie S.O et photos.

je demande à son de placer 2 coules avec des broches en chiedant pour nettoyer le bas relief aux endroits où il y a eu des infiltrations - de forte quantité d'eau et l'humidité a touché le bas relief par endroit -

du fait que les voutes sont déposées, le bas relief sont bien séchées et il devrait être intéressant d'en prendre une série de photos. photos à prendre quand il n'y aura pas de soleil ? faire déposer les étais et les remplacer ensuite -

Galerie Sud Est. pierre de la 7^e assise entièrement posée - ou commence à poser les pierres de la 8^e assise - en commençant par le côté Est - 4 pierres posées - Recherche de parties supérieures des piliers.

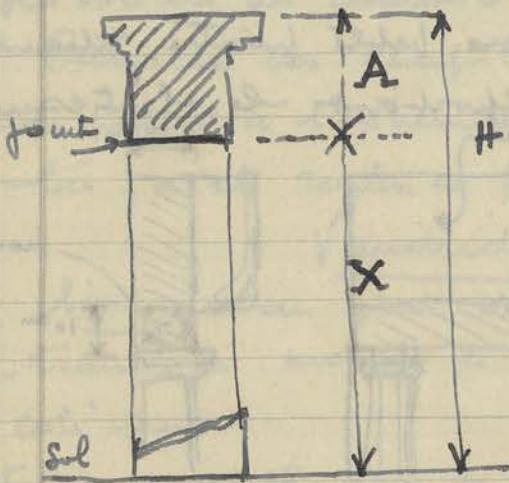

pour déterminer la hauteur X à laquelle on doit poser le haut du fût des pilier éroulé il est nécessaire de rechercher de toute la partie supérieure des piliers allant jusqu'à leurs dimensions - Ces dimensions

(A) variant pour chaque pilier on va commencer la hauteur X que lorsque l'on aura trouvé le haut de chaque pilier - je fais arrêter le percement des trous dans le bas de pilier pour rechercher la partie supérieure des piliers. Examen à l'est de la galerie - le pilier a été mis en place - et l'on remet le linteau et l'arcitrave -

62

jeudi 29 avril

Bakheng.


Lions au bas de la colline Est. Construction du socle en latérite en cours.

Refection du sol de la 4^e terrasse au Nord de l'édicule N.E - repos des dalles après rehaussement du sol avec des morceaux de latérite et d'argile de la terre -

A l'angle N.E du mur de soutènement il manque 5 à 6 pierres des 2 dernières assises - Si on ne retrouve pas ces pierres, il y aura lieu de les remplacer par d'autres de dimensions semblables -

Tous l'édicule de l'angle N.E de la 5^e plate forme, il y a deux de rehausse le niveau du sol qui s'est tassé - Je fais aussi pas trou le niveau que doit atteindre la fondation en Béton -

Soubassement central. façade Ouest. colonnette Côte sud terminée - Côte Nord - en cours - l'intérieur, je fais reproduire le coffrage du linteau et prévois une bûche pourvu reliant les 2 colonnettes et supportant le linteau -

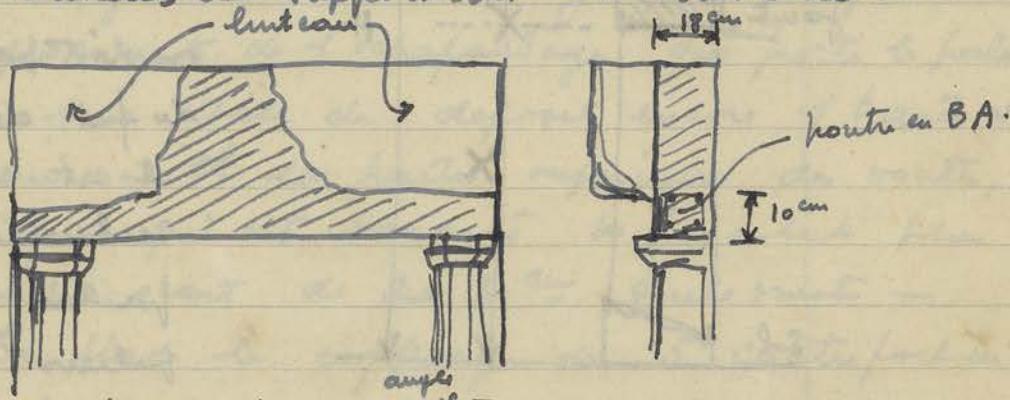

Colonnette de l'édicule N.E de la 5^e plate forme.

Je remarque qu'un bel édicule qui a été démonté, on a déposé 4 fragments d'une colonnette de la face Est - Ces colonnettes n'existent pas sur les autres édifices - Veuillez voir la photo faite avant la dépose de l'édicule.

Angkor vatgalerie sud OuestNettoyage des Bas reliefs. - 2 couloirs min

de brosses en crin, nettoient les bas reliefs aux endroits où des infiltrations se sont produites et où les bas reliefs sont très abimés par des champignons - le résultat est très satisfaisant et toute la couche de moisiure disparaît -

Il y aurait bien de faire des photos de ces bas reliefs dès qu'ils seront nettoyés - (plaques?) -

~~Couloir~~ Contreforts en Béton - on achève le coffrage du 5^e contrefort qui sera coulé demain - démolition du point en ciment sous la route -

Dépose des routes. La dépote des routes continue, on a déjà déposé 44.^m 75 de routes, il reste environ 5 mètres à déposer - (D-86 déposée) -

Galerie Sud Est. Remontage des blocs de pierre de la 7^e assise au portant de l'ouest - (changement de côté) 3 blocs posés coté ouest - libellé d'emporter un tirage de la coupe sur la route au chantier -

Recherche des chapiteaux des piliers - le pilier à l'extrémité ouest de la galerie écroulé a été remis en place -

Vendredi 30 avril.

Bakheng. lions - au pied de la colline coté Est on continue à monter le socle en latérite du lion coté sud -

Augkor vat on a coulé dans la matinée - le 5^e contrefort en Béton à la galerie Sud ouest - construction et mise en place du coffrage du 6^e contre fort - Dépose des pierres des routes et nettoyage des Bas reliefs - galerie Sud Est - les travaux énumérés hier se poursuivent normalement - je laisse au chantier un tirage de la coupe à 0,05 de la galerie écroulée -

Samedi 1^{er} Mai

Congé : fête du travail -

Lundi 3 Mai

Bureau : rédaction du rapport mensuel -

64

mardi 4 mai

Comme il pleut dans la matinée les coulis ne vont pas sur les chantiers ^{aussi} - Pas de visite de chantiers - Travail de Bureau.

mercredi 5 mai

Bakheng. pied de la colline côté Est - Borne posée sous le lion en cours -
monument - édicule N.E de la 5^e plateforme au mur de soutènement à l'angle N.E on a remplacé 6 pierres à l'angle NE aux 2 arrières supérieures. Que l'on est en train de retailler pour leur donner la forme générale de la moulure supérieure -
au Nord du mur de soutènement on a remonté le dallage de la terrasse sur 5^m de longueur environ -
damas du sol à l'endroit de l'édicule N.E -
Sanctuaire central - on a coulé du béton entre les 2 murs d'intérieur de la porte ouest et fait une belle poutre en B.A pour porter le linteau -



Reprise du dessin des 2 colonnettes au chantier angkor vat. Le 6^e contrefort est en cours de coulage -
galerie Sud-Ouest - le devantage de la route est arrêté ~~immédiatement~~ à 16 mètres du côté ouest de la galerie - la bascule des pierres de route étant à peu près nulle - il semble - inutile d'aller plus loin - la démolition du joint de ciment sous l'arrosé de la hauteur de route est terminée -

Galerie S.E. - pose des pierres de la 8^e arrière - en cours - 5 fausses fenêtres couvertes par ces pierres en partant de l'ouest - pour les fausses fenêtres je donne au chantier des instructions pour préparer des armatures.

feud. 8 m² de diamètre tous les 0.2f

0.20 65

feud de
5 m² du
diamètre tous
les 0.2f

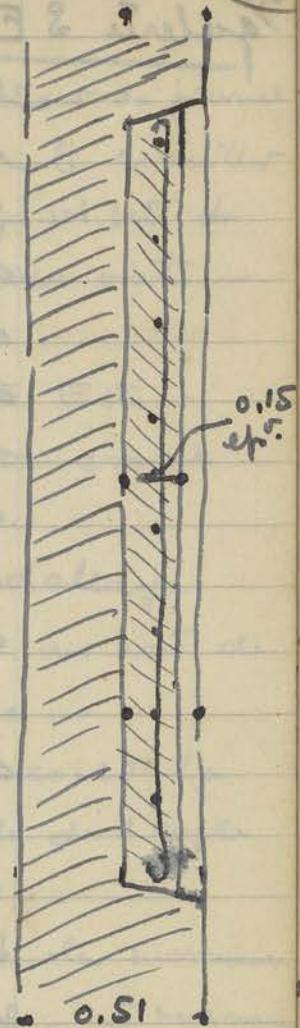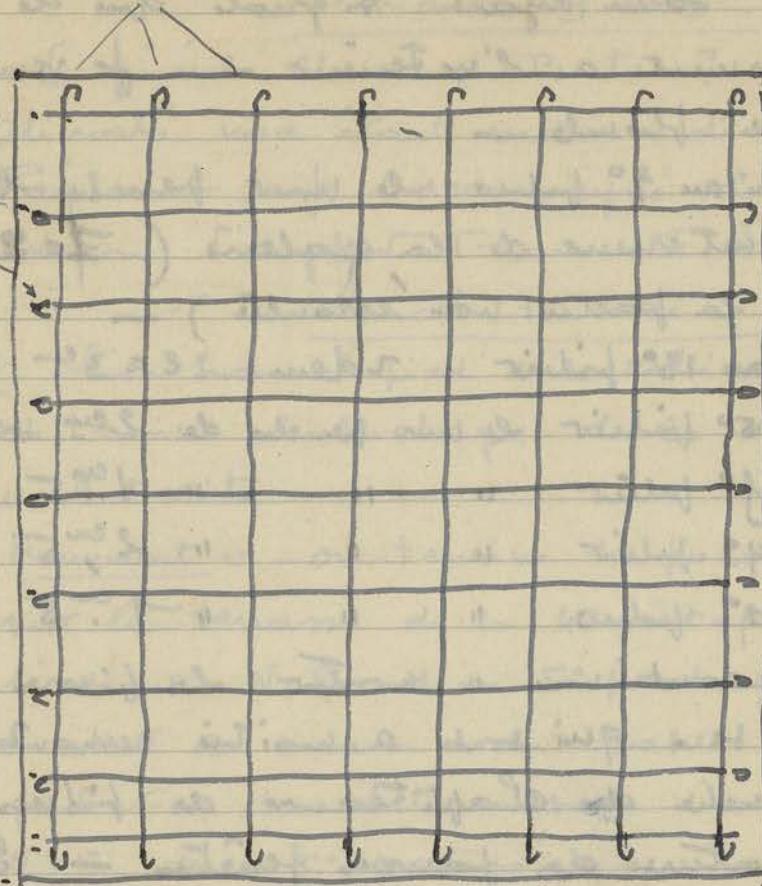

jeudi 6 Mai

Fête de l'ascension.

Vendredi 7 mai

Bakheng. au pied de la colline - côté Est - Construc.
ion des socles en latérite du lion Sud en
Cours -

Monument. Édicule angle N.E de la 5^e plate-
forme - dallage de la 4^e plate forme
côte Nord - 12 mètres de long terminé -
Belles roses belles édifices la partie coulé
arrêti faute de table -

Sanctuaire central. face Ouest - 2 colonnes
terminées -

face Sud - les fragments de colonnes sont
mal posés - je fais recommencer le travail -

Ankor vat. Bas relief de la Galerie S.O -
nous y allons en cours - peu de 3 plus los -
galerie S.O - decoufrage du 2^e contre fort et pose du
coffrage au 7^e contre fort - (3 contre forts ont
été découffés et 3 sont coffrés) -

galerie S.E. - Souu ayant signalé que le mur penche
légerement à l'extérieur - je vérifie avec un
fil à plomb -

jusqu'au 9^e pilier le mur penche légèrement
à l'intérieur de la galerie (3 à 2 cm environ
dans la partie non éroulée) -
du 7^e au 13^e pilier 2deux 2 à 3 cm vers l'intérieur
du 15^e pilier le mur penche de 2 cm vers l'extérieur -
au 2^o pilier " " " 1 cm " "
au 24^e pilier " " " 2,5 cm " "
au 31^e pilier " " " 1,5 cm "

On continue à monter des pierres de la 8^e
assise - qui sont à moitié remontées -

Recherche des chapiteaux des piliers -

armatures des fausses fenêtres - Les arma-
tures de 2 fausses fenêtres sont en cours de
montage - coffrage en cours -

Intensification du chantier - Avec nos marchal

nous calculatrices qui il n'y a pas long de
temps sur ces 2 chantiers - (40 environ)
avec les calculs occupés à chercher des table et
ceux occupés à calculer de la pierre - cela
ne laisse pas assez de monde sur le chantier -

On décide que les 15 ouvriers qui travaillent
au pied du Bakheng vont vont à la falaise
S.E où ils auront terminé leur
travail ~~à la porte~~ - Il y aurait
aussi possibilité d'emporter encore 5 ouvriers
et 1 ^{aide} menuier hier -

Samedi 8 Mai

Angkor vat - même, travaux que la veille - on décide de
changer le caporal qui dirige le chantier de
la galerie S.E avec le caporal qui dirige les
travaux de la porte de la victoire - celui ci était
plus expérimenté -

Dimanche 9 mai

Visiteurs

Le général Chevance Bertin ? directeur du journal Climats nous étaient recommandé par le Conseiller Régional, je l'accompagne dans la visite du Bayon, d'Angkor Thom et d'Angkor Vat -

Lundi 10 mai

Battambang. Ici Sud au pied de la colline côté Est - on termine le bûchage de la dernière assise en latérite -

Monument - on termine la pose du dallage sur la terrasse de la 4^e plate forme au Nord de l'édicule N-E de la 5^e plate forme - on attend du ciment et du sable pour couler la fondation en béton sous l'édicule de l'angle N-E de la 5^e plate forme -

Saintuaire central - face Sud - les morceaux de la colonnette Ouest sont en place - 5 morceaux à la colonnette Est on a retrouvé 4 morceaux seulement qui fai faire mettre en place -

Isarakas. Recrudescence du mouvement Isarakas dans la province - attaque de la ligne à 40 Km de Battambang - 8 tués français - 4 civils et 4 officiers - attaque du poste de Pradak - attaque du poste de Landom - attaque du poste de Kompong Kdeï - attaque du poste de Pust -

Angkor Vat. galerie Sud ouest - dépose de la route arrêtée à la 7^e travée pilier - 22 travées pilier sont déposées - le couloir de chantier sont employés à cause des spores - et à rechercher des sables - le coffrage du 7^e contre fort est terminé - galerie Sud-Est - pose des briques de la 8^e assise sur 14 travées fenêtres on a posé les briques de la 8^e assise de 8 travées fenêtres -

Mardi 11 Mai

Travail de Bureau -

Mercredi 12 Mai

Angkor vat. galerie S.O - nettoyage des Bas reliefs en cours - le nettoyage à l'eau aux endroits de infiltrations est terminé - on nettoie à la bas relief pour enlever la poussière et les taches d'araignées - on a nettoyé aussi à l'eau 4 grands pilier qui étaient devenus noirs - cela a donné d'excellents résultats -

Le 11 Mai sous la surveillance de Loun on a coulé le 7^e contrefort en Beton - et l'on a découvert un contrefort coulé le 27 avril - on patine le contrefort découverte hier - on pose le coffrage du 8^e contrefort -

sur 26 coulis affectés à ce chantier - voici les affectations : 10 chevets de sable - 2 aidant charpentier - 2 nettoient Bas relief. . 12 Carré de cailloux .

Total 26

- la réfection de la route et des boudes jusqu'à la fin de cette semaine -

galerie S.E 11 coulis seulement - les autres coules travaillent à la rigueur et ne veulent plus venir -

pose du coffrage et des armatures à la première fenêtre qui pourra être coulée demain - c'est la fenêtre la plus à l'ouest -

pose des pierres de la 8^e arrière - 11 trous de fenêtres sont posés -

Bakheng. Ici on au pied de la colline côté Est - on a terminé le dock en latérite et reposé

le bton - on fait les joints au ciment entre les blocs de latérite - mais ces joints étant mal faits - fa les faire resserrer - de façon à arrêter les joints en creux -

monument. édicule N.E de la 5^e plateforme
fondation en bton en cours - reste 0.10 cu m
couler - environ -

faubourg angle N.E de la terrasse supérieure -
on a recréé toute la colonnette de la face ouest
Côté Sud - 5 morceaux - complet -
reconstruction de la colonnette côté Nord au sol -

faubourg central. face sud -

mis en place des 2 colonnettes E et O - fa
fais rebiffer la colonnette O. qui n'a pas
été posée très verticale .

Insurgés. le chambellan Chinn me dit que des
paysans ont vu 5 Insurgés armés traverser
par Angkor Thom le 11 Mai vers 13 heures -
Ils seraient rentrés par la porte Ouest et
rensortis par la porte Nord - ?

Jeudi 13 Mai

angkor Vat galerie S.O - nettoyage des bas reliefs et des
piliers - couffetage du coffrage d'un contre fort -
galerie S.E - remontage des pierres de la 8^e
arcade - coulage du Bton de la première fausse
fenêtre en partant de l'ouest -

le dosage est le suivant 2 volumes Sable

3 volumes gravier

1 Vol. ciment

D'après mes calculs voici la consommation de
ciment que l'on devrait avoir -

Volume du remplissage en Bton de la fausse fenêtre:

$$3^m.15 \times 2.00 \times 0.15 = 0.645$$

quantité de ciment nécessaire $\frac{645 \times 1}{6} = 108$ litres

en Kilos $108 \times 1.5 = 162$ Kilos .


70

En sacs de 42^k.5 cela donnera -

$$\frac{162}{42.5} = 3.5 \text{ soit } \underline{3 \text{ sacs } 5}$$

or Soun me dit qu'on a consommé 6 sacs de ciment pour une fenêtre -

quantité de ciment pour contrefort.

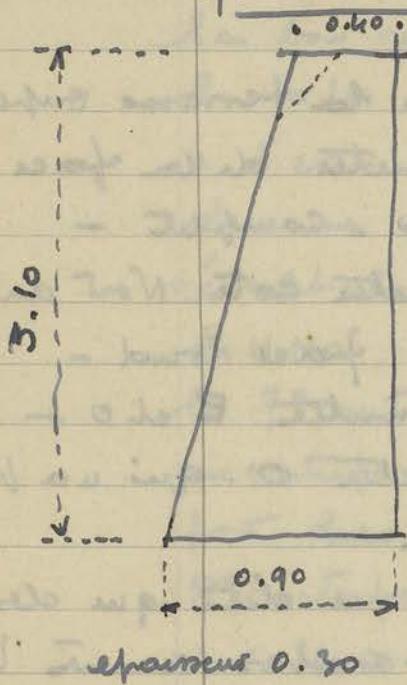

Volume du contrefort :

$$\frac{0.90 \times 0.40}{2} = 0.65$$

$$0.65 \times 3.10 \times 0.30 = 0.600 \text{ m}^3$$

dosage

1	Sel Ciment
2	" Sable
3.5	" gravier
6.5	

quantité de ciment nécessaire pour

$$1 \text{ contrefort} = \frac{600 \times 1}{6.5} = 92 \text{ litres}$$

en kilos $92 \times 1.5 = 138 \text{ kgs}$ -

$$\text{en sacs } \frac{138}{42.5} = \underline{3 \text{ sacs } 200}$$

On en consomme en réalité 4.5 ^{sacs}

quantité de ciment nécessaire pour travailler
restant à espacer -

Reste à espacer 9 contreforts

$$\frac{13 \text{ fenêtres}}{22} \times 3.5 = \underline{77 \text{ sacs}}$$

d'après Soun cela ferait

$$9 \text{ contreft. } \times 4.5 = \underline{40.5 \text{ sacs}}$$

$$13 \text{ fenêtres } \times 6 = \underline{78.00}$$

$$\underline{\underline{118.5}}$$

Or il reste actuellement au dépôt 195 sacs de ciment -

Il faut donc vérifier 10% du poids des sacs de ciment

- (77)
- 20) la largeur exacte des fenêtres -
 - 30) Vérifier à ce que l'épaisseur des fenêtres a
comblé avec du béton soit 0^m.15 fait
prise au milieu de la fenêtre et non sur
les bords -
 - 40) Vérifier que sur place le dosage dont
vous exigez est -

Vendredi 14 Mai

On avec Mr Brunet la question de la consomma-
tion de ciment -

En principe pour avoir 1^{m³} de ciment armé
il faut 800 litres de gravier
400 litres de sable
300 Kgs de ciment

Pour les fausses fenêtres il faudrait donc :

$$\frac{300 \times 645}{1000} = 193 \text{ Kgs} \cdot 500$$

et en sacs $\frac{193,5}{42,5} = 4 \text{ sacs } 55 -$

Ce qui correspond à ce qui a été consommé pour
les contre forts - l'erreur doit donc provenir
du fait que pour l'épaisseur des fenêtres on
a pris 0.15 sur les bords. et qu'on entre
le dos de y avoir plus de 0.15 - Pour les
autres fenêtres je ferai prendre les mesures au milieu
des fenêtres -

Angkor vat - galerie S. ouest - nettoyage de grands
puluas dans galerie - Confection du coffrage
du 8^e contre fort - les autres coulés peuvent être bâti et
galerie S. Est - 1^{re} fenêtre coulée -

pose des dernières pierres de la 8^e assise -

Bukhang - leur côté sud - terminé -

leur côté Nord - en cours - on enlève la
terre - et l'on replace quelques blocs de talus -

Bakheng - Edicule N.E. de la 5^e plateforme - Béton fondation terminé - il faut attendre une semaine environ - que le béton passe bien avant de remonter l'édicule -

Sanctuaire d'angle N.E. de la plateforme supérieure - préparation des colonnettes belles jugs entre les pierres des angles - Sanctuaire central - face Sud - colonnette O terminée - colonnette E l'offrage et Béton en cours -

Samedi 15 Mai

Je suis parti des fêtes de la Pentecôte pour aller à Phnom-Penh -

Mardi 18 Mai

Retour à Siem-Reap.

Mercredi 19 Mai

Bakheng. Béton au pied de la colline côté Est - la roche du lion Sud est terminé - la roche du lion Nord a été refait 20 mm environ car il faut attendre et l'équipe qui s'occupait des travaux est allée à Angkor Vat - galerie S.E. - Monument. Sanctuaire central - face Sud - colonnette O - terminée - colonnette E - 4 morceaux en place posés avec des fers - reste à couler le béton -

Sanctuaire d'angle N.E. - on a démonté les pierres de l'angle N.O - de façon à enlever la terre et les racines -

Angkor Vat - galerie S.O - le 8^e contre fort a été coulé le 18 Mai - on a commencé la mise en place du 9^e contre fort - la réfection des pierres de boute est suspendue provisoirement le boulis étant occupé à couper des pierres et à rechercher du sable -

galerie S.E. - Coulage du béton de la 2^e fausse fenêtre au portail de l'ouest - les pierres de la 8^e assise sont toutes en place -

Remise en place des pierres de routes de la galerie côté ouest - actuellement sur cette galerie on a trois équipes qui font les travaux suivants :

1^{er} équipe - remise en place de la route côté O.

2^e " " Coulage du béton dans les fenêtres

3^e " " pose des chevres et d'un palan pour remonter les pierres détachées au dessus des gros piliers - (architrave, chapiteau, etc...)

jeudi 20 mai

à nouveau mat et au Brak-heng même travaux en cours que la veille.

vendredi 21 Mai

Brak-heng -

Edicule d'angle N-E de la 5^e plate forme - pose des pierres de la 1^{re} assise inférieure - une pierre côté Nord s'encastrant dans les pierres du mur de soutènement Nord - permet de placer l'ensemble - La difficulté vient ensuite pour placer toutes les pierres de la 1^{re} assise sur un plan horizontal, car ces pierres sont de hauteurs inégales et il est impossible de trouver une forme en béton qui tienne compte de ces différences - En principe il faut faire une forme en béton à un niveau légèrement inférieur puis de placer chaque pierre bien au niveau -

Sanctuaire angle N-E de la terrasse supérieure - face ouest - on a remis en place les pierres de l'angle N.O. après avoir enlevé la terre et les racines. Ensuite on a fait le même travail pour l'angle S.O. malheureusement au cours de ces manipulations les sculptures ont un peu souffert -

4 juillet

Sambour central - face Sud - la colonne

Est est en place - mais le caponnière a fait faire

q.s. moulures en ciment que je fais enlever -

Anghkor vat - galerie Sud ouest - préparation du coffrage
du 9° contre fort -

galerie Sud Est - pose des armatures à
la 2^e fausse fenêtre -

d'autre côté - on remonte les linteaux qui
reposent sur le gros pilier - 3 linteaux

ont été remontés au niveau de la galerie -
Toute cette ouest - on continue à remonter

les pierres des voûtes qui ont été déposées pour
réparer le pilier brisé par l'explosion -

Plafond - M. Marchal est d'accord avec le dessin du
plafond que j'ai établi de supprimer le
q.s. le sac du milieu et de faire toutes
les 2 faces semblables - cela serait évidemment
plus simple -

Samedi 22 mai

Anghkor vat - galerie S.O -

Couloir du Belvédère du 9° contre fort - Le
couloir se fait dans la matinée et Loun
assiste à toute l'opération -

Batkheng - Édifice N.E de la 5^e plateforme - on
met de nouveau les pierres de la 1^{re} assise -

Lundi 24 mai

Demande aller à Phnom-Penh demain
en vue d'un débarquement au terminus des T.P.
M. Marchal fait avec moi la visite
des chantiers -

Batkheng - liaison au pied de la colline - 2 contre
arrangent les blocs de datente du mur Nord -
ils remplacent les blocs fournis par des blocs
de datente en bon état - je demande au

qui va faire des caniveaux à chaque côté de l'allée centrale afin de faciliter l'évacuation des eaux —

Mouvement. Edicule angle N.E. 5° fléchi. on met en place les pierres de la 1^{re} assise. il s'agit de placer ces pierres bien horizontales de façon à ce que les ardoises soient éventuellement montées — au moment le niveau on constate que les pierres ne sont pas bien horizontales — Senn est chargé de repasser et après midi pour voir la question.

Photos. J'indique à Mr. Marchal que pour le rapport au mois de Mai — il y a 3 photos à prendre au Battambang —

- 1^o) lions au pied d'une colline —
- 2^o) Saut. central — face Ouest
- 3^o) Saut. central — face Sud —

Angkor Wat. Galerie Sud Ouest — perfection du 10^e contrefort (coffrage en bois) — galerie Sud Est — on remonte au niveau de la galerie — les pierres des architraves — 7 architraves sont montées — on met en place les pierres de la voûte côté Ouest —

Les autres couloirs sont occupés à poser des pierres et à rechercher du sable —

Ciment. Il convient de commander chez les cours encore 5 Tonnes de ciment —

and in the first place you get enough
time to do it before you have to go back
to my office and if I'm not there as they were
not available to stay longer because
there was something else to do at school
and so I did not go back until after
I had my first class. And then I had
to go up to the main office and get my
final assignment and I went to the front
of the room and everything if you go back to the front
you just stand in the front of the room and say
Please give me my final assignment. And you
will get what you're looking for. I don't know how
many people are distributed as far back as
but what's the distribution? And you just go back
and say give me my final assignment. And you will
get what you're looking for.

— Could you just do a step by step for us
on how you got your assignment
in the first place? Like what's the first step?
What's the second step?
And so on and so forth.
So you know exactly what you have to do.
And what you have to do next.
And what you have to do after that.

(13h12)

Journal de Fouilles XX
Marchal (Suite du J de F XIX)
1948

Dimanche 31 Octobre

Visites - Un avion venu directement d'Hanoï à Siem reap ayant amené un grand nombre de touristes du Tonkin j'ai fait visiter le Grand et le Petit Circuit à m^mnⁿ: Nguyen-Dinh-Luyen, pharmacien à Hanoï et Valençot, Directeur des Services économiques du Tonkin, tous deux recommandés par le Directorient, ainsi qu'à leurs amis et autres personnes faisant partie de la Croisière.

Lundi 1 Novembre -

Congé de la Toussaint.

Visites - J'accompagne les mêmes personnes que ci-dessus dans la visite du temple d'Oukor Vat

Mardi 2 novembre.

Oukor Vat - Par suite du mouvement de renversement du mur des bas reliefs A et du mouvement d'affaissement des piliers B la repose des assises de la voûte du côté A (nord) arrive au niveau de la 3^e assise à un décalage en hauteur et en même temps à un intervalle median en rouge cicontre qu'il faudra reboucher au béton après ancrage d'un Crampon pour donner plus de cohésion à l'ensemble de la voûte en reliant entre elles les assises n° 3.

A V
gal S (0)

Visites. — L'avion Aigle Azur ayant été retardé à propos et le départ des touristes du Cambodge reporté au lendemain, j'utilise l'après-midi la Camionnette de la Conservation munie de confortables panneaux en rotin, prêtés par l'Hôtel, pour une tournée supplémentaire à Ankor Thom, à laquelle prennent part également, mme Valençot et Goyet et mesdames Blivet et Langlois.

Je leur fais voir des endroits qui ils n'avaient pas vus lors d'une première visite, en troupeau, Thommanon - Chau Say - le Vieux pont et au retour on utilise le nouveau sentier qui dessert les temples du Prah Pithu avec arrêt aux deux belles pièces d'eau, Sokha Prah Pithu et Trapèze Ta Tuot. Cette petite promenade dans la brousse a beaucoup intéressé.

Se ces 4 personnes que j'accompagnais et qui ont été charmées, littéralement, par le pittoresque des sous-bois; des singes ont ajouté encore au pittoresque. Il y a là un coin d'Ankor Thom qu'il ne connaît.

Trop dans les tournées touristiques: le charme de ce coin de verdure repose les visiteurs à qui l'on impose des architectures successives, un peu lassantes pour qui n'est pas spécialisé dans l'archéologie. La beauté majestueuse, mais imposante et sévère, des grands temples, finit par donner une impression d'ému, à qui n'y est pas préparé. Ce coin d'Ankor Thom autour du Prah Pithu dont les temples se profilent, discrètement en second plan, dans la verdure des sous-bois, fait une diversion très appréciée. Et puis, les touristes eux-mêmes me l'ont dit, la visite des temples

N° 5.
Vis.

B.P.
B.
A.T.

"en troupeau" est horripilante et suffirait à vous dégoutter à jamais de l'art khmer.

Mercredi 3 novembre.

Bathen

On a révisé le dallage de niveau et fait un léger bêtonnage à l'endroit où reposait les assises de bases de l'édicule du 5^e grain qui vient d'être déposé à l'Est du person Sud : on commence le remontage des murs en mettant en place la 1^{re} assise moulurée à la base.

Le Caporal de cette équipe ayant retrouvé un certain nombre de pierres moulurées provenant du sous-sol de la plateforme Centrale (celle n°4 sur le Croquis ci-dessus) est en train de voir si on peut les repérer à leur emplacement primitif. De même certaines pierres supérieures provenant des échiffres décrites de bas reliefs des piliers de la même plate-forme pourront être remises en place.



Arikor Sat

Des cavités du dallage et d'anciens trous ronds, ayant servi probablement à encastres des montants en charpente (support de dais ?) sont bouchés par du béton de ciment, en vue d'éviter des accidents et au même temps de supprimer les stagnations d'eau dans le passage central menant de la chaussée Ouest extérieure à la chaussée intérieure.

Panne d'avion

Content surpris à 17 heures de voir arriver les personnes que j'avais accompagnées hier qui viennent me rendre visite au Bureau de la Conservation. Elles n'ont pas pu partir le Dakota aigle

Visite

Visite

Azur s'étant, paraît-il, embourré au moment de décoller du terrain d'aviation. Leur départ est de nouveau retardé.

Vendredi 4 novembre. Jeudi 4 novembre.

Le Dakota aigle azur étant encore enlisé, le départ est reporté au lendemain et y emmène avec moi Mme Blonchet Langlois et McGoyet faire la tournée des chantiers. Les touristes de la Croisière du Tonkin commencent à témoigner un peu d'impatience et d'ennui d'un séjour aussi prolongé.

Batikhein On a déjà remonté 6 assises des murs du Reg de chaussée de l'édicule en cours de reconstruction.

On continue à rechercher des pierres tombées du parement du soubassement du massif Central (p. 79).


Porte de la Victoire - Les reprises à la balustrade des géants porteurs de naga sont terminées, on revient à l'angle extérieur Sud-Est de la porte pour essayer, avec le peu de blocs sculptés retrouvés, de compléter l'éléphant tricéphale. On pourra remettre les écrans qui gisent - en morceaux - dans les pierres de déblai, plus un fragment de tête du pachyderme, mais on est réservé à remplacer par un blocage en latérite toutes les parties manquantes et qui sont malheureusement très nombreuses.

Vendredi 5 novembre.

Baphuon - Les murs de soutènement en latérite d'abord obliques à la base (XIX - p. 166) puis perpendiculaires à la façade Est du Prasat 2 sont arrivés à un niveau qui est

Bap

sensiblement le niveau du dallage en latérite de ce qui reste encore en place du gopura 2 nord je fais rechercher les bases d'avant-corps montures des murs latéraux Est du dit Gopura. Le niveau s'avère assez inégal entre la partie de base A (au Sud) et la partie symétrique B (au Nord) cette dernière ayant subi un mouvement d'affaissement assez prononcé tandis que l'autre côté ~~est~~ garde son niveau d'antrefois.

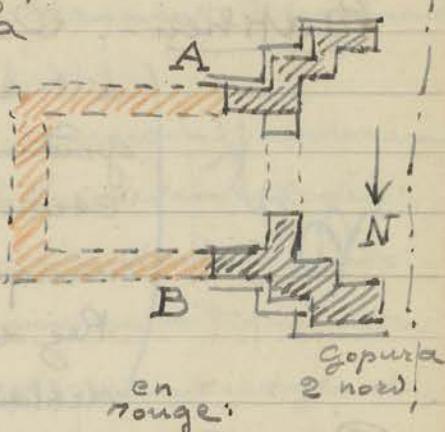


Le problème se présente donc assez delicat pour remplacer les assises que l'on pourra retrouver dans la partie en rouge du Croquis Ci-dessus, et établir un niveau de base commun.

Garage pour Auto Résultat de l'adjudication pour la Construction du garage : à 15 heures un seul entrepreneur se présente Monsieur Nguyen Huu Quan; on ouvre les cinq lettres d'entrepreneur passées au bureau pour soumissionner, et Monsieur Ng. Huu Quan faisant les offres les plus avantageuses, avec 20 % d'augmentation sur les prix (les autres demandant 21 ou 22 %) c'est à lui que le travail est confié. Le délai d'exécution prévu est de un mois à partir de ce jour.

Samedi 6 novembre.

Dirkior Vat En allant surveiller les coules qui grossent et nettoient Prau Cruciforme. - hebdomadairement (le Samedi - jour de nettoyage dans les villes de Flandres) les piliers en crasses du cloître ou Prau Pān je remarque que les petits piliers des demi-voutes latérales ont presque toutes les moulures de bases disparues du côté intérieur de la galerie (en rouge)

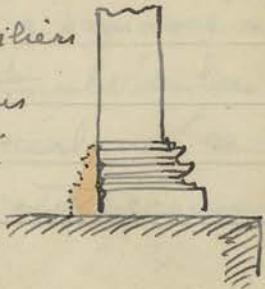

A V
Prau

XV

Le grès de cette partie de base moulurée a du tomber désagrégé par l'humidité. Ce qui est curieux c'est que ce travail d'érosion ne se soit produit que du côté intérieur.

Batkhéi - On remonte la neuvième assise correspondant

Batk

à l'assise de base du 1^e étage de l'étage du 5^e gradin à l'Est du perron Sud en cours de reconstruction. Le Caporal a pu récupérer une pierre qui manquait à l'angle Sud-Est de la corniche du Rez-de-Chaussée : cette pierre fut nettoyée dans les déblais à la base Sud de la pyramide.

Palais Royal

Terrasse d'Honneur Coulé sous la partie de base du mur de revête-

Pendant que le béton

coulé sous la partie de

base du mur de revête-

ment Sud Seche (en rouge)


On reprend le dallage, très fortement affaissé, de l'angle Nord-Est de la partie supérieure de cette avancée de la terrasse A ci-dessus. La partie centrale G ayant été remontée primitivement, avant la partie inférieure en cours de reconstruction, le niveau B du haut du perron reconstruit récemment est plus élevé que celui de la base G du perron suivant.

P R

Voir J.-de-F. XIX p. 4 - 6 - 9 - 10 - 11 et surtout p. 15 en bas. Je résume ce qui a provoqué l'état actuel de dénivellation entre les points B et G.

Le travail comme il résulte du J.-de-F. XIX sur mentionnée fut entrepris au début en pensant ses limites à quelques fragments de magoumerie du perron supérieur G ci-dessus qui présentaient un affaissement d'où inclinaison du mur.

Peu à peu au cours de ce travail il fut recommu- que pour remettre en place les magoumeries en

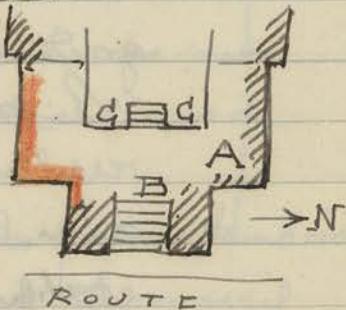

question il fallait reprendre tout le massif entre la pierre G, ce qui fut fait. mais le remontage de la partie centrale a provoqué une dénivellation de 0° 11' (J. de F xix bas. de la p. 24) avec le dallage pourtourant. Je crus pouvoir y remédier en attaquant le parement du mur inférieur Nord (loc. cit. - p. 39)

P.R.


C'est aussi que petit à petit, morceaux par morceau j'ai été amené à faire ce travail de relevetement de niveau des magoumeries du pierre central. J'arrive aujourd'hui au changement de niveau indiqué entre B et C. On reprend le dallage pour essayer de ne pas être obligé de descendre à nouveau la partie centrale G. Trop basse. Là grosse erreur c'est d'avoir commencé le travail par la partie haute et non par la partie basse et de n'avoir pas prévu au début toute l'amplitude du dit travail.

Lundi 8 novembre

Jour de Congé pour le personnel Cambodgien
Fête du Tawng Toc.

Bayon. - Allé constater sur place la chute d'un fragment de fronton provoqué par un touriste - probablement un militaire qui a sans doute essayé d'escalader une tour.

La chute a été provoquée à l'angle Nord-Est de la tour 44 en rouge Ci-contre (cfr. Plan Parmentier BEFEO. 1927 - Pl. V p. 162)

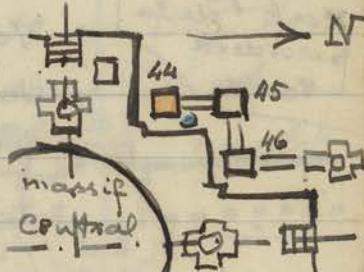

JP s'agit d'un naga décorant l'angle de cette tour - très accessible de la terrasse supérieure et qui s'est brisé dans sa chute (au point bleu ci-dessus) sur le sol du 2^e étage en plusieurs morceaux.

Le gardien qui a constaté la chose, a ramassé à cet endroit un style, probablement tombé de la poche du grimpeur. Personne n'a réclamé ce style peut-être dans la crainte d'être reconnu

Vandalisme

et de devolts.

Baphnum - On commence à replacer les assises de socle et de base moulurées retrouvées dans les déblais aux amoncelles de murs Sud et Nord de la calle Est du gopura 2 Nord (A et B sur le Croquis en haut de la p. 81) La première assise inférieure, celle du socle, est un simple revêtement de 2.1 cm d'épaisseur plaqué contre une infrastructure en latérite, tant au moins à la base du mur ~~à~~ Sud et il faut agrafes cette pierre avec des clous pour lui assurer un peu de solidité'.

Mardi 9 novembre


Congé du Tang Tok pour tout le personnel néanmoins les chantiers continuent à travailler.

Antorvat Le Caporal me fait observer des fissures Galerie Sud (E) qui se sont produites à l'extrémité des poutrelles en Ciment supportant le plafond en dalles moulées.

Ces fissures sont sur la partie qui repose sur la corniche sous la voûte en 2 b ci-dessus. On ne voit qu'en la cause du mouvement qui a provoqué cette fissure puisqu'elle se présente à un endroit qui repose sur le rebord de la corniche: aucun travail n'existe dans la poutrelle à cet endroit. Le Caporal me donne une explication, le ciment utilisé pour le béton n'est pas en très bon état et a commencé à faire pris dans certains sacs.


Oussi j'acquiesce à son conseil de mettre une barre de fer supplémentaire, ce qui

x a 6 cm de la paroi de la voûte

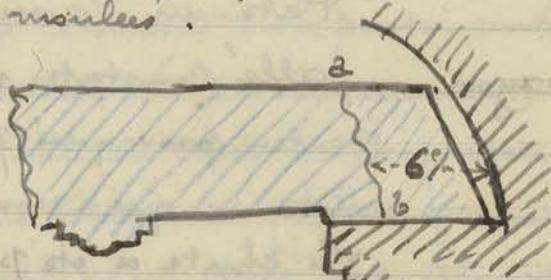

portera à 3 le nombre des barres enfermées dans le béton des poutrelles, ce qui revient d'ailleurs à ce que j'avais prévu au début (XIX p. 147)

Je note quel écartement entre les 2 parois des murs au niveau de la corniche a varié depuis le début.



extremité Ouest de la galerie. A cet endroit l'écartement de moulure à moulure étant de 2.18; il est maintenant, au droit du 4^{me} pilier (en venant de l'Ouest) de 2^{me} 22.

Mercredi 10 novembre.

Palais Royal

En enlevant le massif inférieur en latérite Terrasse d'honneur, sous le dallage entre les 2 perrons Centraux (B et C sur le Croquis p. 82) on trouve des morceaux de briques mélangés à la terre. On retrouve encore de la brique dans l'infrastructure derrière le parement sculpté Sud que l'on est en train de renouveler. (en rouge sur le Croquis XIX p. 183 en haut) Cette brique confirme ma supposition d'anciennes constructions antérieures à la construction de la terrasse (XIX p. 82 et 173)

Autorisation

Galerie Ouest du

1^{er} étage

On place une poutrelle en béton armé

de 4 fers de 12 sous la partie cassée du

linteau du Cadre de la porte au Sud de l'entrée centrale axiale de la galerie Ouest du

1^{er} étage en A ci-

contre. Il faudra

prévoir une consolidation analogue au


linteau Vrai du Cadre

accédant à la rangée sud-Ouest des

bûcheuses allignées du portail principal. Ce linteau

fissure aux 2 extrémités avec l'élargissement

des crevasses qui se reproduit au grès du



*T
galerie
Ouest*

Temple d' Antor Vat, qui est peut-être le gres le plus friable des monuments Khmers, risque de tomber, dans un jour plus ou moins proche.

Jeudi 11 novembre.

Fêtes et

Receptions ma journée est passée comme suit.

à 8^h30 Prise d'armes et défilé des troupes

10^h30 aperitif d'honneur chez le Chef de la Sureté qui vient de recevoir la médaille militaire.

16 heures - Cérémonie au Vat monastique pour le Banhcho Sema

19 heures - Lunch et réception chez le Conseiller Régional.

Vendredi 12 novembre.

Antor Vat.

On place les dalles moulées du plafond Galerie Sud (E) sur les ^{quatre} ~~deux~~ travées suivantes. (voir

XIX p. 186) — On avance dans la partie Ouest de la galerie qui n'a pas été percée et, encore 7 ou 8 travées, on va se trouver à l'endroit de la galerie qui est en cours de réfection. Or du côté des grands piliers on est en train de replacer les blocs au dessus de l'entablement, au niveau départ de la voûte (Voir profil p. 174 J. de F. XIX)

Malheureusement un

Certain nombre de ces blocs


au lieu de présenter le profil

Complet de la p. 174 ont le rebord de la corniche intérieur, sur lequel doit

reposer la poutrelle du plafond, cassé (en rouge ci-dessus) D'où complication à ces endroits la pour placer la susdite poutrelle qui se trouvera sans rebord A

87

A T
Plafond pour la supports. Il faudra aviser pour fixer la poutrelle, soit en créant une sorte de console à l'endroit déficient, soit en encastrant l'entremité dans la pierre comme sur le croquis ci-dessous.



Point de vue — Le chef chantier Suon veut interdire touristique.. la montée des habitants au moyen d'un bambou sur le sommet des ~~thnot~~ borassus devant la galerie Ouest du Temple d'Akorvat. D'après lui cela n'est pas compatible avec la majesté du monument. Je m'y oppose: — Cette manœuvre devant servir aux habitants à récolter le suc de palmiers dont ils font du sucre: je n'ai aucune raison d'empêcher ces braves gens de se livrer à cette industrie dont ils retirent quelque profit et chose importante qui ne nuit pas au monument.

La « Majesté du temple » exigerait que je fasse disparaître complètement ces borassus comme j'en avais eu l'intention à une époque.

Qu'en avis ils détuisent l'harmonie des lignes architecturales. Or si j'les ai maintenus sans donner suite à mon projet, C'est que toutes les personnes à qui j'avais fait part de mon projet, je dis toutes, m'en ont dissuadé en me demandant le maintien de ces palmiers (je ne me suis pas vanté d'avoir fait disparaître un énorme et magnifique manguier au nord du perron central d'accès — sans consulter personne) Devant cet avis unanime j'ai donc laissé les palmiers: oh! J'en ai bien fait disparaître cependant quelques uns.

Or ai-je répliqué à Suon, Ces palmiers font donc plaisir à voir aux visiteurs (dont 90 sur 100 préfèrent la nature, la verdure aux architectes) et pour mettre le comble à l'attraction

AV
Tourisme

la vue des grimpeurs sur la bambou pour aller faire la tangue remplira d'aise ces visiteurs.

Diversions à l'austérité - rébarbatrice pour certains de l'architecture.

Trouvailles Un couli me remet trouvée par lui dans la brousse de Phnom Thom un assez joli vase de forme ancienne d'un galbe très rieur et d'un type assez

fréquent; malheureusement toute une partie du col est cassée

Le décor est constitué par une simple ligne en dents de scies très caractéristique de cette époque ancienne.


Ancienne Conserve: pâte fine et bien cuite.
mis sous le N° 375

Samedi 13 Novembre

Prak Pithu - Je profite de la présence d'une équipe au Prak Pithu pour aller revoir la terrasse bouddhique G (BEFEO - XVII - 8 - p. 25); j'avais retrouvé une ancienne note dans de vieux papiers pour me rappeler d'aller prendre un sari resté in situ - papier écrit en 1918 (il y a 30 ans) Un couli me fraye un chemin jusqu'à Krus Trapai Rondan Athlai du nom d'un étang situé à proximité à l'est et à environ 200 mètres au Nord du bassin nord du Prak Pithu (voir loc. cit. p. 41)

Terr. bouddh.

Très embroussaillé le Krus ou Terrasse bouddhique G en question montre à l'heure actuelle sur une légère eminence de terre 1 bouddha assis sans tête et bras cassés, & une figurine assise à la javanaise,

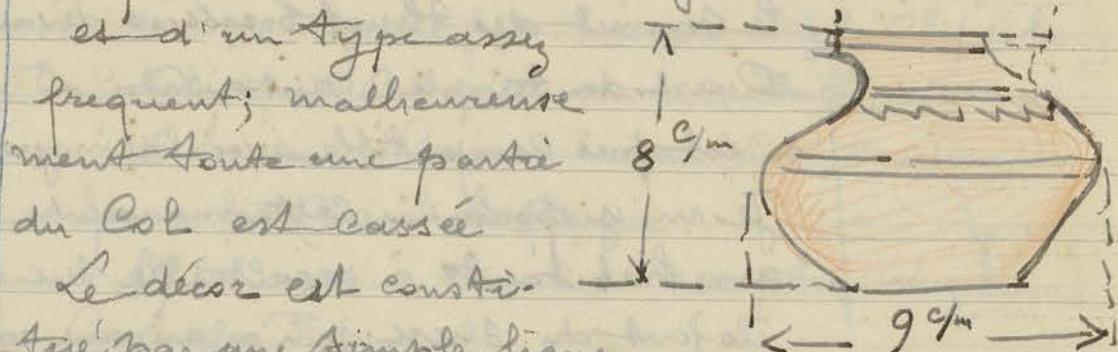

sans grande valeur, deux balais Carrés et de menus
débris sculptés sans importance.

Bout de la terrasse
Le 1er

Je fais ramener ^{pres du Srah nord} au dépôt un petit de support de
balustrade de nager décoré d'atlantes et une redu-
ction d'édifice. A une vingtaine de mètres plus à
l'Est sont 1 Sen - 1 boeuf couché - et ce que
les indigènes appellent une marmite sorte de grande
terrine - ^{U 16} 1 thain - en réalité une pierre de
couronnement de prasat à décor de pétales de lotus
dont j'avais donné le Croquis dans mon article (loc
cit. p. 26 fig. 5 en bas) Je fais ramener ces 3 derniers
motifs au dépôt du Bayon.

Bakhen - On a terminé la reposse des pierres de l'édicule

à l'Est du perron Sud de la 5^e plateforme.
Le Caporal ayant retrouvé à la base de la
pyramide divers fragments de couronnement en
forme de Kalasa, après plusieurs essais qui ne
donnent pas satisfaction, on place au sommet
un demi-motif qui de loin terminera la silhouette
de cet édifice de façon satisfaisante.

On commence à édifier le échafaudage au-
dessus de l'édicule d'angle Sud-Est que l'on
va reprendre en anastylose; toute une partie
de la façade Sud du Rez de Chaussee est forte-
ment déversée, et beaucoup de pierres
manquent à cet endroit. Le Caporal me
dit en avoir retrouvé à la base de la pyra-
mide ou sur les gravins inférieurs un cer-
tain nombre.

Dimanche 14 Novembre.

Visite
Paye des Coulis que Tourny veut bien faire
à ma place, devant accompagner le Colonel
Baufré et sa femme qui a demandé au
Capitaine Séchet (à mon instigation) à aller

90

Voir Bantay Samre. Les 4 galons du Colonel font leur effet et le Capitaine Sechet, à mon grand contentement, prête l'escorte nécessaire pour s'aventurer à l'Est de Phnom Penh.

Lundi 15 novembre -

Visite - Accompagné Monsieur Vignole un des Directeurs général de la Shell et M^r Duchesne Directeur des Etablissements Shell de Saigon à Ankor Thom - (montée au Battambang à elephant, M^r Vergoz me fait remarquer que c'est là un fait tout à fait exceptionnel les elephants n'étant autorisés qu'à aller en ville et faire le tour de pelouse devant l'hôtel) L'après midi, avant le départ qui a lieu à 16 heures visite très rapide à Ankor Wat. Ces 2 messieurs me sont recommandés par télégramme spécial du Directeur du Service Economique M^r Barbeau.

Mardi 16 novembre

Visite - Allé avec Monsieur Coloma administrateur des S.C. et Directeur de l'Office du Tourisme voir les travaux de douves d'Ankor Wat et avec l'Ingen^r des G.P. M^r Brunet l'état actuel du Bungalow dit Hotel des Ruines en vue des travaux prévus sur le Crédit du Tourisme. Un commencement de remise en état du dit Bungalow a consisté en remplacement de menuiseries, mais la présence de militaires rend difficile et quasi impossible de faire des réparations sérieuses. Des chambres au fond sont occupées par les chevaux des équipes montées, une Compagnie de parachutistes doit incessamment venir s'y installer. L'inauguration du

musée de l' E.F.E.O n'est pas encore prochain.

J'ai fait part à M. Colonna des travaux exécutés par moi sur le budget tourisme et il m'a demandé copie des rapports sur ces travaux tout mentionnés. Pour les plaques signalisatrices il est d'avis si le texte en caractères Khmers n'est pas demandé par le Cambodge, de s'en tenir au texte en français.

Phnom Kroum Le soir allé sur le Phnom Kroum assister au dîner offert par le Chef de la boulangerie en l'honneur de la Cérémonie du Bouddha Sema. plantation des pierres Semas. C'est la 1^{re} fois que je vois les temples du Phnom Kroum la nuit par un clair de lune splendide : ils gagnent beaucoup à être vus sous cet éclairage qui leur confère, comme aux temples du Bayon et d'Angkor Vat, un caractère irréel et fantastique qu'ils n'ont pas sous le soleil. Ils prennent un aspect presque vapoureux et l'architecture s'allège ; surtout en l'occurrence le gris rouge, délite et corrodé des façades, paraît ravale à neuf.

Mercredi 17 novembre.

Palais Royal

Terrasse d'Honneur - de l'avancée principale de cette terrasse se continue en même temps que la reprise pour en relever le niveau du dallage entre les 2 perrons (p. 82) une pierre A LE A du bandeau couronnant la frise des lions Cariatides a été retrouvée et mise en place.

Angkor Vat


Galerie Ouest On place une poutrelle en béton armé sous le linteau fissuré de la porte latérale Sud donnant accès à la galerie des buddhas du Prasat Poan (B sur le croquis bas de p. 85)

partie centrale

Autor Vat -

au 3^e étage le linteau de l'entrée du porche Ouest central principale du porche Ouest est assez délitée et fissuré et se détache par lamelle. J'hésite devant le splendide décor qui tapisse la face inférieure de ce linteau à y placer une poutrelle en béton qui la déshonorerait. Comme la déterioration du grès je fais rapporte ~~excentré de l'ouverture la partie délitée~~, les fissures ne sont pas très accentuées il est préférable d'attendre pour voir si elle se continuent et menacent la solidité de l'ensemble. En revanche sous le porche extérieur dont le linteau entre les 2 piliers se détache par lamelle et des fragments risquent de tomber je fais bûches la surface ainsi délitée pour y mettre un enduit de ciment.

Le porche sud, dont le haut est déjà centré par un fer plat, se délite également et nécessite un nouveau centrage en fer plat à la base avec remplissage de la fente en ciment.

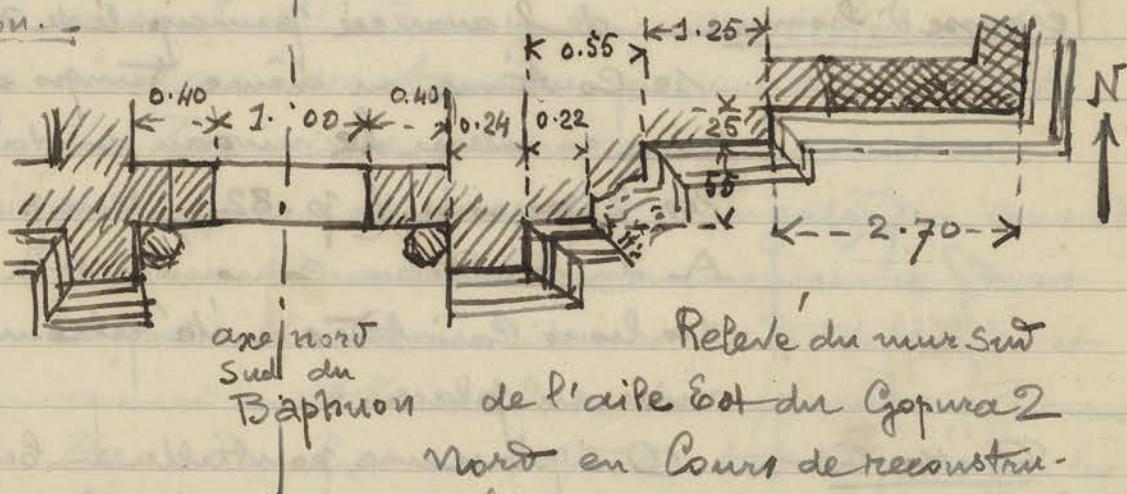Baphuon -

Relevé du mur Sud

Sud du Baphuon de l'aile Est du Gopura 2

Nord en cours de reconstruction (pour la partie en grueille)

On recherche les pierres moulurées de base dont beaucoup tombées au pied du monument

BdX

lors de l'écroulement ont été évacués plus loin et par suite mélangés aux autres.

Jeudi 18 novembre

Oriksor Vat
Galerie Sud (E)

On vient de poser 20 dalles moulées formant caissons sur 5 nouvelles travées du plafond ~~qui~~ dont les poutrelles viennent d'être démontées après le stage suffisant pour que le béton de l'armature ait fait prise.

(A) S (E)

La remise en place des blocs supérieurs de la corniche, formant à la fois départ de la Voûte, se continue au dessus des grands piliers de la galerie. (bas de la p. 86) Ces blocs retrouvés dans les décombres rejettés au dehors sont tous d'être intacts et d'avoir leurs joints à parements lisses ; des morceaux ont été cassés ce qui rend parfois difficile de repérer l'endroit exact où ils provenaient, par suite il y a des fois confusions sur des blocs qui viennent d'être remplacés sur la corniche et il faut les déplacer de nouveau, pour les remplacer par la pierre exact : *the right stone in the right place*.

Ce qui retarde le travail.

Bapnuon - On a retrouvé quelques assises moulurées de base qui ont été remises en place sur les fondations des murs Sud et Nord de l'aile Est du gopura 2 Nord (p. 84 en haut et 81 en bas) Du côté Sud on a commencé la reconstitution du Curieux bas-relief dont j'ai retrouvé une très bonne photo (que Glazeborn a dû oublier d'emporter) n° 4797 H.R. Cette photo prouve qu'avant l'écroulement, une partie du bas-relief (registre supérieur) était déjà très fortement détruite.

Le caporal de cette équipe fait des recherches à la base de cette partie du temple angle nord-Est pour voir si parmi les nombreux blocs on peut retrouver

91


Bap

Les assises moulurées de base qui manquent. Il eut été très préférable après l'écroulement de ne pas toucher aux blocs tombés et de les laisser sur place au lieu de les évacuer et ranger au loin. Outre que cet amoncellement de blocs calait et retenait les terres, on eut plus de facilité pour reconnaître d'où provenaient ces blocs dont beaucoup avaient du rester dans le voisinage de leur point de chute.

Vendredi 19 Novembre.

Boathier

On a terminé de déposer complètement, assises par assises l'édicule d'angle Sud Est du 5^{me} gradin. Arrivé au niveau du dallage de ce gradin l'emplacement de la base de l'édicule est très nettement indiqué par un dallage Carré au Centre duquel est un trou Carré de 0,23^{em} de côté dont l'aspect d'ensemble est donné dans le Croquis Schema Ci-contre. Les cotés sont approchés, à cause des fissures qui écartent certains joints et d'ailleurs la précision dans les dimensions est incomplète des Klinner.

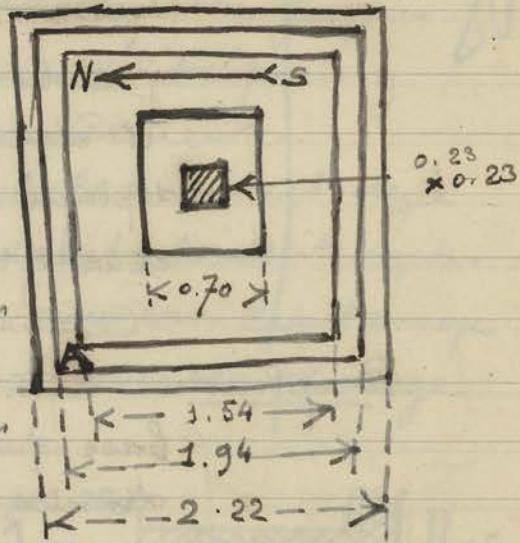

BPK


En déplaçant les assises au ras du sol niveau dallage au couli à troué en

A (angle Nord Ouest)

Voir guide Glaize Pl. I p. 42 une mince et mi-muscle feuille d'or du type déjà trouvé lors des déplacements de pierre sur ce 5^{me} gradin. Cette fois au lieu de se présenter sous une forme Carré (Voir XIX - p 184 et 189) la feuille d'or a un contour irrégulier

Coupé dans l'Axe

et architecture Comparée Pl. XXX et XXX



Batt

CA 682
DB

Tourisme

95

et semble détachée d'un morceau plus grand. En tout cas à l'endroit où elle fut trouvée je n'ai constaté aucune cavité où elle aurait pu se loger. Ce minuscule fragment dor est réuni avec ceux déjà trouvés sur ce gradin du Battambang sous le n° 682.

(T)


On Battambang n'étant aperçu, en accompagnant sur les éléphants les visiteurs recommandés par M. Barbeau (p. 90) que les tournants très brusques du sentier étaient parfois assez tristes et que les éléphants hésitaient et tâtonnaient le terrain à ces endroits je fais aplatis, élargir ce sentier et remblayer les endroits difficiles.

Samedi 20 novembre.

Autor Vat - On place le Coffrage des 2 dernières poutrelles Galerie Sud (E) du plafond dans la partie Ouest de la galerie correspondant à l'entrée où cette dernière ne s'est pas écroulée, seul endroit actuellement où les 2 murs soient complets, puisqu'on continue la reprise des arcades de Corniche Côté Sud (p. 93). La dernière poutrelle à couler est la 27^{me} en place (à parts de l'Ouest) ce qui correspond à 26 travées de 4 caissons chacun déjà en place.

(T)
A. S (E)
Galerie Sud

L'écartement entre les 2 moulures de la corniche à l'endroit de cette 27^{me} poutrelle est de 2^m 26 alors que déjà au droit du 4^{me} pilier il était de 2^m 22 (p. 85 en haut) et au début il était de 2. 18. Cela tient à ce que les 2 parements à l'extrémité Ouest étaient bien verticaux et qu'à mesure qu'on se rapproche de l'endroit qui s'est écroulé les piliers (côté Sud) et le mur des bas reliefs (côté Nord) se sont inclinés vers l'extérieur.



Porte de la Victoire — On a remonté les fragments de têtes d'éléphant qui furent retrouvés dans les décombres rejetés dans les fossés. Ces fragments appartenant à la tête centrale et à la tête nord ont été réunis avec clous, fer et ciment sur les morceaux de trompes déjà remis en place. Ces trompes sont quasi complètes mais les morceaux ont dû être retenus entre eux par des goulots intérieurs et par ensembles reliés au moyen de clous en fer.



On magazine avec des blocs de latérite toute la partie du corps et des têtes qui fait défaut jusqu'au niveau supérieur où l'on pourra remettre en place les peintures sculptées retrouvées de l'Indra entre ses deux acolytes. (Voir XIX p. 119 et 120)

Lundi 22 novembre

Oinkor Vat — Oyant remarqué que des constructions de paillottes (pour débit de boisson aux soldats probablement) s'amorçaient en bordure Ouest de la route vers Oinkor Thom —
Oinkor Thom — en bordure Ouest de la route vers Oinkor Thom —
 (en rouge ci-contre) —
 j'ai demandé l'arrêtement de ces paillottes, car si on laisse faire c'est une rue de village qui peu à peu va s'installer à cet endroit — chose absolument interdite et en contradiction formelle avec les prescriptions et arrêtés en vigueur
 (Arrêté du 28 mai 1930 et Carte du Parc d'Oinkor BEFEO - 1930 - n° 1.2 - p. 215)

Couture
paillottes
D'autre
partie
de la

on il est justement question des paillottes à l'Ouest de la route « défigurant faîcheusement l'accès du temple. » - Voir Carte p. 243)

Ambrovat le travail d'enlèvement des herbes et du

Douves Ouest Luc. binh dans la partie au Sud de la Chaussée

(T)

d'accès à Ambrovat étant terminé et la nappe d'eau visible dans une zone comprenant toute la largeur de la ~~g~~ ~~route~~ jusqu'à la ligne CD à 103^m _{deux cent trois} du bord Sud de la Chaussée - Voir Croquis J. de F. XIX p. 134 où délimite une nouvelle zone au Nord de la Chaussée. - Un barrage sera construit comme il a été fait à la ligne CD ci-dessus afin d'empêcher que des Sauts de Vent ne viennent subitement repousser les herbes des parties non dégarnies et rendre le travail fait à recommencé.

Construction d'un garage

(T)

— L'entrepreneur adjudicataire Huy Quan (p. 81) commence l'approvisionnement des matériaux sur place.

La Berline Citroën CVII a pris dans l'unique garage actuel la place de la Camionnette Ford.

Dépot des Poteries. - Le dépôt des poteries du Boxyon qui était installé à l'étage de la maison construite par Commarque et dite "Garde-manger", ne fermant plus, le bois des portes étant pourri et les serrures disparues, je décide avec Suon de faire transporter par voyages successifs les sus-dites poteries au Dépot de la Conservation ancienne dite Pteah Thma. - On a commencé le démenagement en empilant avec des caisses la Camionnette : dans ces poteries il en est de fort intéressantes et curieuses, et je crois, que lorsque j'en ferai le tri pour les placer, soit sur des étagères, soit pour les petits

Poteries

98

Poterie

debris dans des caisses il y aura assez peu de déchets. L'inconvénient c'est que les n° sur papier des dites poteries ont presque tous disparus ou sont devenus illisibles; de plus le registre catalogue semble tout à fait incomplet.

Mardi 23 novembre

Enlèvement de 2 - Au Cours du Grand Circuit, organisé ce matin
Coulis par les militaires en l'honneur d'un Général de passage (je n'ai

pas été présent pour l'accompagner) deux
Coulis affectés à l'entretien du Temple de Ta
Prohm ont été enlevés par le Convoy militaire
et ramenés à Siemreap. J'ignore pourquoi
n'ayant pu obtenir aucun renseignement à ce
sujet des autorités militaires.

Je sais que les militaires sont mécontents
des gardiens à l'intérieur des temples qui les gênent, les épient et les surveillent. Pour plus ample information voir J. de F. XIX - p. 136-137

Battambang

On commence à l'angle Sud Est du 5^{me} gradin à démonter une partie des parements Sud et Est du mur de soutènement qui sont à la fois affaissés et inclinés vers l'extérieur
En rouge ci-dessous —————— 4.40 —————— 2.70 ——————
les parties à re-
construire sur toute la hauteur



du muret qui est constituée A de 6 assises (h² totale = 1.80)

Quelques blocs des assises N S

Supérieures devront niveau du dallage également être déposés,
comme ayant pris un

Surplomb au-dessus des Coupe AB
parties basses (en bleu ci-dessus)

La Coupe Nord-Sud AB sur l'emplacement

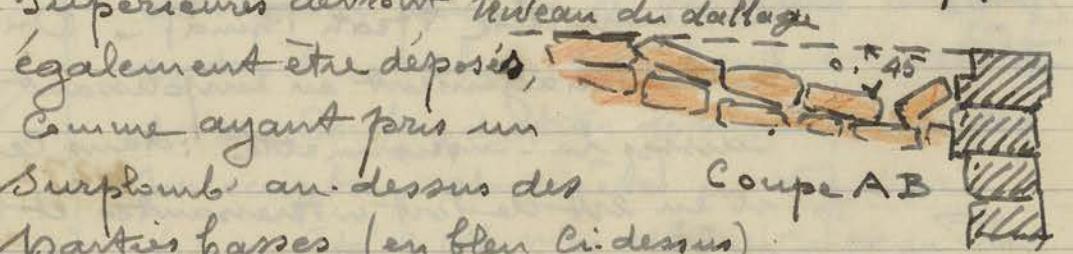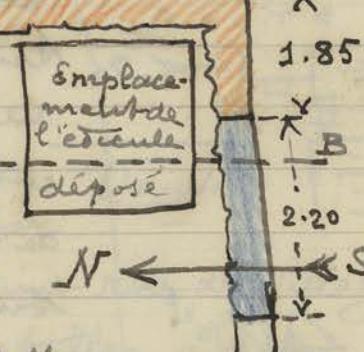


Bat K del'édicule d'angle Sud Est montre l'affaissement qui s'est produit dans le carrelage à cet endroit et dont la cote atteint jusqu'à 0.45 de profondeur.

Antor Wat La remise en place des deux assises supérieures de la Voûte

laisse un espace entre elles de 0.14 à l'emplacement du Quatorzième pilier de

la Galerie (en venant de l'Ouest) - voir explication p. 77 en bas. Cet intervalle qui va s'accentuer à mesure que l'on s'avance vers l'Est est comblé avec un béton de ciment pour rendre la maçonnerie homogène. Un fer rond de 12 formant crampon augmente encore cette liaison.



A V
gal SO

Mercredi 24 novembre.

Enlèvement du sujet de l'élevation des 2 gardiens de Tat Phnum, de 2 coulis d'après le lieutenant Guibert, cet enlèvement serait motivé par le but d'interroger les susdits gardiens à Siemreap. Ils ont parait-il été relâchés après interrogatoire.

Garage - On a commencé ce matin à faire les 6 fouilles sous les futurs piliers en maçonnerie du garage.

Sculptures - Le Gouvernement de Siemreap fait ramener mises en dépôt à la Sala Keth chez lui 2 statues qu'il a demandé d'exposer, bien en evidence, sur des socles : le futur musée de l'Ecole étant abîmablement occupé soit par des chevaux soit par des familles de militaires cambodgiens, il n'y a guère vraisemblance que l'E.F.E.O puisse s'y installer dans un délai proche.

Les deux statues ainsi retirées du dépôt d'Antor Thom sont : n° ~~4271~~ ²⁷¹ un brahma debout à 4 faces avec motif as 3 points provenant de Battambang et la belle Tara que de la région d'Antor Thom

cheit
de
Sculpture

CA 4271

100

CA 2830 Trouvé' avait ramené de Prab Ko (n° 2830)

Prab Pithu - Emmené' quelques visiteurs recommandés par l'Ingénieur m^e Brunet dans ma tournée des Chantiers - (Ils étaient 2 et la Berline Citroën eut été insuffisante, c'est la Camionnette Ford qui fut utilisée) Je les ai fait circuler sur la nouvelle piste contournant le groupe du Prab Pithu et j'ai pu constater une fois de plus l'attrait exercé par ce coin de paysage sur les touristes.

Jeudi 25 novembre .

Anton Valt Bassin au Sud de la Chaussée intérieure Je fais enlever le luc. brûlé qui s'est amassé dans le bassin au Sud de la Chaussée intérieure. Il est curieux de noter que le bassin symétrique au Nord et tout proche de la baignerie ne présente aucune trace d'herbes ou luc. brûlé à la surface des eaux. Cela tient d'ailleurs à ce que les baigneurs se baignent continuellement dans ce bassin Nord alors que personne ne se baigne jamais dans le bassin Sud.

Le Sarah Spring qui n'est pas non plus envahie par les herbes, le doit à ce que les animaux du village voisin viennent s'y baigner.

Galerie Sud (E)

L'endroit où s'est interrompue la mise en place des poutrelles et caissons du plafond de l'extrémité Ouest de la galerie correspondant à la 27^{me} poutrelle, et à 26 travées de distance dans la galerie à la ligne A B ci- dessous.

Contre entre le


5^{me} et 6^{me} pilier

en venant

de l'Ouest soit à

environ 13.50 du départ Ouest de la galerie - plafonnée

à la hauteur de



en rouge partie

Bakhru Au Bakhru après dépose des 6 assises du parement de soutènement de l'angle Sud Est (en rouge sur le croquis p. 98) On constate que le sous sol à cet endroit est uniquement composé de terre avec de menus débris pierreux (A ci-contre) ce qui explique l'affaissement du dallage à cet endroit.

Le Croquis de Coupe ci-contre relevé sur place montre les différents plans des lits des assises avec un double ressaut qui peut être résumé dans le détail ci-dessous:



Ces revêtements J. de F. XIX p. 89 et Lagisquet une coupe complète (J. de F XX p. 40)

Vendredi 26 novembre.

Antor Vat. — Ayant arrêté après enlèvement complet du Donjon Ouest le Bambou et des herbes

(T)


dans la partie au Sud

de la chaussée d'accès


au temple sur une longueur de

203° (ce qui fait que le barrage pour maintenir la partie en rouge non déherbée se trouve juste dans l'axe de l'entrée principale du Bungalow des ruines) on établit un nouveau barrage au nord de la chaussée à 203° des bord Nord de la Chaussée P.A. Vat.

On va commencer: enlèvement des herbes et luc. bish dans cette partie ainsi délimitée

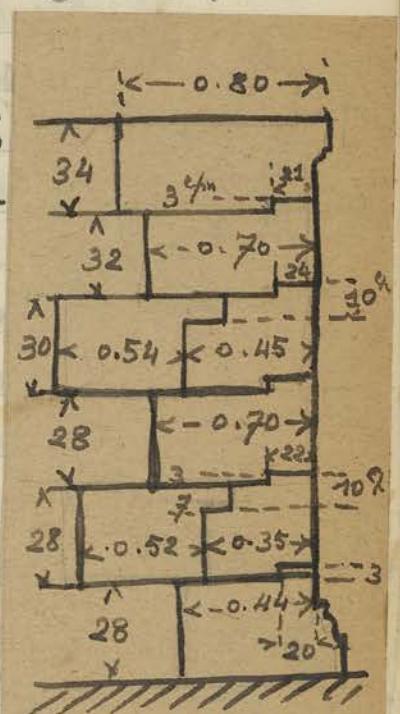

Coupe sur le mur de soutènement du 5^{me} gradin jones de l'angle Sud Est





Pris sur

Un entrepreneur ~~étant~~ venu me demander l'autorisation de prélever pour les enlever les herbes rejetées sur le bord de la douve du Côté Sud et qui devront être évacuées pour rendre propre les abords de la douve, je lui accorde cette autorisation avec le plus grand plaisir.

Baphuon Le remontage du mur Sud (celui des bas-reliefs) de l'aile Est du Gopura 2 Nord est terminé, sauf quelques blocs moulurés de basalte qui n'ayant pu être retrouvés ont été remplacés par des blocs de latérite retaillés en épaulement, comme c'est l'usage en pareil cas.

Mais pour le mur Nord de la même aile Est (celui de la fenêtre), on ne retrouve que très peu de blocs à remettre en place. On a pu récupérer un montant de la fenêtre mais tout le reste de ce mur n'a pu être retrouvé. La fenêtre, d'après une ancienne photo prise avant l'écroulement, devant avoir son Cadre en très potier était, puisqu'on avait mis un potelet en béton armé pour supporter la Voute à cet endroit, mais ce que je regrette c'est de n'avoir pu retrouver le motif d'angle qui terminait la façade à l'Est décoré de cette succession en hautain de Carrés enfermant de petits animaux et bien typique de ce style du Baphuon.

Je fais reprendre, interrompu à cause des pluies le dégagement de ce qui peut rester *in situ* à la base du sousassènement du 2^e étage (*id Est* du pignon Nord) et qui était recouvert par la masse de table qui avait glissé des parties hautes écroulées.

Samedi 27 novembre

Garage

On commence à couler le béton de fondation sous les 6 piliers prévus de $0.50 \times 0.50 \times 0.50$ beton.

Aïkakor Vat On a rebouché au Ciment avec la bâche intérieure.

Porche Ouest riuse le fronton au dessus du 3^e étage.

porche Ouest du 3^e étage à

un endroit où manquait une pierre et l'on a mis 2 fers

plats pour ceinturer les 2 piliers sous le dit fronton (en rouge ci-dessus) dont la fente verticale s'était élargie et une partie du Ciment qu'on y avait placé autrefois était tombée.

Palais Royal

Terrasse d'honneur.

On continue la réfection du dallage entre les 2 piliers centraux mais

les pierres en grès du dallage de la partie A ci-contre n'ayant pu être retrouvées il faudra à

Cet endroit refaire un dallage en pierre. Je dois ajouter pour expliquer ce déficit de pierres de grès que dans ces dalles enlevées de ce dallage un certain nombre provenait des murs de parement, ou des socles montureux B sous les dés de support de nagas.

P.R.





Ces pierres de socles, comme en témoignent les photos prises avant le début des travaux,

existaient sous la balustrade

Côté Nord (en hachures A ci-dessus) mais du côté Sud (en rouge) les

dés reposaient directement sur le cintre supérieur G du parement décoré. On va

pourvoir remettre tout en place de ces socles.



10h

moulures retrouvés dans les pierres de dallage.

Dimanche 28 novembre.

On me demande un peu à l'improviste une causerie pour meubler la séance de guinguaise du Cercle Culturel de Siemreap.

Je lis des proverbes cambodgiens parus dans le BEFEO Tome XV - n° 3 - recueillis par Paumier. J'en profite pour demander aux Cambodgiens présents s'il existe, comme en Annamite, un argot cambodgien. Réponses évasives ! Le dernier proverbe sur lequel je clos ma causerie fait l'objet d'un commentaire où je rappelle (en fais savoir au Cambodgien) qu'ils ont en un passé brillant qui ils ne devraient pas oublier par susceptibilité pour adopter tout ce qui est nouveau et venir d'un autre peuple.

Pour mémoire c'est la 3^e Causerie que je fais à ce cercle - puisqu'il n'y boit pas et on n'y joue pas ! - la 1^e sur Bantay Srei et la 2^e sur le Siemreap que j'ai faite en 1916.

Lundi 29 novembre.

Olivier Thom. Je poursuis une reconnaissance jusqu'à ces 486 et 487 deux temples dont la piste d'accès tient à la porte Ouest du Bayon et l'autre entre les 2 routes allant à la Porte de la Victoire d'une part à la Porte des morts de l'autre. Ces 2 pistes pourront être rendues automobilables nécessiteront de combler certains creux et d'aplanir certains inégalités. Il y aurait peut-être lieu de remettre en place, si la magouinerie encore en place s'y prête, certains bas-reliefs ou motifs de sculptures rangés autour du temple 487 dit Mangalartha.

Garage - On confectionne les piliers en briques de 34

X 34, l'aire en béton formant dallage et des charpentes exécutant les 3 fermes prévues.

Mardi 30 novembre.

Vandalisme Les militaires ayant reitéré les coupes d'arbres dans Dirktor Ghar, initialement près de la porte de la Victoire et cette fois-ci très près de la terrasse précédant l'Opéra.
Précisément j'adresse au Conseil régional une lettre de protestation assez vive (n° 387).

Dirktor Vat On installe la grue pour procéder à l'électrisation des hébres et lucarnes dans la nouvelle


(T)

zone qui va être délimitée au Nord de la Chausseé axiale extérieure (p. 101 en bas)

Dirktor Vat - après nouvel examen je reviens sur ma première décision de ne pas soutenir la traverse ouest du 3^e étage (ou linteau Vrai) derrière de la porte d'entrée (p. 92 en haut) je fais donc placer une poutrelle en béton armé de 10x15 A ci-contre mais le plus près possible du bord du Chambranle pour laisser visible la plus grande partie de surface découverte.

Un autre pierre, architrave entre 2 piliers dans l'angle Sud Ouest, à la base même de la tour centrale, profondément recrue au centre par suite de l'éclatement des lamelles de grès au B ci-contre nécessitera une poutrelle en béton avec renforts au dessus pour maintenir la superstructure.

Enfin je fais également renforcer avec du ciment la base des 2 piliers extérieurs du porche Ouest dont une face était très fortement recrue et rongée par les intempéries.



Galerie Sud (E)

On continue le rebouchage des cavités produites par les cassures des pierres dans les entablements des murs Nord et Sud qui viennent d'être remontés en place.


F S
gal

On continue également à remplacer les débris, parfois très petits, des bas relief mais l'absence de beaucoup de morceaux laissent encore des vides dans la mosaïquerie et l'inégalité des morceaux en place donnent un aspect d'opus incertum à ce mur.

Mercredi 1 Décembre.

Baphom

- Je fais dégager les éboulis qui obstruent la base du soubassement du dernier étage accouplé à l'Est du pignon central Nord et devant le mur Sud de l'angle Est du gopura 2 Nord (dont un relief figure au bas de la page 92) - en A ci-dessous pour voir ce qui peut rester encore en place à cet endroit et remettre quelques blocs du parement d'échiffre qui pourront être retrouvés. Le dégagement de cet emplacement a un double but : ôter le caractère un peu chastaigne et déplaisant de cet endroit et en permettre l'accès facile aux visiteurs qui voudront voir le bas relief qui vient d'être ~~reconstitué~~.

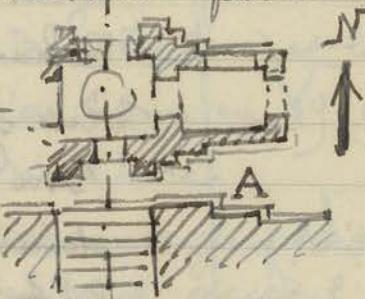

Porte de la Victoire - Dans l'angle Sud-Est on est arrivé au niveau de la mosaïquerie (reconstituée avec des blocs de latérite retaillés) correspondant au groupe de l'Indra entre ses deux acolytes. On place les bustes de ces

BT

deux derniers au niveau de ceux de l'angle Nord-Est symétrique.

P V Deux fragments de bas-reliefs provenant du fronton de la façade Ouest - dont la partie haute semble peut-être reconstituée - furent retrouvés dans les déblais retirés des douves : il faudra supprimer le bûcheau en béton armé qui soutient le haut du fronton pour les replacer.


Jeudi 2 Décembre.

Battambang. - On remblie et égalise l'entroit du 2^e gradin

(T)

où les éléphants ont coutume de déposer les visiteurs (qui ont la chance inespérée d'obtenir les éléphants pour monter au Battambang) en A ci-contre


du 2^e gradin, ce qui évite de gravir les 2 premiers perrons de la pyramide qui sont les plus incommodes.

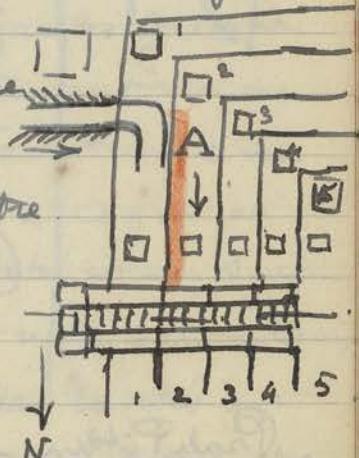

En rouge la partie refaite où le sol de la colline était arraché et présentait des inégalités

Sommet - à l'angle Sud-Est du 5^e gradin la reconstruction de l'édicule dont les assises furent déposées commence par le relevèvement du niveau du dallage sous les pierres de libage. Le niveau de ce dallage est donné par l'échancrure A ci-contre dans

l'assise supérieure du mur de soutènement qui vient d'être refait redressé et remonté légèrement. (cf. p. 98 en bas)




Palais Royal - On a remplacé les socles moulurés Terrasse d'honneur retrouvés dans les déblais après enlevement du dallage entre les 2 perrons axiaux sur le bord supérieur du mur de soutènement Nord (p. 103) ce qui permettra de

P R

remettre la balustrade de naga de ce côté à la même hauteur que celle déjà remise en place du côté Nord.

Vendredi 3 décembre

Baphuon

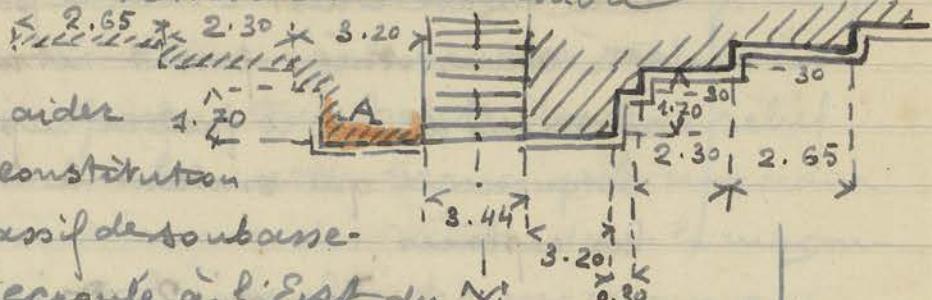

Pour aider la reconstitution du massif des soubassements écaillés à l'Est du X

Bap

perron Central Nord du 3^e étage N.
Je fais le relevé Côte de la partie symétrique à l'Ouest (en hachures ci-dessus); quelques blocs encore en place mais déplacés par la chute des parties hautes en A ci-dessous (en rouge) ont pu être redressés après effacement des terres et blocs écaillés qui obstruaient toute cette partie

Prah Pithu - après avoir dégagé les curvaces de tous les petits temples pour les rendre bien visibles de la nouvelle plate forme que des coulis achèvent de remblayer et rende automobilable d'autres coulis amassent des blocs de latérite entre les temples V et X près du passage traversant la douve au Sud des évents T et U après de confectionner à cet endroit (en rouge sur le plan J.-de-F. XIX p 182) une chaussée surélevée sous laquelle il faudra placer des douves pour faire communiquer les parties de la douve traversée.

Samedi 4 décembre

Baphuon

On prépare la chape en béton avant de venir remplacer les dalles du ligage formant infrastructure sous la base de l'étaule de l'angle Sud-Est du 5^e gradin pour racheter

Bap

Bok le niveau du sous-sol qui s'est affaissé à cet endroit (voir bas de la p. 107) Le Caporal a pu retrouver dans les débris et blocs rejetés ou tombés à la base de la pyramide un certain nombre des pierres qui manquaient à l'angle Sud ouest du dit édifice.

Base du Parthenon Des Coulis (tourismes) rangent et alignent les blocs divers répartis et disséminés au hasard à la base Est de la pyramide pour enlever l'aspect "Chantier en Cours" qui domine tous ces blocs dispersés. J'ai été frappé à Athènes, devant le Parthénon, de ce que ce travail n'ait pas été fait par les Grecs et que les abords de ce beau temple laissent voir un tel désordre. Sans ce rapport aucun temple ne peut rivaliser avec le Taj Mahal à Agra où règne une ordonnance, une netteté et un souci de mise en valeur que je n'ai vu nulle part ailleurs.

Oikos Val On continue le rebouchage des cavités qui existent dans les pierres remises en place des deux entablements nord et sud, dont beaucoup sont incomplètes ou fragmentées. Notamment du côté Sud 2 blocs au dessus de la corniche laissent entre eux un tel espace qu'il faudra placer 2 fers ronds de 12 dans l'intervalle avant de couler le béton.

Dimanche 5 Décembre

Page des Coulis

Vandalisme À la demande du Capitaine Dubois adjoint *Constat.* au Commandant Corbette je vais avec lui à Clinton Town constater les dégâts commis, abattages d'arbres près des routes et des monuments.

(p. 105 en haut) et à Ta Prohm constater ou plutôt faire constater les entrées où des têtes de figurines furent brisées (J. de F XIX. p. 136-137)

Vandalisme

En effet à la suite de mon Rapport de Septembre dernier le Directoiret avait déposé une plainte pour le banditisme des militaires que j'avais signalé à Ta Prohm auprès du Général B. Saigon Commandant les troupes d'Indochine. Ce dernier avait demandé explications et rapport au Commandant des Sectors de Siemreap.

D'où la visite ci-dessus mentionnée avec le Capitaine Dubois chargé d'établir le Rapport.

Représenant le détail de mon J. det. j'avais, pour m'aider à repérer les cassures et mutilations, fait la liste que je reprends ci-dessous:

D'Est à l'Ouest. —

motifs brûlés:

Salle des Danses (V de l'I.K.) → 6 têtes d'apsaras
Angle Sud-Ouest, linteau.

Base du pilastre Nord de la porte extérieure ~~Ouest~~ de la salle V ci-dessus → 1 tête de figurine
Sur un fronton cassé gisant sur le sol au nord du porche central

Est de l'enceinte 3 → 1 tête de figurine
Sur la façade Sud du pavillon précédant la tour S₁ entre les enceintes 2 et 3 est → 2 têtes de tevara

Cour intérieure de la 1^e enceinte au Sud Est sur un fronton dont le Bouddha fut transformé en linga → 5 têtes d'orants (Passage H de l'I.K.) → 1 tête d'apsara

Cour entre les enceintes 2 et 3 Ouest face Sud du pavillon

Central M de l'I.K. base de pilastre → 1 tête d'apsara

Base d'un fronton gisant sur le sol dans l'allée entre enceintes 3 et 4 Ouest (l'allée des fromages) → 3 têtes d'orants

Total 19 têtes

Par erreur au Capitaine Dubois je n'ai fait constater que 18

Vandal.

Par erreurs sur mon Rapport je totalise un nombre ⁷¹¹ de 17 cassures au lieu de 15. La constatation sur place montre en ces divers endroits les cassures encore fraîches et la liste ci-dessus fut laissée par moi au Capitaine Dubois pour établir son Rapport (Voir p. 118) ^{on bas}

Lundi 6 Décembre

Palais Royal — La partie centrale de la terrasse d'hon-


Terrasse d'honneur, neuf étant à peu

pres terminée, l'ens A

et B redressé sur leurs

socks à leur ancien emplace-

ment et balustrades de

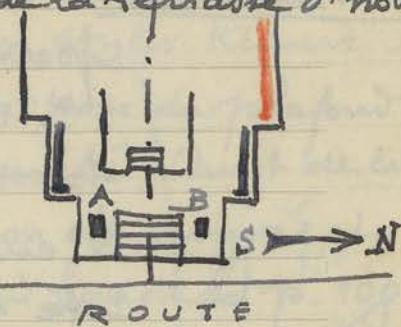

naga également remises sur leurs dés et ces derniers surélevés sur un socle (nouveau pour la partie Sud) en mour ci-dessus je remarque que l'about Est du naga nord du decrochement suivant (en rouge ci-dessus) qui n'a pas été déplacé repose d'une façon incongrue sur un socle fait de blocs divers en reemploi de tailles inégales et dont le croquis

Ci-contre (Beaucoup trop régulier)

peut donner une idée


Certains blocs sont

en porte à faux et

d'autres ne sont

pas jointifs.

Milieu
du dallage

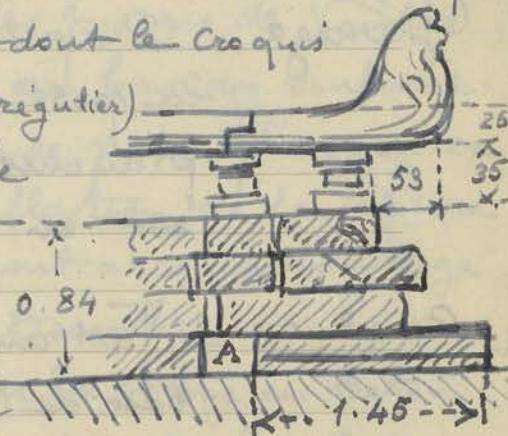

Je fais reproduire toute cette partie pour donner un aspect plus logique et en même temps plus de solidité à cet about de balustrade. On supprimera l'intervalle vide A ci-contre en repoussant la pierre à droite de 1.45 qui déborde beaucoup trop.


Comme cette partie centrale de la terrasse d'honneur, faite de reprises et rafistolages

112

RR
V

Tres grossiers est difficile à rétablir d'une façon très satisfaisante. Et deviner l'état exact ancien est un problème vraiment très difficile à résoudre.

Antor Vat Le naga de la plateforme de l'extrémité Ouest de la chaussée (Ouest) Chaussée au Nord du perron médian (en rouge Ci-contre) repose sur une

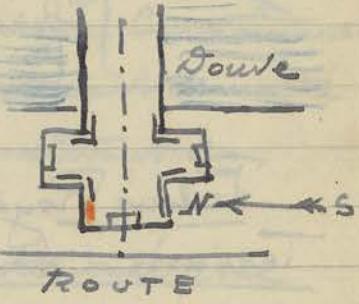

pièce de socle qui s'est enfoncée et menace d'entraîner tout le reste. D'un autre côté le corps s'est déplacé et ne repose plus qu'à peine sur le dé de support (ci-contre). Je fais reprendre, en soulevant un palan le Corps du naga pendant cette opération, toute la partie basse y compris l'infrastructure à la fois inclinée et surbaissée.



Garage - On achève la construction du garage par la pose de la toiture et des cloisons en planches. La confection de la porte en bois est en cours.

Mardi 7 Décembre.

Baphuon - Fait rentrer au dépôt d'Antor Thom une base de Colonne qui gisait près du Gopura 3 Est. Cette base me paraît intéressante à cause du dé rectangulaire orné, sur une face de l'asète bibel sous arcature et sur l'autre d'un orant assis vu de profil pour le corps et de $\frac{3}{4}$ pour la tête, pose peu fréquente



K- 0.15

CA 4600

Bat

Dimensions de cette base de

Colonnette inscrite sous le n° 4600:

La Comtesse de Coral et Stern

n'ayant pas pu s'occuper du détail de base dans leur étude pourtant très détaillé et très minutieuse des Colonnettes, il y a toutefois une étude à faire de la forme du décor de ce dé de base dans les divers styles Khmers.

Chinkor Vat. On décide d'arrêter la pose du plafond Galerie Sud (E) en Caissous dans l'extrémité Ouest de cette galerie à l'endroit où l'on est arrivé et précisé dans le schéma au bas de la p. 100.

En effet à partir de cet endroit la route n'existant plus il faudra la remonter. Dans ce travail les Coulis risqueraient, si portefilles et Caissous étaient déjà en place, de faire tomber des éclats de pierre, des outils, des ferrures qui pourraient briser ou endommager le plafond.


On recherche donc les pierres de routes dans les déblais rangés au bas du soubassement Sud de la Galerie pour les remonter et on prépare la installation de la chèvre et du palan qui serviront à ce remontage.

Mercredi 8 Décembre. -

Bat Khan

On a terminé de couler la chape en béton sur l'emplacement de l'édicule Sud-Est du 5^e grain pour racheter l'affaissement du sol à cet endroit (p. 109 en haut). En attendant que le béton ait fait prise je fais recherches parmi les pierres gisant à la base Est de la pyramide les bornes parallélopédiques, entières ou cassées mêlées à ces blocs.

Il s'en retrouve six du type de Pre Rup et des



114

Batt

Bantay Srei que je suppose devoir provenir d'un alignement de bornes précédant le gopura disparu de l'enceinte Est. Des trous se retrouvent sur le rocher aplani en dallage qui devaient correspondre à l'emplacement de ces piliers-bornes! Quelques-uns de ~~les~~ ~~ces~~ trous sont occupés actuellement par des lingas ce qui est une hérésie; le linga, emblème royal à cette époque, placé en borne pour jalouner l'avancée extérieure est sacrilège.

Jamais à ma connaissance un linga n'a été présenté sans piedestal et dalle Somasutra.

Je vais donc les faire retirer et remplacer par les bornes retrouvées.

Jeudi 9 Décembre

Visite

J. Sode

Reception intime chez le Conseiller Régional en l'honneur du passage à Siem reap de M^e Loubet Commissaire de la République au Cambodge.

Diotor Vat
Galerie Sud (E)

En déplaçant les blocs qui restent encore accumulés à la base du soubassement Sud de cette galerie pour extraire les assises de Voûte que l'on va remonter incessamment (p. 113) on retrouve en assez grand nombre des débris cassés et moulurés provenant des entablements des 2 murs reconstitués mais avec de multiples trous, cariés dus aux parties manquantes. J'avais commencé à faire reboucher au béton, avec renfort de fer, parfois quand le hiatus entre 2 pierres était trop grand, toutes ces cavités pour renforcer la solidité du mur. (p. 109).

Diotor Vat (E)
Galerie Sud

Dans les débris moulurés retrouvés certains, en assez grand nombre, peuvent reprendre leur place et compléter ainsi le décor mouluré.

Malheureusement le travail en cours du rebouchage au béton des cavités a l'inconvénient d'obliger de tailler et extraire le béton qui a déjà fait place à l'endroit où le fragment vient d'être retrouvé.

Aussi y interromps immédiatement ce travail de rebouchage malencontreux, on est arrivé à peu près au milieu de la galerie, pour épurer toutes les parties de corniches qui on peut retrouver dans les décombres.

Sous m'assurant que pour ce qui est des bas reliefs morceles tous les fragments ont été retrouvés je mets les 2 cimentiers à fixer avec mortier et goujons ou chevilles ces fragments à l'endroit voulu.

Je ~~peux~~ repère et compare sur les planches du mem. Arch. Angkor Vat (Tome II - Livre III) pl. 586 à 600 les morceaux placés pour m'assurer avant de les fixer définitivement qu'il n'y a ni erreur ni confusion.

Comme pour la partie Ouest de cette Galerie Sud je vais prendre quelques photos avec l'éclairage actuel de ces bas reliefs avant de remplacer la voûte.

Certaines reproductions de l'ouvrage ci-dessus sont assez mauvaises et très confuses.

Antor Thom - Le Caporal qui travaille à la Terrasse Broussée au Sud d'honneur, réfection des 2 corps de nagas de la Terrasse d'Hon. Balustrade (p. 111) de chaque côté du nem. Personne central, me remet une tête trouvée dans la brousse sous un arbre au Sud du personnage de la terrasse d'honneur. Cette tête malheureusement très abimée, très corrodée, présente l'intérêt d'une coiffure en mitre un peu particulière.

est denticulée et comme sur le




La coiffure K-0.19-1, de décor est imbrqué détail ci-contre. Mise



Vendredi 10 Décembre

Balihai - On a commencé la dépose des blocs constituant le perron Est de la terrasse Central, pierres moulurées d'échappes et marches centrales : tous ces blocs sont dis. joints et plus ou moins affaissés -

Les blocs d'échappe en particulier avec décor sur les parements extérieurs sont déplacés et plus ou moins affaissés.

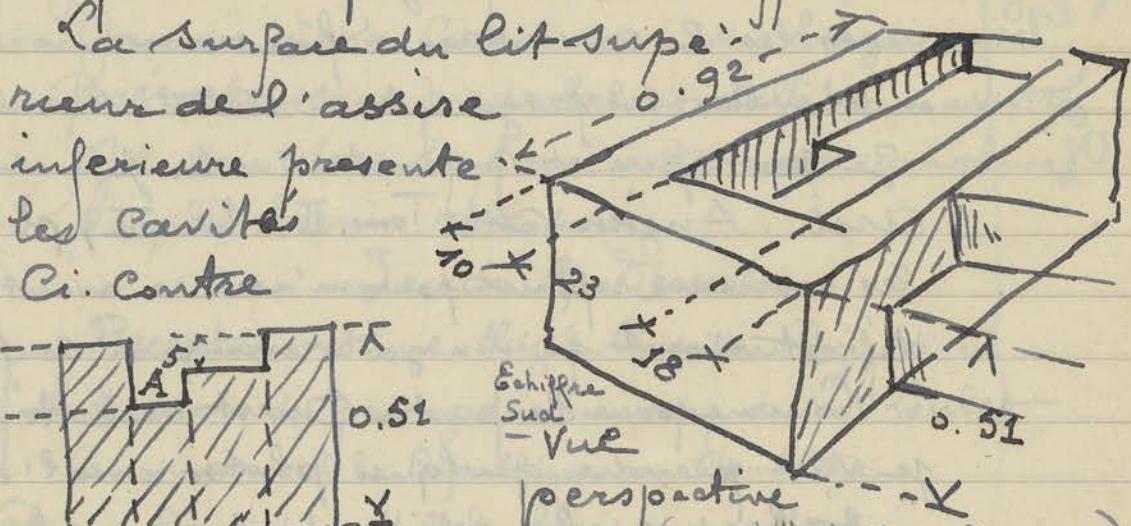

La Cavité A ci. contre ne semble pas correspondre à une protubérance de la pierre supérieure et je me demande quelle fut sa destination - L'assise d'échappe correspondante et symétrique nord montre une cavité semblable.

Ce temple présente des revêtements d'assises multiples assez curieux (p. 101)

Samedi 11 Décembre

Aukor VAT - On continue, comme chaque samedi à Cloître Cruciforme pavé et nettoyer les bas de piliers : on a commencé également ce lessivage sur les terodas sculptées sur les murs autour des cornettes intérieures et dont les plus portent

particulièrement remarquables.

Porte de la Victoire - Le buste de l'Indra Cornac et ceux de ses 2 acolytes ont été remontés, scellés à leur ancienne place sur un massif de blocs de latérite remplacant les moaconneries disparues en grès. Les coulis ayant taillé trop régulièrement par assises soignées et ravales, ce massif gefais casser le parement de façon irrégulière pour lui donner un aspect plus fruste.

La taille régulière (en rouge

cicontre) avait l'inconven-

nient de simuler pour

l'œil le front de

l'éléphant dont la


forme véritable est

donnée ici par la ligne

en pointillé.

On conserve l'écha-

fardage que l'on prolonge en hauteur pour atteindre les parties hautes de la porte afin de remonter en place les parties sculptées retrouvées dans les déblais retirés des douves.

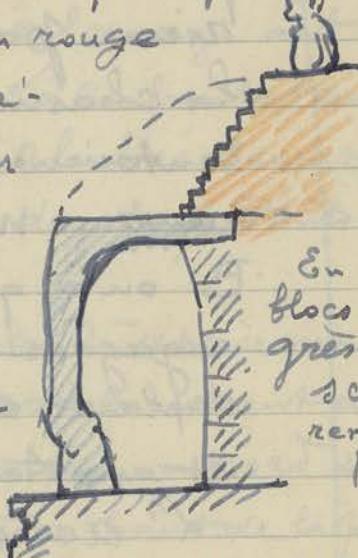

En blanc :
blocs de
grès
sculptés
remis en
place

Dimanche 12 Décembre.

Bantay Srei - À la demande du Capitaine des para-
et Grand Circuit chutistes et avant qu'ils ne quittent Siem reap
je les emmène pour la tournée du Grand Circuit
auquel, of course je fais ajouter Bantay Srei.
(Bantay Srei ne les tente pas puisqu'ils vien-
nent d'y passer 4 jours en expédition)

Ces visiteurs ont pour moi l'intérêt de pouvoir
aller de temps à autre voir des temples qu'il
est impossible d'aller voir autrement.

Prak Khan - Constaté que la pile d'angle extrême

118

Est de l'étage remonté sur le sol du temple ou plutôt de l'entrepôt à colonnes rondes entre les enceintes 2 et 3. Est a pris une certaine inclinaison qui pourrait devenir dangereuse si elle s'accrotrait.

Bantay Samre - L'accès se faisant

actuellement par la porte Nord

(en rouge ci-contre) pour faire pénétrer les visiteurs à l'inté-

rieur par l'entrée principale Est et montrer la charmante terrasse A ci-dessus je fais contourner l'angle Nord Est de l'enceinte extérieure. Mais aucun passage n'étant pris en B on a quelque difficulté à gravir le talus pour regagner l'esplanade A - Note une pierre déplacée sur le person Est de cette esplanade et une tête de lion détachée.


L'accès de ce temple en venant de la route devrait se faire à l'extrémité Est de l'avenue suspendue qui aboutit au person Est de l'esplanade.

Ce serait un embranchement à créer pour les autos.

Il serait désirable aussi de combler les dépressions et ravinements de la route à l'endroit où elle franchit la digue Est du Baray et refaire le ponton détruit par les Issaratis à proximité de la digue susdite.

Ta Prohm - Je corrige p. 110 la liste des cassures de têtes de devatas: le mur Sud du pavillon de passage S₂ entre les 2 enceintes Est 2 et 3 montre 2 têtes cassées bien nettes au lieu d'une seule mentionnée sur ma liste fournie au Capitaine Dubois (D où un total de 19 cassures au lieu des 18 mentionnées)

Mebon oriental - L'inclinaison des murs en latérite

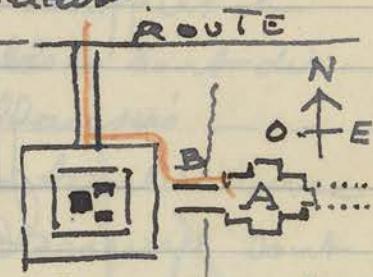

Méton Gr. Sud des batiments situés sur la 2^e terrasse devient assez inquiétante (Voir JdeF XIX - bas de la p. 150) Il y a là un travail assez important de consolidation qui s'impose mais qui il est difficile d'entreprendre actuellement.

Lundi 13 Décembre.

Antor Nat. Je commence à prendre quelques clichés Gal. Sud. (E) des bas reliefs renversés, principalement aux endroits ^{un peu coupés} (des photos des mém. Arch. T. II (loc. cit. p. 115), pour proposer d'éclairage actuel avant repos de la voûte. La confrontation de ces photos avec les anciens clichés seront une constatation douloureuse des dégâts produits par l'écroulement.

Baphros — On commence à poser la 2^e assise moulurée sur l'assise base du socle du parement du soubassement à l'Est du perron Nord du 3^e étage (A sur le croquis schéma en haut de la p. 108)

On continue à la base du soubassement du 2^e étage et à l'Est du perron nord le dégagement des parties remblayées par les éboulements et chutes de table à la suite des pluies. La base de ce soubassement étant encore partiellement en place on pourra peut-être avec les blocs retrouvés reconstruire le parement écorné. Le but à atteindre sera de limiter le plus possible de ce côté la creche brisée qui a détruit l'angle Nord Est du monument.

Mardi 14 Décembre

Antor Nat. La continuation de la remise en place des gal. Sud (O) assises de Voûtes de la galerie Sud (ouest) est arrivée au dessus du 18^{me} pilier (en venant de l'Ouest) soit à environ 43^m 00 du début de la galerie. L'intervalle entre les deux assises

K

du sommet qui était seulement de 0.^m 14 à 34 mètres du début de la galerie (p. 99 en haut) au droit du quatorzième pilier est maintenant de 0.^m 23 au droit du 18^{me} pilier.

Batkhéi - On a dégagé de toute la petite brousse qui l'obstruait la partie au sommet du plateau entre l'arrivée de l'ancien escalier (disparu) Est et la base Est de la pyramide.



Le rocher à cet endroit, à l'Est de l'ancien S > N

Gopura dont il ne reste plus que quelques piliers debout, a été retaillé à peu près horizontal pour constituer une plate-forme.



C'est là que se trouve le malen-

contreux, mais inamovible pied de Buddha, puisqu'il reçoit un culte régulier ; au nord et au Sud de l'axe E-O du temple on voit des traces de portes légèrement surélevées en terrasse,

qui recouvrent probablement des magasins ou pavillons. Le plus important et le mieux conservé de ces vestiges est une

petite surélévation de 7.00 x 3.50

du rocher naturel (en bleu) qui surmontent

3 assises de tufite plus ou

moins disloqués (en rouge)

et sur lesquelles s'élevaient,

probablement 10 piliers (en noir)


mais dont deux au Sud ont

disparu. L'accès sur la face Est

devant se faisait par un porche du vestige A.

en dérasement B - quelques dalles de grès

existent encore, in situ semble-t-il, en B

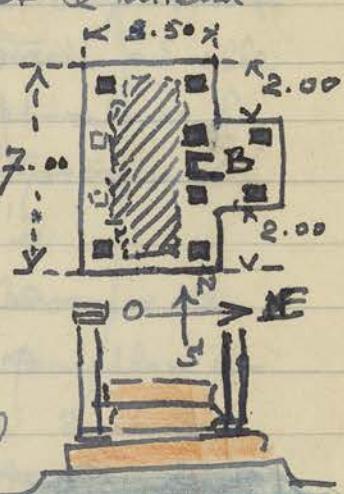

Coupe sur l'axe S-N

(voir p. 128)

A
M

127

Les bouzes Cambodgiens lors de leur essai de construction d'un Bouddha au sommet et les bouzes armées qui ont séjourné longtemps à cet endroit ont été nefastes pour le centre de la Ville de Yagodharapura, quant à sa partie supérieure.

Pour ce qui est de la base de la Colline (côte Est) les Siamesis qui y puisèrent des blocs de latérite pour construire la Citadelle de Siemreap (que j'ai connue) et par la suite le service des Travaux Publics pour construire la route ont tellement dispersé et bouleversé les Vestiges d'enceinte et de Gopura qu'il est quasi impossible d'en avoir une idée très nette.

mercredi 15 Décembre.

Passe la matinée à la Pteah Thma pour essayer un premier classement de toutes les poteries, placées pèle-mêle au hasard, et qui avaient été rapportées du dépôt d'Arikor Thom - (Chambre à couche de Commaille au dessus du magasin à ranger le matériel.)

(p. 97 en bas)

En revenant je m'arrête avec Toun visité la Conservation amiee, bâtiment tout en bois, sur la rive gauche du Sten un peu au nord de l'Eglise. Les poteaux supportant les solives du plancher sont pourris pour la plus grande partie, le plancher lui-même est dans un épitéum état - les perrous en bois d'accès à la Veranda ont presque totalement disparu; les cloisons paraissent en meilleur état mais la charpente ^{de la toiture} qu'il est difficile de voir indique des traces d'affaissements qui presagent un nombre de pièces de bois à remplacer assez considérable. En un mot tout ce bâtiment serait à repeindre, réparer ou remplacer les

Cours. Prenez

quantités de pièces de charpente inutilisables,
si cette dépense peut-être justifiée par une
utilisation prévue pour ce monument.

Ainsi livré à lui-même il tombera en ruine
très prochainement.

• Au cas où on prendrait le parti de la vendre
pour la raison ci-dessus, cette mise en vente
devrait s'opérer assez rapidement pour qu'une
grosse fortune acquéreuse il se présente sous
un aspect pas trop vermoulu et décrépi.

Il paraît c'est Tourn qui me l'a dit que du
mobilier prêté par le Bungalow des ruines, se
trouve entreposé dans les 3 pièces principales.

J'ai pris le tour et il figure sur un inventaire.

Le Lieutenant Pithaud qui revient d'expédition
au Nord du Phnom Kulen me donne les rensei-
gements suivants sur un monument ancien que
le Commandant Bardat m'avait déjà signalé
sans l'avoir visité.

Grosso modo, l'absence de toute carte
autre que celle, très inexacte de Layoungne ne
me permet pas un repérage exact, ce temple
est situé au Nord de la passe à l'Ouest des
Korpen au Nord du Village ^{Khna}
de Kunream, au nord + Samrong
du Village de Kantut ^{+ Kantut}
d'autre côté du Kulen ^{Kunream}
et à 1 kilomètre au ^{15 mil}
Sud-Ouest du ^{Bantay Srei}
Village de Samrong qui ^{qui}
se situe entre Kantut et Khna. —

Ce monument en grès avec tour centrale et 4
porches est entouré d'une enceinte en grès (c'est
très rare une enceinte en grès) d'environ Cent mètres

Vest

de côté. Les portes auraient été murées, paraît-il et on ne peut penetrer à l'intérieur.

Il y a des sculptures sur les murs.

Un école-bibliothèque existe dans un angle de l'enceinte.

Je ne vois rien dans l'ayongmire qui se rapporte à ce monument à part le prasat Ta Lei (n° 529) qui se trouve le seul vestige indiqué ~~pas~~ dans cette région (l'ayongmire lui-même n'a pas visité.)

Mais ce temple de Ta Lei a été visité par moi en Mai 1937 - ou tout au moins nous avons visité un temple qui pourrait correspondre au prasat Ta Lei mais qui est connu sous le nom de Prasat Vieng près du village de Phum Prasat au sud un peu Est du Phum Okha Riem et au Nord Ouest du Phnom Bai Dah deux collines que l'on aperçoit à l'horizon.

On mes notes de l'époque relatent 3 petits sanctuaires alignés Nord-Sud et non un seul et le mur d'enceinte est en latérite.

Jeudi 16 Décembre



Bureaux fermés : Indépendance du Cambodge proclamée.

Palais Royal les chantiers fonctionnent.

Terrasse d'honneur On reparait en A et A'

les Corps de nagas qui ont été cassés par la chute du grand Yag le 14 Septembre dernier.

Une grande quantité de blocs de parement sculptés ont été retrouvés dans les Travans de

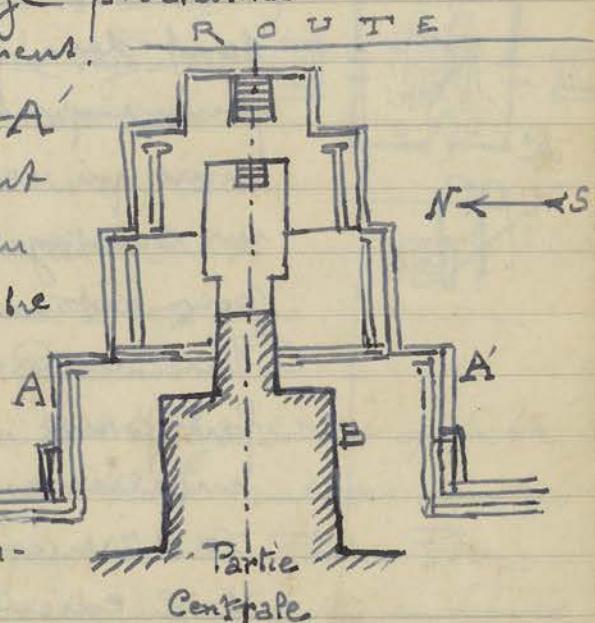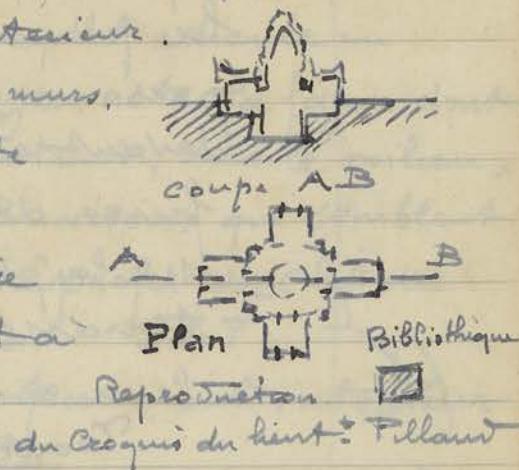

reprise qui on vient d'effectuer à cette terrasse : la plupart sont des fragments de frises de personnages accroupis tenant une masse devant eux ; il y a aussi des fragments de frises de ^{hamsas} ~~chevaux~~, je les fais ranger et aligner sur la partie supérieure centrale de cette terrasse avec le faible espoir de retrouver leur emplacement. (Voir p. 338 en haut)

R

A.

Toute cette partie de la terrasse des éléphants a dû, à diverses reprises, être remaniée car les murets de la partie centrale supérieure, intriqués en hachures sur mon Croquis de la page précédente, sont constitués par des blocs sculptés, frise de hamsas, remplacés au hasard les uns sur les autres : sauf un encadrement fairement Sud (marqué D sur mon Croquis) cette frise est partout incomplète et constituée de blocs qui ne se raccordent aucunement. (Cf. BEFEO - 1937 - 2 - p. 351)

Batikhin - Je puis placer debout une statue en 2 morceaux trouvées près du mur d'enceinte Est. Tout près de la porte de l'édicule (Bibliothèque ?) Sud.

À l'intérieur de l'édicule symétrique Nord (tous deux devant la base Est de la pyramide). Sont deux grandes statues, un homme et une femme que l'on pourra redresser également mais qui nécessitent un nettoyage et peut-être un sondage de la partie centrale de cet édicule pour retrouver un sol dallé, s'il existe.

Mat


On sommet ou commence, le béton ayant fait prise, à remplacer de niveau les dalles inférieures de l'abri sur lesquelles on pourra remonter les blocs d'assises inférieures de l'édicule Sud Est. (Bas de la p. 108)

Vendredi 17 décembre.

Batkhin - Arrivé à la 4^e assise de l'édicule en cours de reconstruction je note la façon dont les joints verticaux affectent, vers le milieu, des murs, deux légères inclinaisons qui semblent vouluies et rappellent le profil de clef de voûte. J'ai déjà note le fait. J.-de-F

Le relevé ci-dessous du parement intérieur Sud précise ce qui précède


Ceci est à noter parmi les remarques déjà faites au sujet de la Stereostomie propre au Phnom

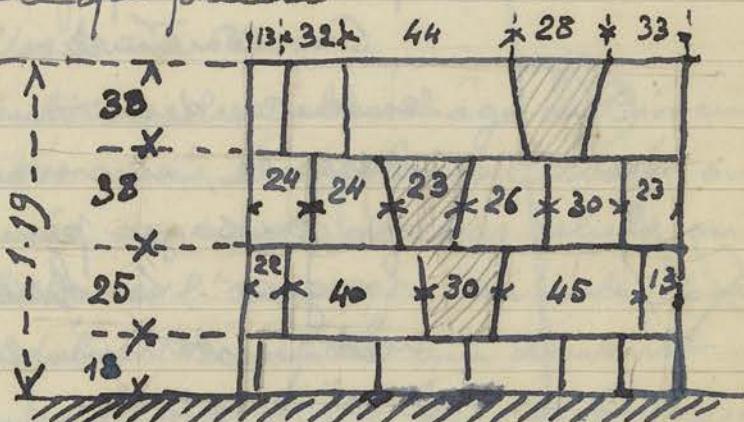

Batkhin - Il faudrait voir si le Phnom Thom et le Phnom Bante donnent lieu à des remarques du même genre.

Le ~~le~~ premier des 3 longs qui m'ont fait demander l'autorisation de s'installer pour la retraite habituelle sur la plateforme du Batkhin (base de la pyramide et ~~donc~~ dehors du mur d'enceinte) m'a fait constater

la pavillotte où il compte sejourner en A près de l'angle Nord-Est du mur d'enceinte dans un coin de brousse où cette pavillotte n'a rien de gênant: elle mesure 2'00 x 2'00.

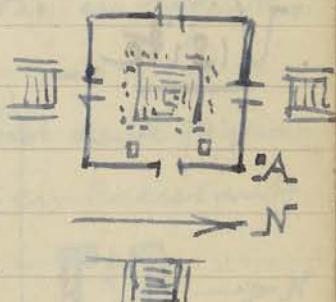

Samedi 18 Décembre.

Porte de la Victoire - Avec l'échafaudage de l'angle Sud-Est qui a été surélevé on replace certains blocs sculptés dans les parties hautes de cette partie de la Forte. Pour faire tenir ces pierres il faut surélever en même

PV

126

N
P

Prah Pithu

(T)

tempo que les bois de l'échafaudage la masonnerie en latérite qui remplace les blocs de grès absents et qui n'ont pu être retrouvés.

Prah Pithu - En prévision des buses que nous

fourniront les Gravans Publics on a fait une masonnerie en pierre sèche (latérite) de chaque côté du passage de la piste en construction qui franchit la douve Sud.

(Voir Croquis - en rouge - J. de F XIX - p. 182)

On commence à remblayer l'intervalle A



entre ces deux murets de latérite, en ménageant

un passage pour les busles de 1.00 de largeur. Les busles ayant 0.40 de diamètre intérieur et une épaisseur

de 0.07 cela fait une largeur

totale de 0.54 L'espace B

de chaque côté sera rempli avec du béton.



Pour avoir plus de facilité à mettre en place les buses susdites j'attends la pleine saison sèche quand les eaux auront encore diminué.

Visite.

Visite

Dimanche 19 Décembre

Arrivée de LLAR le Prince et la Princesse Savang, de S.M. la reine du Laos Madame Viphavong et Parisot Sa Souli Vong.

Visite l'après-midi à Oukor Thom

Lundi 20 Décembre.

Fait visiter à LLAR et à Samayeste le matin Oukor Vat, l'après-midi Prah Khan et Néuk Pan avec retour par le grand et petit Circuit.

Mardi 21 Décembre

Tour
Tours

Depart de L.L.A.R et de S.M pour Luang Prabang. 127

Fête de l'indépendance du Royaume du Cambodge. J'ai donné à tous les Coulis des Chantiers un jour de congé payé à cette occasion.


Mercredi 22 Décembre.-

Palais Royal Dépose des pierres du parement sculpté Terrasse d'honneur. de l'angle A (ressaut au nord au delà du perron central) — Croquis bas de la p. 123 — pour en resserrer les joints avant de remonter le naga balustrade cassé.

Chisor Vat On continue le rebouchage au ciment Gal. Sud (E) des cavités dues aux pierres cassées ou non retrouvées du mur des bas reliefs en allant de l'Est vers l'Ouest) — un autre couli magouine les débris sculptés qui doivent compléter les personnages des susdits bas reliefs et qu'on a pu retrouver : mais hélas ! il en manquera encore beaucoup

Pendant ce temps une chevre et un palan remontent les premières pierres de voûte sur le sol de la galerie en prévision de leur mise en place : là encore je crains qu'il en manque encore à l'appel. Heureusement le plafond masquera les parties incomplètes ou refaites avec d'autres matériaux.

Batkham — Sur la terrasse précédant la face Est de la pyramide (à l'intérieur de l'enceinte) en creusant dans la terre une cavité A (à 1.50 de la façade Est et à 1.20 au nord del axe de l'édifice latéral Sud) pour mettre le tenon de la statue que j'ai décidé de placer là (p. 124) on trouve, à une profondeur de 0.35, un vestige de dallage en

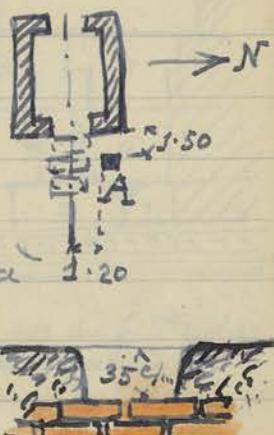

Briques à plat (en rouge) sous de la bâche en latérite.



On centre de l'édicule lateral symétrique Nord, qui on désigne généralement sous le terme impropre bibliothèque, en dégageant le sol pour y placer des statues on trouve une dalle granitique qui recouvre une faible épaisseur de terre.

La remise en place des pierres de l'édicule d'angle Sud Ouest du 5^{me} gradin est arrivée à hauteur de la corniche du rez-de-chaussé quelques pierres de l'angle Sud Ouest n'ont pas encore été retrouvées et laissent un vide dans la maçonnerie refaite.

Jundi 23 Decembre

Bakhein - Ayant fait redresser un des piliers inclinés du Vestige d'édicule dont un croquis figure au bas de la p. 120 et situé sur la plate forme supérieure au Nord de l'axe E-O du monument le Caporal me dit que la base du dit pilier est encastrée dans les 3 assises de latérite formant soubassement (pointillé ci-dessus).

Le chapiteau présente le profil très cambré ci-contre. 0.27
Les vestiges très vagués de constructions qui apparaissent très irrégulièrement dispersés sur cette partie de la plate forme doivent être d'assez basse époque. Il se pourrait que les piliers en

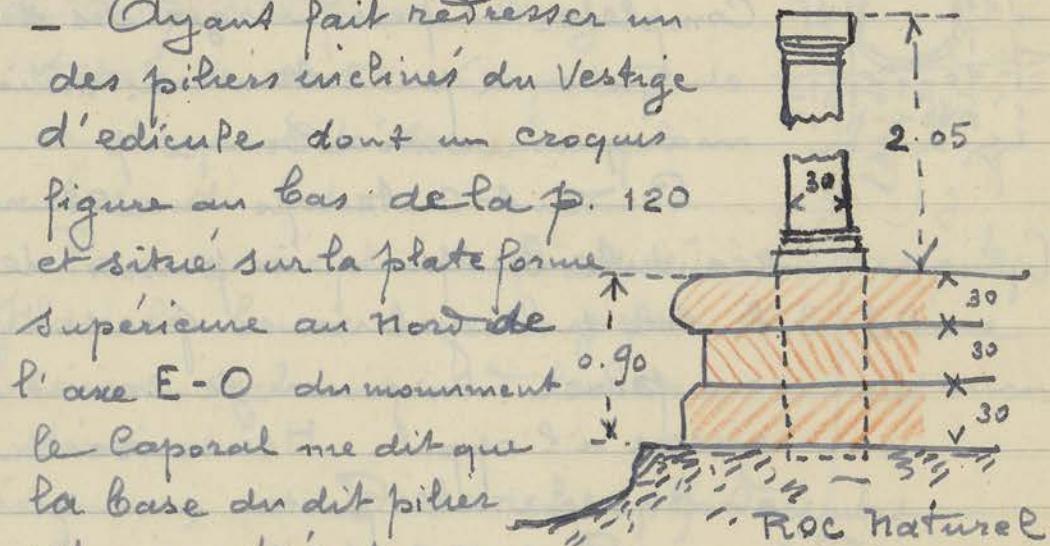

129

gres susdits fassent en réemploi.

Ainkor Vat

Galerie Sud (E)

A
V
gal. S. (E)

On commence à l'extrémité Ouest de cette galerie le remontage de la première assise de la Voûte dont on a pu retrouver des pierres en déblayant les décombres qui avaient été rejetés au bas du soubassement Sud de cette galerie écroulée.

Vendredi 24 Décembre

Baphuon

Etat à ce jour des remontages du soubassement à la base du 3^{me} étage et à l'Est du perron Nord:

■ 1 assise

■■ 2 assises ■■■ 3 assises

mais les paroxysmes des blocs

ainsi remplacés sont loin de présenter une surface régulière et plane. Comme pour le Bassin de la galerie d'Ainkor Vat beaucoup des pierres furent détériorées, plus ou moins cassées, profils épauprés etc dans la chute provoquée par l'écroulement.

Ainkor Vat. La fermeture de la Voûte déposée arriva à

Galerie Sud (Ouest) au niveau du 20^{me} pilier (en venant de l'Ouest)


A
V
gal. S. (O)
gal. S. (E)

Soit donc à 55 mètres du début de la galerie montre un écart entre les 2 assises supérieures en A de 27 Centimètres (voir p. 119 en bas et 120 en haut)



Galerie S. (Est)

Huit pierres de la Voûte ont été déjà remontées à l'extrémité Ouest de cette galerie et à la suite de la partie qui n'était pas tombée lors de l'écroulement. L'aspect de l'intérieur de la partie remontée est celui ci-dessous, avec des cassures qui font que les joints ne peuvent se raccorder exactement. On continue la recherche des autres pierres de cette Voûte.

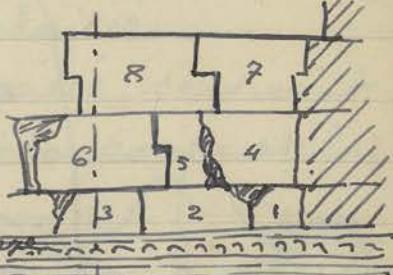

axe du 6^{me} pilier
de la galerie en
venant de l'Ouest

130

Samedi 25 Décembre

Bureau fermé - noel -

Prah Pathu - Pour remblayer la partie de courre à traverser entre les 2 cordons de blocs de latérite formant parement de soutènement

de chaque côté (p. 108)

et plan J. de F. XIX p. 182) on préleve de la terre sur une légère éminence du sol au Sud du temple X (le plus à l'Est) On

à environ 8 m au Sud

de l'angle Sud-Est du

Soubassement et

7 m à l'Ouest du

parement Est du dit soubassement on rencontre en A une grande quantité de tessons, tuiles et débris de briques, presque à ras du sol.

Porte de la Victoire. - On déplace l'échafaudage de l'angle extérieur Sud-Est pour le transporter à l'angle Nord-Est en vue du remontage des blocs sculptés provenant d'une des têtes des personnages alignés à la base des têtes gigantesques de la tour centrale.

Dimanche 26 Décembre

Paye des Coules

Lundi 27 Décembre .

Palais Royal Dans les pierres sculptées ou débris montures Terrasse d'hommes retrouvés sous les racines de l'arbre tombé

le 14 Septembre dernier (et qui a été débité en planches de 0.02 et 0.03 d'épaisseur pour les coffrages) le Caporal me montre un fragment de bas relief malheureusement très effacé, assez curieux par la pose inhabituelle des



132

personnage représenté : pose du Vénus Couche
la tête appuyée sur la main droite, mais rien
n'indique un dieu, et ~~Vénus~~ en particulier.


P.R

On retrouve parmi les blocs sculptés épars
ça et là sur le dessus de la partie centrale
supérieure de cette terrasse plusieurs bas reliefs
de la frise de hamsa qui décore le rebord nord
de cette terrasse et qu'on peut remettre en
place. (voir p. 124 en haut)

Douche Ouest La remise en place des assises de la Voute
Galerie Sud (E) éroulé (extrémité Ouest voir bas de la p. 129)

A S(E)
gal.


se heurte déjà à une première
difficulté, inévitable et
inévitable d'ailleurs. Un
morceau A de l'assise
supérieure latérale Sud est cassé et ne
peut être remis en place, ce morceau se
trouverait en porte à faux instable. Il
faudra le remplacer par du béton et 4
pers de 0,010 avant de replacer la dalle
incurvée de couronnement de la Voute B



Douche Ouest La grue continue à enlever herbes et luc-
tins dans la nouvelle zone limitée au Nord
de la chaussée Occidentale. Une grande partie
de cette zone est actuellement dégagée mais
il reste la partie située près des bords de
l'Est et à l'Ouest partiellement renblayée
et d'un nettoyage plus malaisé.

A T

Les terres et herbes retirées serviront
à renblayer l'espace entre la route et la
douche G ci-contre que la
par endroits est assez fortement en contrebas. Cette partie de la
douche est troublée par les buffles qui y pren-



13^e

ment constamment leurs ébats.

mardi 28 Décembre.

Antkor Wat. -

Vérifié sur place cette observation
Entrées Occidentales d'un touriste au sujet des jupes
Porche Est portées par les térodas sculptés de
chaque côté du porche Est du passage
central des entrées occidentales.

Côté Nord - La jupe de ces térodas
est plissée verticalement sans décor.

Côté Sud - La jupe est décorée d'un
semis de fleurs.

On sait que Stern s'est basé sur
cette distinction du costume pour établir
ses deux époques de Sculpture.

Y a-t-il là simple fantaisie non prémeditée
du sculpteur ou un motif quelconque
a-t-il entraîné sur un même édifice
cette distinction ?

Baphuon -

Je fais repasser vers l'Ouest la dalle A
de l'angle du soubassement à l'Est
du pignon central nord du
2^{me} étage qui s'était
fortement déplacé vers l'Est et était en équilibre
instable. Une dalle du même soubassement
à la suite ayant été retrouvée pourra
venir toucher le hiatus provoqué par
son absence : cette dalle et la précédente
A appartiennent à la rangée de la
3^{me} assise en partant du bas.

Phnom Bakheng - On est arrivé au niveau du 3^{me} étage
de l'édifice de l'angle Sud-Est en
reconstruction. Parmi les blocs manquants
et qui n'ont pu être retrouvés deux

Bakh

Bakh

733

à l'angle Sud Ouest du rez de chaussée, ont été remplacés, non pas de la latérite, ni du béton, mais par deux pierres de grès gigant dans les décombres et sans aucun indice pouvant préciser leur provenance. On a vaguement, comme c'est l'usage en pareil cas à Java, taillé un profil d'épannelage simulant celui des moulures et, toujours comme à Java, lorsque plus tard il ne puisse y avoir confusion possible au sujet de ces deux pierres ne faisant pas partie de l'ancienne construction je fais graves visibles sur les pavements les deux lettres E-O (Est-Orientale)

mercredi 29 Décembre

Dirkor-Vat Le remontage des assises de l'ouverture galerie Sud (Est) sur les murs de l'extrémité Ouest de la galerie continue avec les blocs plus ou moins morcelés, ce qui presage une dépense de ciment considérable pour remplir les vides afin d'assurer l'homogénéité de la voûte et la rendre stable.

Bakhieri - La reconstruction de l'entrée Sud Est étant presque achevée, on cherche des fragments de Kalasa de couronnement et de dalle à dépot pour mettre au sommet, on décide, après examen sur place, de déposer à partir de la 3^e assise du bas l'entrée au Nord de l'Escalier Est (toujours sur ce même 5^e gradin) pour rapprocher les pierres déplacées et supprimer les fissures qui séparent la maçonnerie.

Programme de travail Devant m'absenter pour trois jours à Phnom Penh, profitant des vacances du jour de l'an, pour plusieurs demandes à faire et fournitures à rapporter je décide de laisser continuer certains chantiers pendant cette absence, sous la direction

Rapport des chantiers

active et avisée du Chef de Chantier Suon dont je reconnais les qualités techniques et le dévouement. Sa longue pratique des chantiers en fait un auxiliaire précieux.

N'ayant pas d'auto à sa disposition puisque je cours avec la Camionnette je suppose les 4 chantiers d'Ankor Thom à Porte de la Victoire et Terrasse d'Homme dont les Caporaux et leurs équipes vont intensifier le travail des galeries d'Ankor Vat. - L'équipe du Baphuon ira au Bakheng et celle du Prasat Phnom commencera le rangement, redressement et remise le plus possible en état des fragments de balustrade devant la porte Sud d'Ankor Thom. Celle du côté Ouest, montrant le plus de morceaux renversés, mal présentés, déversés, inclinés, et mal alignés, sera la première où ce travail s'exécutera.

Les chantiers d'Ankor Vat continueront.

Bantay Srei - Pour la 1^{re} fois le tableau noir de l'Hôtel annonce pour 24 heures le départ d'une excursion touristique à Bantay Srei, ce temple, je l'ai remarqué, jouit d'une très grande notoriété parmi les visiteurs.

Jeudi 30 Décembre

Parti à Phnom Penh avec Camionnette Ford par le Courvoi.

Année 1949

Jeudi 6 Janvier 1949

Retour de Phnom Penh. Le trajet en corté par courvoi militaire est interminable, les arrêts innombrables rendent ce voyage assez fatigant. Mon séjour à Phnom Penh a eu pour motif -

L'achat de matériel de bûcheurs, d'outils

de ferr roudo, pointes ok chez divers fournisseurs.

J'ai rapporté également de l'hyposulfite qui manquait pour la photographie et qui on ne peut se procurer qu'en passant par le marchionnoi.

La Camionnette Ford a fait l'objet de séparations diverses, remplacements de lames de ressort et révision du train arrière.

J'en ramène de phare qui n'avait pas été fourni en même temps que la Berline Pittroon CV II.

J'ai vu monsieur Parmentier qui venait d'avoir une crise d'épilepsie qui a duré près de 36 heures et pendant laquelle il était dans le coma.

Il avait un peu repris connaissance, m'a tendu la main quand je suis arrivé mais sans me reconnaître. Il décrivait et ne se rend plus compte de rien. Il n'a pas l'air de souffrir mais je ne crois pas qu'il puisse vivre encore longtemps.

Monsieur Parmentier est littéralement à bout de forces, car on est obligé de veiller continuellement sur lui.

L'objet principal de ma descente à Phnom Penh était d'essayer de trouver un assassinat.

Une fois aux Tribunaux ils ont quelquefois des demandes d'emploi, mais pour l'instant ils ne connaissent personne. Quant au Directeur des Arts Cambodgiens M^e meas Toun il en avait cinq (en plus de celui qui s'est recusé) qui auraient pu faire mon affaire, mais aucun d'eux n'ose se risquer à aller habiter Siemreap qui leur paraît (et à cette réputation) d'être un endroit excessivement dangereux. Naturellement la mort de mon assassinat chea Chhan est mise sur le compte d'un attentat à Issarak alors qu'il est à mort de syphilis à l'hôpital.

Ph. Ponth

peintures Cambodgiennes modernes

J'ai vu mme Solange Bernard dont l'activité ne se dément pas; elle prépare une exposition d'imagerie Cambodgienne. Pendant mon séjour elle a fait une communication très intéressante à la Radio sur la littérature ancienne et moderne du Cambodge.

Oyant voulu voir comment se présentaient à l'heure actuelle les fresques de la galerie pourtourante du Vat Phrah Ho Prak Ker (Palais royal) j'ai constaté l'état lamentable de ces peintures par suite d'incurie, de négligence.

Des couleurs, bavures de battegeon se mêlent à des graffiti au charbon et des taches de toutes sortes. Ces galeries étant transformées en salles de classe, moutres et élèves n'hésitent pas pour griffonner sur les murs.

Il est flagrant que pour les Cambodgiens les peintures sur fresques illustrant le Recamier Klimer et constituant un exemple de ce que l'art Cambodgien a pu donner comme réalisation d'un tempérament qui a un sens décoratif très prononcé - (pardon, qui "d'ait") ces peintures n'ont aucun valeur.

Et pourtant ces peintures, je ne crois pas, qu'on puisse les remplacer et qu'un artiste astucieux puisse donner quelque chose d'équivalent, en restant dans les traditions anciennes.

J'en ai eu la preuve quand au cours de ma visite je suis tombé sur un panneau refait sans doute tout récemment. Le ton frais et vif des couleurs, l'état de propreté où se trouvait cet emplacement du mur ne laissaient aucun doute à ce sujet. Mais les tons odieusement vulgaires de ces peintures, le dessin maladroite, compromis ridicule

Revue Cambodge moderne

132

entre le dessin khmère de jadis et la peinture européenne, accusaient un mauvais goût total.

C'est lamentable de constater comment sera respecté cette galerie, quand on voudra la remettre à neuf, comment sera traité cette illustration du Ramayana.

Je regrette de n'avoir pas donné suite à mon projet quand je venais de débarquer au Cambodge en 1905 de publier ces fresques en collaboration avec un collègue qui était très bon photographe : je me serais chargé du texte, inspiré d'ailleurs par les petites inscriptions qui décrivent chaque scène.

Mme Solange Bernard m'a retrouvé 2 clichés, dans les archives de son musée, que je lui ai demandé de me faire tirer, de ces panneaux. M^e Poeré m'ayant dit que S.E. l'otkha Thivoun en avait fait prendre une série de photos j'ai interrogé S.E. Cham Van ministre de la Défense nationale à ce sujet. Il n'a pas entendu parler de ces photos, mais il ajoute : " Vous pourrez peut-être vous renseigner auprès du Palais Royal ; il se peut que les clichés dont vous parlez s'y trouvent."

Enfin M^e Roger Dalet le collaborateur dévoué de M^e Parmentier, m'a montré, au sujet de cette enquête menée sur les peintures cambodgiennes - des photos de fresques qu'il a prises dans une pagode près de Kompong Luong, Vat Sonthora Koha Badei (Prek Pranak) qui sont absolument admirables et mériteraient une étude particulière, que d'ailleurs M^e Dalet a écrite, ~~à dessein intéressant de la~~ la publiera. Les clichés de M^e Dalet sont assez bons et au besoin on pourrait en reprendre en sorte, ayant que cette pagode (qui date de 1850) va tomber vers mouille et que les peintures ~~sont~~ soient effacées ou maculées et défigurées.

Vendredi 7 Janvier

Porte Sud

Constate qu'en mon absence l'équipe qui travaillait d'Ankor Thom. - au Prasat Phnom, transportée à cette Porte Sud avant

T

commence le rangement et l'alignement des morceaux de géants, côté deva - (ouest) en commençant à l'extrémité nord. (p. 134) Bien qu'on ne puisse songer à remettre cet alignement dans son état d'autrefois comme on l'a fait à la Porte Nord et à celle de la Victoire, le résultat obtenu rendant moins chaotique l'aspect de ces géants est déjà satisfaisant. Cette équipe reprend son travail de la chaussée remblayée traversant la douve Sud du Prasat Phnom. Elle viendra, après cela, continuer l'aménagement des géants balustrades de la Porte Sud d'Ankor Thom.

Ankor Wat

Le nettoyage, enlèvement des herbes et
douve Ouest Lue Cuin dans la douve au nord de la terrasse
avenue d'accès au temple est terminé.

T'

Le Caporal au cours de cet enlèvement des herbes a trouvé près des gradins ouest de la douve une musette contenant 3 grenades et 26 cartouches, trouvaille faite le 29 décembre.

Ces grenades non éclatées, j'ai une repugnance instinctive pour ces sortes d'objets, ont été rendues avec les cartouches aux autorités militaires du Secteur Nord.

△

A/10
Douve

A

Cette équipe parachève le nettoyage de la nappe d'eau près des bords ou des herbes, ou sortes d'algues, flottent encore, rendues visibles par la baisse anormale des eaux.

Le canal d'évacuation des fossés d'A. Wat dans le Stuor que j'avais fait boucher serait-il de nouveau rouvert ? il faudra s'en assurer.

Je profite que la baisse du niveau d'eau

A ✓
D pour D
X

montre à découvert un certain nombre de pierres, fragments de colonnes rondes et de Sein tombées de la margelle de la chaussée occidentale, pour les faire ramener près du parement de cette chaussée. Les morceaux de colonnes sont trop rongés par l'eau et incomplets pour pouvoir reprendre leur place mais les fragments de Sein seront peut-être susceptibles d'être remontés sur les perrons latéraux.

Chifforthom. - Un vol a été commis dans la nuit du 2 au 3 Janvier, avec effraction et bris du grillage de la fenêtre la plus au Sud de la façade Ouest du Dépot en vue de pénétrer à l'intérieur.

Ce vol a rapprocher de Céna déjà constaté les 22 Juillet et 20 octobre derniers à certainement été commis par les mêmes individus. On me signale l'enlèvement de 2 rails Decauville.

D'après le rapport du Chef de Chantier ces individus pour entrer ont fracturé le susdit grillage de la fenêtre, puis pour sortir les rails ont ouvert la porte en tôle (qu'on ne peut ouvrir que de l'intérieur) voir J. de F. XIX p. 177

Ce qui ne laisse pas de m'étonner, c'est la précaution, paraît-il, que prennent les voleurs, après avoir sorti les rails, de refermer la porte, donc de rester enfermés dans la salle du dépôt, ce qui les oblige à ressortir par la fenêtre comme ils sont entrés. Plainte a été déposée au Conseil Régional.

Samedi 8 Janvier.

Bathen - La statue retrouvée près du mur d'enceinte Est Côte Sud (p. 124 et 127 bas des pages) a été redressée les membres cassés raccordés avec goussets et scellés devant la façade Est de l'édicule Bibliothèque Sud — au nord de l'entrée.

La statue qui gît actuellement dans l'edi-


Bath

culée bibliothèque symétrique Nord sera également remontée mais au centre intérieur de cette dernière sur une dalle suanadrou qui existe à cet emplacement. Je n'ai pu trouver le bâti (pedestal) sur lequel cette dalle venait s'ajuster: je la fais surélever un peu au dessus du niveau du dallage avant de placer le tenon inférieur de la statue dans la cavité carrée du centre. Il faut préciser que cette statue ne fut pas jadis placée sur cette dalle, le tenon dessous être retaillé légèrement pour se loger dans la cavité constituant la mortaise.

Sur sommet de la pyramide l'édicule de l'angle Sud Est du 5^e gradin en reconstruction est terminé: ~~un~~ motif terminal en Kalasa a pu être retrouvé et placé au sommet.

On a commencé la dépose, comme Contentum (p. 133 - 29 dec.) des étages supérieurs de l'édicule sur ce même gradin au nord du perron Est.

Oinkor Vat - La remise en place des assises des Voûtes Galerie Sud (Ouest) qui avaient été déposées se continue. On est arrivé au niveau du 23^{me} pilier de la galerie (en venant de l'Ouest) soit environ 57 mètres du début de la galerie: le vide entre les 2 assises supérieures, dû à l'écartement produit par le renversement vers l'extérieur des 2 murs supports est de 0.40. Pour la stabilité de la Voûte




Cet écartement est garni

d'une poutre en béton armé

avec étrier supportant 2

barres de fer roulés de 12 mm/m

et crampon supérieur de 16 mm/m.



Lundi 10 Janvier.

Ainkor Vat

Clôture cruciforme
ou Prah-paun

S
Prah-paun

Battambang

Bat

B

Ainkor Thom

Dépot du

Bayon



Vol

Pendant mon absence on a remis en place sur leurs piliers de support deux architraves (en rouge ci-contre) à l'extrémité Sud de la branche Sud du prah-paun : ces deux architraves déplacés et reportées vers l'extérieur ne reposaient pas sur les piliers qui à moitié ce qui compesouettait leur équilibre.

Battambang — La statue féminine retrouvée à l'intérieur de l'édicule dit Bibliothèque Nord a été remontée sur un socle de fortune en latérite devant la façade Est au Sud de l'axe principal de cet édicule. Elle fait ainsi pendant à celle qui vient d'être remontée à l'édicule symétrique Sud (Bas de la p. 139) On prépare un massif surélevé légèrement, en latérite, pour y dresser la statue masculine à l'intérieur (haut de la p. 140)

Sur le sommet de la pyramide on a déposé une partie des assises du Rég de Chaussee ; la partie redressée à la surface des lits des dites assises oblige à déplacer toutes les pierres en vue de les réajuster et reserrer les joints qui se sont ouverts (édicule au N de l'échelle).

Ainkor Thom De nouveau on a constaté le vol de rails decauville dans la nuit du 9 au 10 Janvier à la Salle Ouest, du Dépot du Bayon. Ces vols se succèdent à un rythme si fréquent qu'il va falloir songer à enlever tout le matériel entreposé à cet endroit pour le

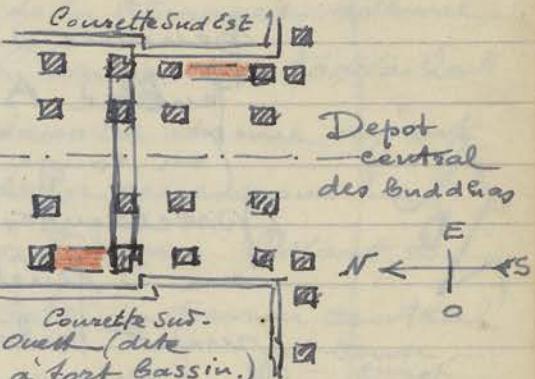

142

déposés ailleurs, à la conservation d'anglais
dite Pteah Thma où un magasin est disponible.

L'arrachage du grillage pour
fenêtres s'est effectué à la
fenêtre A de la façade Sud

(en rouge) Les effractions
précédentes s'étaient produites

aux 3 fenêtres de la façade Ouest, actuelle-
ment rebouchées provisoirement par des planches
(en bleu). Je fais reboucher de la même façon
la fenêtre fracturée A. Il reste aux voleurs
qui semblent habitués à ce genre d'exercice
les fenêtres numérotées 1 2 et 3 : la torche
dont ils se servaient pour s'éclairer est retrouvée
à demi consumée sur une table, ainsi qu'un
morceau de bois noirci par la flamme.



Mardi 11 Janvier

Visite à la demande du Conseiller Régional fait faire
la Visite du Grand et Petit Circuit à M. M. Cart et Doutot ~~Inspecteur général de l'enseignement~~
Constaté à Ta Prohm au gopura Central Est
de l'enceinte 4 un décollement

inquiétant du pan de mason-
nerie à l'angle Nord Ouest
de la partie Centrale (en
rouge ci-contre)




Tre Rup fait en général très bonne
impression et me permet de placer mon
pied sur le sanctuaire surélevé sur gradins
(Temple montagne) innovation de l'art
Khmer, inconnue dans l'Inde.

Mercredi 12 Janvier

Nouveau Dessinateur - Un jeune Cambodgien Kraham Phichay
venant s'offrir comme secrétaire et me disant

avoir quelques notions de dessin je le prends à l'essai comme journalier. Je l'emmène avec moi dans ma tournée de chantiers et essaie de lui faire prendre un relevé du perron central nord de la Terrasse avancée occidentale d'Angkor Vat. L'équipe qui travaillait à l'enlèvement des herbes dans la douve ayant terminé ce travail, démonte la grue pour la ramener au Dépot d'Angkor Thom. Avant de lui faire remonter de chaque côté du perron central ci-dessous en A et B les morceaux de bois retrouvés (en haut p. 139).
 Je fais déposer les dalles du carrelage (en bleu ci-contre) très fortement affaissées par suite de l'affouillement et du ravinement du remblai intérieur.

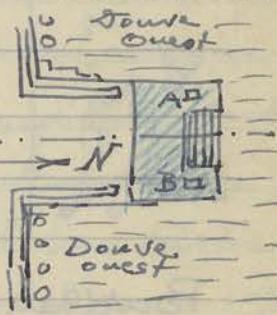


Conservation Dépot - Il faut constater l'état des dépendances de la Pteah Thma au nord du bâtiment d'habitation (actuellement Dépot) en vue d'y installer le matériel, rails de caurville et outils actuellement entreposés dans le Dépot près du Bayon et qui fait l'objet de vols de plus en plus fréquent. Les fenêtres par où se sont déjà introduits les voleurs (voir Croquis, plan en haut de la p. 142) ayant été bouchées avec des planches, il reste encore les fenêtres numérotées 1, 2 et 3 pour que les vols puissent commettre en fracturant le grillage (métal déployé).

Il faudra enlever la cloison du bâtiment des dépendances de la Pteah Thma pour laisser la longueur nécessaire pour les rails et remettre de la paille sur la toiture. Le petit local en maçonnerie contigu, ancienne

~~144~~ Cuisine) devra être recouvert de tuiles plates, et des chevrons et le lattis pourri remplacés.

Jeudi 13 Janvier. —

Antor Var Sous les assises de Voutes qui viennent d'être Galerie Sud (E) remontées sur l'entablement côté Sud les parties cassées laissent un vide qui serait dangereux pour la stabilité des assises du dessus. Je fais remplir cette cavité par un béton avec fer interieur (en bleu Ci. contre) en ayant soin de laisser l'emplacement disponible pour l'about des poutrelles du plafond.




parties cassées laissent un vide qui serait dangereux pour la stabilité des assises du dessus. Je fais remplir cette cavité par un béton avec fer interieur (en bleu Ci. contre) en ayant soin de laisser l'emplacement disponible pour l'about des poutrelles du plafond.



Bat. Rein - On commence à remonter les assises déposées de l'édicule au nord de l'Escalier Est du 5^e gradin après consolidation au moyen d'un renforcement en ciment de la base et resserrage des joints des blocs qui n'avaient pas été démontés. (B sur le schéma Ci-dessous)



On dépose les blocs du soubassement de la terrasse centrale en A

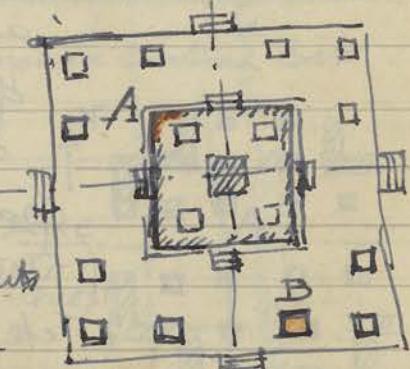

pour rehausser les assises légèrement affaissées à cet endroit et resserrer les joints qui s'étaient ouverts

A la base de la pyramide

on prépare un socle en bâtière S → N pour placer la statue masculine sur une dalle en suanadiori retrouvée au Centre de l'édicule bibliothèque Nord devant la face Est



Prah Pittu

Le décapage du sol au Sud de l'angle Sud Est des soubassements de l'édicule X pour remblayer la piste qui traverse la cour.

R.
P.
CA 688
DB


(Voir p. 130) met toujours au jour des débris de tuiles et briques. Arrive à 3^m du parment Sud du Soubassement du Temple un Coulis me renvoie des Crampons en fer, pointes et débris métalliques divers que j'enregistre sous le n° 688 du Catalogue objets métalliques du dépôt.

Vendredi 14 Janvier.

Olinkor Vat Le Dessiminateur continue, avec mes indications sur Chausseie ouest. place le relevé plan et coupe du perron nord en decrochement au milieu de la Chausseie extérieure traversant la doute. Il s'entasse difficilement.

Les coulis déplacent les dalles affaissées de l'extrémité nord de ce decrochement pour relever le niveau du sous-sol (en bleu sur le schéma p. 143)

Je remarque dans les dalles des rebord extérieur des cavités qui doivent servir à loger des fers d'ancre qui furent naturellement volés comme



Tout les fers de ce genre, très fréquents dans la construction du Temple d'Olinkor Vat

Gali. S (E)

Devant le grand nombre de cavités à remplir de béton dans l'entablement de la galerie Sud côté Est en reconstruction, pour assurer un maximum de sécurité au mur des bas reliefs transformé par endroit en mosaïque d'opus incertum et au support, du côté Sud, des piliers je décide d'accord avec le Chef de Chantier Suon, de placer sur les assises basses de la voûte déjà remises en place un fer chaînage de 16" de diamètre pour relier les deux murs et prévenir un mouvement d'écartement possible.



P. 146

Y. 146

A.

entre les deux murs. Ce fer chainage ne sera pas visible puisque situé au dessus du plafond qui doit dissimuler l'intrados de la voûte.

Un fer chainage sera ainsi placé toute les deux travées de piliers soit environ tous les dix mètres.

Samedi 15 Janvier

Nouveau et
Dernier

En prévision de la réfection des couvertures des locaux, Cuisines et dépendances, de l'ancienne Conservation Psteah Thma (bas de la p. 143) je fais transporter du lattis entreposé au dépôt du Boulou ainsi que des tuiles plates qui restent à l'emploi à cet endroit.

Porte de la Victoire - On a acheté la remise en place des fragments sculptés retrouvés dans les déblais retirés des douves (p. 130) sur la façade Est. On retire les échafaudages pour les ramener sur la façade Ouest où d'autres blocs sculptés ainsi retrouvés pourront reprendre leur place.

Parmi ces blocs, les deux plus importants sont deux fragments du bas. relief du tympan du fronton central au-dessus de la porte : une partie de ce tympan a déjà été reconstituée par Suon au moment de l'absence de Conservateurs à Oinkor, cette reconstitution étant localisée dans la partie haute du tympan. Les deux pierres retrouvées proviennent de la partie basse (^{et médiane}) il y aura donc un intervalle à remplir avec du béton et aussi à démolir partiellement l'armature en béton qui supporte actuellement

les fragments déjà remis en place. On ne saurait trop insister sur l'énorme intérêt que présente cette reconstitution, partielle malheureusement, de cette partie de la Porte, car c'est la seule porte d'Ankor Thom qui ~~possède~~ possède sur cette façade Ouest un souvenir précis de l'ensemble architectural. Les touristes ont actuellement une impression très fausse des façades de ces portes à cause de l'ouverture bréante en hauteur qui surmonte le passage intérieur et ne correspond pas du tout à l'ancienne proportion.

Région moi - Un visiteur qui est venu consulter des livres à la Conservation M^r François Bourliac qui fut en service comme Conseiller adjoint à Ban me Thust me donne des renseignements sur la tour Chau de Yai Prong (IG-I-p.557 et BEFEO VI - p.343 avec plan de la Région levé par H. Maître p. 344) Si l'occasion se présentait d'aller à Ban me Thust, d'après les détails donnés sur cette tour, il serait intéressant d'aller voir comment elle se comporte à l'heure présente : cette région est, paraît-il, habité par un génie malaisant et dangereuse pour les indiscrets qui s'y risquent. Ce n'est pas une superstition gratuite puisque Odendhal le premier français qui visita Yai Prong périt assassiné et H. Maître qui fut le second à la voir périt de même.

Du point de vue ethnographique il y aurait un intérêt à étudier cette partie du D'arlac, avec les précautions qui s'imposent pour ne pas froisser les croyances des autochtones. Dans le même ordre d'idée je signale qu'avant d'arriver aux ruines de Sambor Prei Kuk, en venant de Kompong Thom la piste passe à proximité d'un présumé "bois sacré" sur lequel je ne crois pas qu'on ait jamais

fois d'informations pour savoir sur quoi repose cette réputation; dédié aux ethnographes?

Dimanche 16 Janvier


Taye des Coulis.

Lundi 17 Janvier

Encore les Orpailleurs. - Le gardien d'Ankor Thom me signale de récentes dégradations dans la forêt à l'Ankor Thom à proximité des monuments et le danger qui peut en résulter, arbres dont les racines sont mises à nu au cours du défoncement du terrain pour prélever de la terre destinée à être lavee pour recueillir des parcelles d'or. (XIX-p.167)

Est-ce donc si lucratif et d'un si grand profit que des villages entiers se livrent à cette occupation sur une échelle qui devient inquiétante. Je vais reconnaître sur place ce qui en est et suis effrayé du spectacle de terrain recreusé et bouleversé qui s'offre à ma vue; je ne peux comparer cela qu'à un emplacement qui aurait subi un bombardement intensif et continu.

Le premier endroit où je suis conduit se situe au Nord du Palais Royal, à l'extérieur du mur d'enceinte entre les gopuras d'entrée.

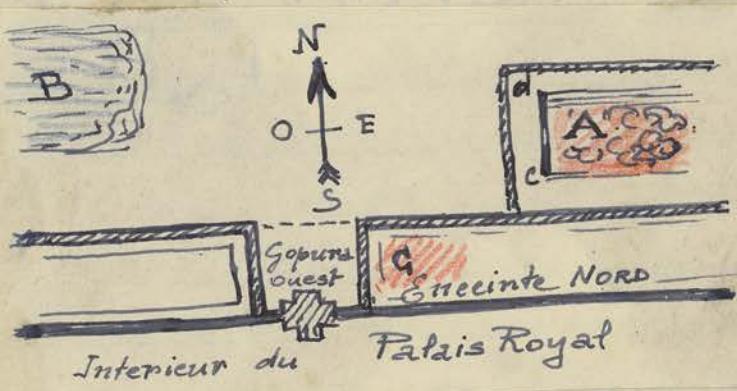

En A immédiatement à l'Est d'un parement sculpté en grès orné d'un bas-relief

mantique et qui est l'extrémité Ouest d'un ancien bassin (en rouge ci-dessus) Le terrain en cet endroit montre l'aspect décrit plus haut,

Après nombreuses cavités irrégulières parfois assez profondes, j'en ai mesuré une qui descendait à 2^m 30 en sous-sol. Des arbres ont été déracinés par suite des parties creusées sous le trou. La superficie de terrain ainsi bouleversée s'étend sur 100^m en direction Ouest-Est et 40 mètres (environ) en direction Nord-Sud.

De nombreux autochtones, des femmes pour la plupart s'enfuient à mon approche et se dispersent dans la forêt, abandonnant sur place leurs paniers à demi remplis de terre.

Ces terres sont transportées ^{plus à l'Ouest} (en B) dans un ancien trapèze à l'heure actuelle à demi comblé par le lavage des terres.

Continuant à marcher vers le Nord, guidé par le gardien nous arrivons au Prat Phalay et en dehors de l'enceinte de ce temple au Nord-Est du Gopura Est un autre emplacement montre le terrain défoncé par des cavités semblables sur une superficie moindre toutefois (environ 50^m x 30^m) et avec des cavités moins profondes.

Toutefois là encore des arbres excavés par dessous se sont abattus. Nombreux tessons.

Après avoir donné des ordres de prendre les noms des fouilleurs qui creusent ces trous au Gardien ce dernier n'ayant fait entendre qu'il pourrait de ce fait risquer des représailles des gens démontés par lui, les habitants qui se livrent à ces dégradations étant, passait-il, des villages de Trapèze (Antor Vat) Nokor Krasan et Samrong (au Nord d'Antor Thom) et Barai (à l'Ouest) je décide de faire une plainte au Gouvernement de Siem reap pour qu'il rende responsable le metkhum des

susdits villages.

Une question est posée par moi. Pourquoi les orpailleurs semblent-il se contenter pour leur recherche de l'or en ces endroits alors que la superficie d' Ainkor Thom et les alentours présentent des emplacements disponibles, et en dehors du Voisinage de monumens classés. On me dit qu'ils font certains prélevements de Terres en divers endroits et que quand ils tombent sur un endroit propice ils s'acharnent là pour creuser et prélever des Terres. Le problème est le suivant: Y aurait-il certaines régions de l'ancienne ville royale plus spécialement aurifères.

Le premier endroit A au nord du Palais Royal (Voir croquis p. 148) est un emplacement d'un ancien bassin, donc colonné et la Terre qui le remplit actuellement est dû à un dépôt de humus qui s'est accumulé là depuis six siècles. Comment ce remblai dépôt de humus peut-il contenir de l'or. Il ne faut pas oublier de noter que le niveau de l'ancienne ville royale était bien inférieur à celui actuel puisqu'il faut creuser pour mettre au jour les vestiges de cette ville. Le bassin A montre dans les cavités creusées par les orpailleurs des débris de tessons, poteries indiquant que cet endroit était habité.

Bakheng - On est arrivé à l'édifice en reconstruction au nord de l'escalier Est, à la corniche du 3^{me} étage.

Bantay Srei - Sur la demande de l'ancien gardien de Bantay Srei, qui avait interrompu son service, cette

152

region ayant été évacuée à cause de la présence des Issarakhs ~~mais aussi~~, ce service de gardiennage du Temple de Tavarapura est repris. Il est probable qu'une prochaine expédition à ce temple aura lieu, à laquelle je me joindrai pour examiner l'état actuel de ce monument.

Mardi 18 Janvier.

Toujours les Orpailleurs. — En allant sur place prendre des photos de constats des dégradations commises par les orpailleurs qui bouleversent et saccagent la forêt très près des temples ou monuments d'Ambon Thom (p. 148) je tombe sur un nouvel emplacement où des cavités dans le sol prouvent des recherches récentes d'or à cet endroit : c'est au Nord Est du Gopura Ouest des murs d'enceinte nord du Palais Royal, en C, sur le plan schéma au bas de la p. 148. L'emplacement ainsi saccagé (j'en prends une photo également) s'étend sur 20^m Nord Sud et 50^m Est Ouest, chiffres approximatifs.

La encore, c'est entre les 2 murs d'enceinte du Palais Royal, très près du mur Est qui limite la Cour extérieure du Gopura susdit, on se trouve dans un emplacement qui jadis était un bassin fosse : « douze large d'une vingtaine de mètres, parementé en pierres disposées en gravins et bordé de deux berms larges de cinq mètres chacune » ainsi s'exprime Olymniére Tome III. p. 128. Il est inadmissible qu'on puisse ainsi perturber, peut-être faire disparaître des documents importants, des endroits classés. On peut caractériser ce délit, vu l'importance des terrains excavés, de manière clandestine, ce qui tombe sous l'article 28 de l'arrêté du 11 juillet

P. R

qui ils étaient avant. Cette terrasse d'honneur a dû être plusieurs remaniée à diverses époques qui en tant que document d'une époque elle ne présente d'intérêt que par son parement extérieur sculpté de lions atlante. De plus, ce qui n'est pas pour simplifier les choses, elle a subi à différents endroits des remaniements en cours d'exécution ; sous ce rapport la photo du bas-relief d'aprasas sur le pignon Sud de cette terrasse est très parlante. (Elle est reproduite en illustration dans AAK Tome II - 1926 fasc. 3 pl. 29-A)


Jundi 20 Janvier

Ongkar Vat - En arrivant sur les chantiers d'Ongkar Vat Porte Sud des Elephants le Caporal me signale des dégâts tout récents produit au passage intérieur de la Porte Sud (dite des Elephants) par le Camion d'un entrepreneur qui apporte des briques aux Bouzes de la Pagode Sud. Je vais constater avec lui et il est évident qu'une manœuvre maladroite du Conducteur de ce Camion a provoqué, non seulement des craquelures dans les 2 montants de la porte, (ce qui en A et B ?) mutilé fâcheusement le joli décor à relief de ces montants, mais des déplacements des assises du soubassement en G à l'extrémité Ouest (côté Nord) du porche. Ces blocs en G doivent être heurtés très violemment par le Camion car l'étai en béton armé qui supportait le un d'eux a été cassé et renversé.

B ref
B ref
et
Mutilation

Violement par le Camion car l'étai en béton armé qui supportait le un d'eux a été cassé et renversé

Avant d'agir officiellement auprès des

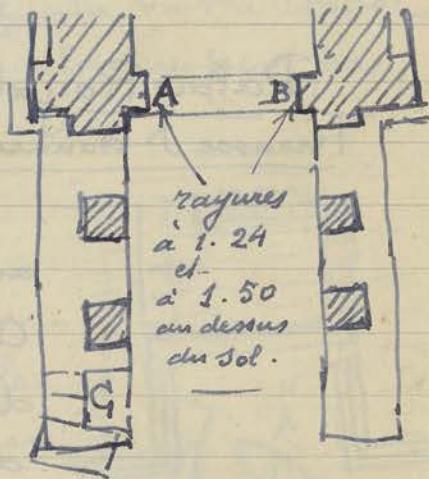

N ← → S

massa
Non


155

autorités locales j'envoie une lettre de protestation à l'entrepreneur propriétaire du Camion pour l'aviser des peines qu'il encourt par ses dégradations de monuments et lui interdire le passage de son Camion à cet endroit.

Bakhri. Ayant terminé la

repose des pierres de l'édicule

B du 5^{me} gradin de la pyramide




On commence à enlever les assises supérieures de l'édicule A (en rouge) dont le toit déchaussé pourra être laissé en place le mouvement de déplacement des blocs et l'ouverture des joints étant surtout sensible dans les parties hautes.

On a pu remettre en place sur le sommet de l'édicule B un fragment du Kalasa terminal mais il faudra reconstituer toute la partie manquante en béton pour que la silhouette soit complète.

Le dessinateur a l'essai que j'ai aménagé pour lui faire prendre un relevé (à titre d'exercice) de la plateforme supérieure s'en tire de façon déplorable, je suis obligé de faire moi-même la plus grande partie de ce relevé. Il ne comprend pas et n'ose pas lire un plan : c'est un travail nouveau pour lui.

Vendredi 21 Janvier.

Baphnuon. Pendant que l'on continue à construire le soutènement en grattis de bâtarde pour soutenir les murs de soussements à l'Est du perron Nord (en rouge ci-contre) je fais enlever les feuilles de palmier qui recouvraient le sommet des parties hautes de l'angle Nord Est des derniers.

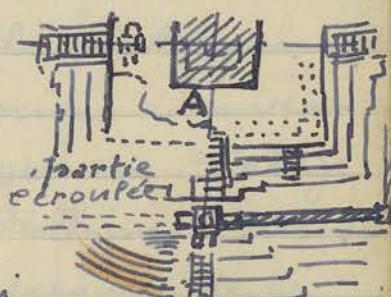

Bap

MP
XVII

en vue de protéger le talus de sable à cet endroit contre l'action des pluies. Je m'aperçois que ces talus ont commencé à se raréfier et qui à la prochaine saison des pluies le sable recommencera à glisser vers les parties basses, menaçant ainsi la stabilité des ouvrages encore en place sur l'étage supérieur (A sur le croquis au bas de la page précédente)

Il y aura donc lieu d'apporter à cet endroit les mêmes consolidations par un mur de soutien en latérite que dans le bas.

Bakhain - On a redressé la statue de divinité masculine qui avait été trouvée à l'intérieur de l'édifice bibliothèque, puisque ce terme impropre est devenu courant) Nord au bas de la pyramide devant la façade Est; La dalle suanadroni a été légèrement soulevée (faute de bâton) sur une assise de latérite et le tenu à la susdite statue placé au centre; les divers morceaux de la statue ont été réajustés avec fer et ciment suivant la méthode habituelle. (Voir p. 144 bas de la page)

Il y a lieu d'attirer l'attention sur ce fait important: Cette statue n'est pas *in situ*, à sa place d'autrefois, puisque elle est du style du Bayon et non du style du IX^e siècle. Comment se trouve-t-elle à cet endroit? donation faite dans la suite? C'est l'inverse des 2 statues dans les bibliothèques centrales de Bantay Kdei qui, elles, sont d'un style antérieur au monument.

Samedi 22 Janvier.

Bantay Srei - Une expédition étant organisée pour ce temple

je me joins au Carteige : je rencontre le Couli qui avait demandé à reprendre son service de gardiennage (p. 150 au bas) au village de Klima (à 6 kil. de B. Srey) Village qui avait été évacué et qui vient d'être résoccupé. Le Couli reclame une avance de 50^{fr} pour pouvoir acheter du riz. il doit reprendre son service le lendemain, l'avance lui ayant été accordée.

Le monument est envahi par les herbes mais se comporte normalement.

Lundi 24 Janvier.

Olinkor Vat.
Galerie Sud (Ouest)

La remise des pierres de voutes est arrivée au droit du 25^{me} pilier (en venant de l'Ouest). Si cet endroit le briques entre les 2 assises du haut qui devraient être jointives est toujours de 0.40 en moyenne. (p. 140 au bas) cet écartement est bloqué en béton armé avec étaiers et 2 fers de 12^{m/m}. Il reste environ 6["] à franchir pour combler le vide actuel de la Voute et rendre à la galerie son aspect d'autan.

Poste de garde - Depuis deux jours je fais ma visite sur Olinkor Thom les chantiers d'Olinkor Thom sans m'arrêter à la porte Sud pour prendre un garde armé avec moi, situation dont je crois pouvoir me passer. sans danger.

Baphuon On continue à monter le soutènement en gradins de latérite pour arriver au niveau du soubassement moulué en grès du 3^e étage que l'on pourra peut-être partiellement reconstruire. L'aspect de la brèche creusée de ce temple qui avant tout travail de consolidation avec ses couloirs de sable avait un aspect de paysa-

B.O.P.

ge de montagne alpestre prend maintenant une apparence de bastion de château fort féodal : deux aspects aussi peu khmers que possible !

Mardi 25 Janvier.

Conservation

(Phéah Thomâ)

Dépot
Poteries
R.P.

Passe la matinée avec Tössen et Krusch à classer les poteries et débris, tessons divers ramenés d'Ainkor Thom (p. 121-15) ; les poteries les plus intéressantes, les plus caractéristiques sont exposées dans le petit cabinet au Nord de l'emplacement de l'Ancien Bureau, sur les étagères en bois qui viennent d'être confectionnées. Les débris cassés, très nombreux, sont également rangés au même endroit. Certains étant susceptibles de pouvoir être recollés pour une reconstitution plus ou moins complète.

Le reste est mis dans une caisse.

Palais Royal

Terrasse d'honneur

Dans la reprise des

murets en parements

décorés de frises de hamsas

au Sud de la partie

Centrale Surelevée de la

Terrasse d'honneur Je note

une moulure de socle en A-B

à demi enterrée dans le dallage

La Coupe A-B à cet endroit du mur rend compte de l'assemblage bizarre des

slices composant ce parement : de

bas en haut : une dalle

de dallage A .



Un socle mouluré B

Une base sculptée de

hamsas G . Le tout sur

1^{er} 00 de hauteur . D'une façon générale

Tout la partie haute de la frise de hamsas a

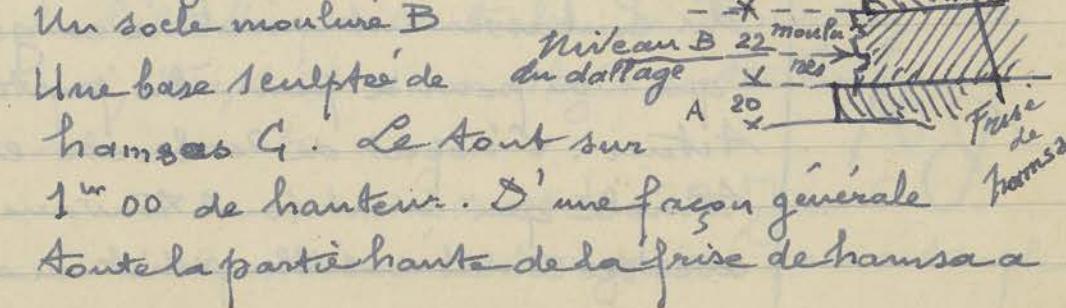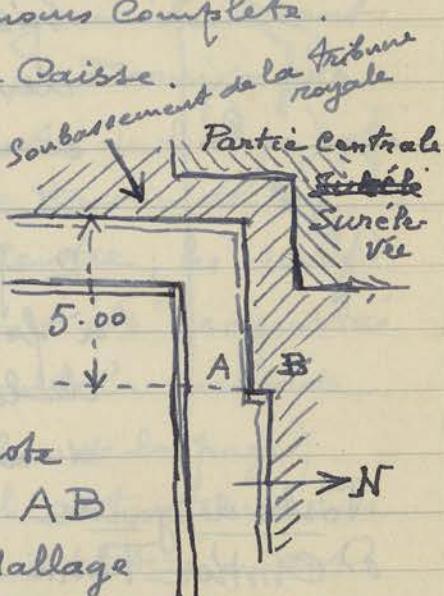

P. R


disparu. Il semble donc qu'il y a un moment, postérieur à la construction de cette partie centrale de la terrasse. Se d'honneur, on ait voulu diminuer la hauteur du niveau, et abaser la partie surélevée à un niveau plus bas.

Mercredi 26 Janvier.

Information

Le matin visite avec S.E. le Gouverneur de Siem reap et l'Ingenieur M^r Brunet de l'emplacement projeté pour construire le bâtiment de l'Information au Nord Ouest du marché de la ville et immédiatement au Sud des Communs du Vat Krapum Rot.

Bâtiment - Edifice Nord (bibliothèque) à la base Est de la pyramide; avant de quitter cet endroit après redressement de la statue à l'intérieur (p. 156) je remarque que l'angle extérieur nord Ouest de ce bâtiment par suite de cassures des assises inférieures a des pierres en porte à faux inquiétant (en rouge).



Je ferai placer un potelet en béton pour supprimer ce porte à faux et en même temps je ferai retablir verticale la colonnette de la porte Ouest (côté nord). A ci-dessus cassée vers le milieu et qui a pris une inclinaison dangereuse.

Jeudi 27 Janvier

Antor Vat - En déterrant des morceaux sculptés recherchés cours du 1^{er} étage pour reconstituer le fronton supérieur Est de la Bibliothèque Sud de la Cour du 2nd étage d'Antor Vat on trouve une petite poterie émaillée Song craquelée de 0.060 de hauteur. mise sous le n° I. 376.

CA 376
DP

Porte de la Victoire - Suite à p. 146 - 147 - Un nouveau morceau du tympan décoré du fronton de la façade Ouest ayant été nécessairement retrouvé par les coulis, morceau très abîmé, peu visible mais qui

P. H

un l'intérêt que présente la reconstitution de ce tympan, unique dans toute l'architecture d'Angkor (comme je l'ai expliqué pages précédues) mérite de compléter cet ensemble, il va falloir entailler de nouveau le Cement pour l'introduire à sa place. Le Chef de Chantier Suor préconise le déplacement de toutes les pierres brutes déjà en place de ce fronton afin de remettre ce troisième fragment.

Il s'avère qu'une des têtes remises sur l'Indra de l'angle Sud-Ouest de la Porte n'est pas *in situ*; on a retrouvé la vraie tête qui va remplacer celle malencontreusement réajustée à cet endroit et dont le emplacement se retrouve bien au dessus : c'est en effet celle d'un des devadas porteurs de guirlande au sud du masque central.

A mené avec moi dans cette visite de Chantier madame Fauchon femme du Directeur du Service Géographique de Dalat.

Vendredi 28 Janvier.

Visite - Le général Des Essarts Commandant militaire au Cambodge, arrive le matin à Siemreap, en est reparti l'après-midi même. D'une visite des monuments Khmers : le Général, à l'aperitif qui fut offert en son honneur, en quelques mots très cordiaux me prouve qu'il a des notions d'archéologie ayant séjourné en service en Palestine et en Syrie. Il s'intéresse à ces arts anciens, me cite les noms de Tell Umar, Tell Asmar, Tell Harri et de la ville de Mari qu'il a visités : il espère venir s'initier d'ici quelques temps aux temples Khmers. (je crois que l'Ecole Française pourrait lui offrir un Guide Glaize) Ce sera donc

Visite avec le plus grand plaisir que je lui ferai les honneurs de mes Vieux Temples : mais Soprishi ! il me faudra postasser les Comptes rendus archéologiques des travaux récents du proche Orient et des fouilles de André Parrot, pour pouvoir lui donner la réplique. (R.A.A. Tome VIII - n° IV)

Samedi 29 Janvier

Jour férié pour le Chant Chnam Annamite et Chinois.

Visite.

Arrivé le matin de m^e le Docteur Binet Doyen de la Faculté de Médecine, de m^e Daleas Recteur de l'université de médecine de Saigon et du Professeur Lemaire : ce dernier faisait partie de la Visite Officielle en novembre 1919 avec le Haussaïne T. Levy et G. Duhamel. m^e Le Rolland Conseiller adjoint les accompagnait dans la matinée à Angkor Vat et l'après-midi je leur fais visiter le Bayon et Angkor Thom. A cette visite prenaient part m^{me} et m^e Goldmann, professeur de droit à Saigon, Madame Fortuné et mademoiselle Jambert, ainsi que le Commissaire de la Marine Legge.

Le soir il y eut danses à Angkor Vat.

Dimanche 30 Janvier

Visite

Le matin m^e Le Rolland conduit les personnes sus désignées au Phnom Krom et au Pêcherus sur le Grand Lac.

Après midi, j'obtins des autorités militaires non l'autorisation mais la possibilité d'une escorte suffisante pour faire Bantay Suvre et Ta Prohm : ces deux temples présentant deux aspects totalement différents d'architecture khmère du XII^e siècle. On a ébranché les bougainvilliers de Bantay Suvre pour les rendre moins envahissants

Lundi 31 Janvier

Jour férié pour le Jour de l'an (pourquoi après tout ne pas parler français purement et simplement) amanite et Chinois.

Les Coulis Travaillent comme d'ordinaire.

Ainkor Vat — Toute la partie
Chaussée Ouest. — en rouge ci-contre

de l'avancée centrale

de cette chaussée (Nord)

a été déposée. Les pierres

ayant basculé sur un

affaissement important du

sous sol. On fait un remblai

(voir p. 152
au bas)
et p. 153 au haut)

de sable et pieraille concassée pour relever

le niveau des dalles qui on vient d'enlever
avant de replacer les dites dalles.

Batkhen

En déplaçant la colonnette nord de la

porte Ouest de l'édifice bibliothèque devant

la face Est de la pyramide (voir p. 159)

Tout le morceau supérieur s'effrite et

se délite, se ~~dis~~ séparant en multiples

fragments. A cause de la mauvaise

qualité du grès d'Ainkor il est souvent
très dangereux de toucher à des parties
de maçonnerie restées *in situ*, qui tiennent
encore debout, par habitude pourrait-on dire,
mais qui dès qu'on veut les déplacer se pulvérissent
ou s'émiettent.

Il faudra ici remplacer le haut de la colonne
qui s'est effritée par une colonnette en béton.

Mardi 1 Février

Vols.

Dé nouveaux vols au Dépot d'Ainkor Thion ne
sont signalés, portes ou fenêtres arrachées et
fracturées; des planches des rails Decauville

volt

163

ont été enlevés pendant la nuit. L'urgence de ne rien laisser à Arikor Thom et de tout ramener à la Pteah Thma de Siemreap se fait de plus en plus sentir. Aussi je demande le Camion du Conseiller régional pour effectuer ce transport.


Arikor Vat. ~ On commence à poser les poutrelles en béton Galerie Sud (Est) armé de cinq nouvelles tringles du plafond en caisson, à l'entroit où les assises de l'ouïe viennent d'être remplacées, après bouchage des joints et fissures au béton pour rendre la route imperméable, autant que possible.

Mercredi 2 février.

Déménagement. Avec l'aide du Camion prêté aimablement par le Conseiller Régional en Commerce le Transport des rails Decauville du dépôt du Bayon à celui de la Pteah Thma - voir haut de cette page. Malheureusement ce transfert commence le matin est interrompu le Camion prêté ayant été réutilisé le soir pour transport de troupe. Averti trop tard de ce contretemps, car je croyais qu'une série de voyages dans la journée pourrait opérer le démenagement complet et tout le matériel à transporter avait été laissé dehors, j'edsis donner des ordres pour le faire rentrer au dépôt de Arikor Thom pour la nuit.

Arikor Vat Un travail analogue à celui de la

Chaussée Ouest, en cours du côté nord de la chaussée occidentale est commencé à l'avancée Sud : les dalles de gres sont déposées sur une couche de 1.75 pour refaire et remblayer le sous-sol en les redressant de niveau.

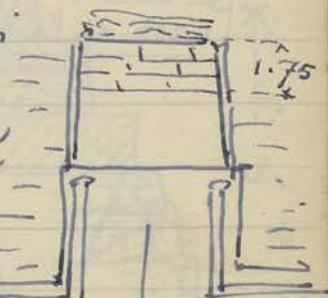

16H

Jeudi 3 Février


Vol à Anton Thom - Le nombre de planches volées, non plus dans le dépôt des sculptures, mais au Reg de Chaussé de la maison qu'habitait Commaille, chambre moustiquaire, est de 24 planches, débitées par les 2 scieurs en banches pour ce travail près du Bois.

18 planches en yao de 5" de longueur
6 — en tiras de 3.80 —

Le Vol s'est effectué par une des fenêtres dont les volets ont été fracturés.

Battement. Sur la plateforme

supérieure je fais aligner les blocs sculptés et moulurés laissés en attente à l'Est



à l'emplacement des façades dioparmes, puisque dernières jardis par les bongos, en rouge ci-dessus. De loin cela simulerait un éboulis de pierres tombées qui redonnerait une apparence plus exacte des anciennes constructions de ces édifices, actuellement trouqués et limités aux fragments de façade Ouest.

On redresse et renvoie les joints des assises supérieures, déplacés et inclinés de la terrasse supérieure.


Porte de la Victoire On a remplacé les trois morceaux retrouvés du tympan. L'unique tympan existant des Portes d'Anton Thom, côté Ouest et on remet en place les pierres qui auraient été déplacées pour exécuter ce travail dans de meilleures conditions (p. 160 en haut).

On rebouche au béton les brûlures qui séparent les pierres restituées dans l'ensemble.

Vendredi 4 Février.


165

Antorvat On a achève' du Côté Sud
Galerie Sud (O) la renverse en place de la
3^{me} assise de la Voûte.



Cette troisième assise
du Côté nord manque encore sur environ
5 m de longueur pour qu'on puisse venir
remettre en place la 4^{me} formant couverte
de fermeture de la Voûte.

Dans la Cour intérieur
à proximité de l'angle
Sud Est de la bibliothèque

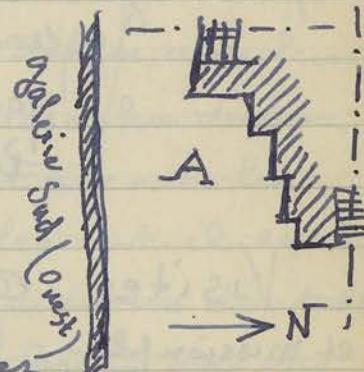

Sud des Coulis pratiquent
des excavations dans le sol
en A ci-dessous pour déterrer
des blocs sculptés plus ou moins enfouis pro-
fondément et provenant des parties hautes
érouvées de la susdite bibliothèque.

Dans ce travail on met au jour un certain
nombre de petites fioles d'une digaine
de Centimètres de hauteur et contenant
des débris d'ossements incinérés. La
couverte est craquelée, parfois avec un décor
chinois bleu. mis sous le N° Poterie 376
(Voir p. 159 en bas)



Chaussée Ouest - Perron central Nord Le profil de la
partie supérieure



du dit perron montre
en A une dalle de latérite
qui interrompt brusquement
les 3 marches supérieures en
grès. Je fais donc dans le rema-
niement actuel de ce perron inter-
vertir l'ordre des 2 dalles A et B cette

A
N
O
Chaussée

CA 376
DP

1

dernière reprendant son rang ancien.


Prah Pithu On aménage une rigole d'évacuation des eaux en prévision de la saison des pluies entre le temple X et la darse au Sud pour éviter des stagnations d'eau en A où l'on vient de creuser ou plutôt décapé légèrement le sol pour avoir de la terre de remblai. Cette rigole traverse les blocs de pierres accumulés le long du bord de la darse lors du dégagement de l'édifice X

Samedi 5 Février

Visites Arrivée sur le terrain à 10 heures de messieurs et missions pho- Coloma, Barbeau, Beaudoin architecte topographiques en chef des Palais nationaux de France, Culman, Guy Poëz, Colonel Laffon, Consuls d'Amérique et d'Angleterre venus spécialement sur un Avion Bristol, dont les principaux me sont recommandés, et M^e Elisophon Chef photographe de Life. Le but de la mission photographique de ce dernier est de recueillir une série de vues des temples d'Angkor pour faire paraître en diverses Revues d'Amérique.

Le retentissement pour le tourisme qu'auront ces publications expliquant la présence de MM Barbeau, Coloma, Guy Poëz qui d'ailleurs me confient M^e Elisophon pour l'accompagner, le diriger dans les monuments et l'aider dans ses prises de vue par ma connaissance des sites.

L'arrivée devant Angkor Vat provoque une légère déception chez M^e Elisophon par une petite erreur du programme préparé

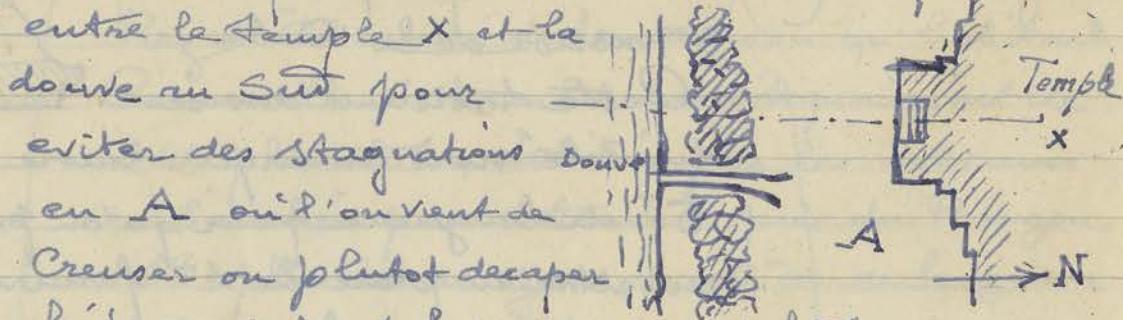

Creuser ou plutôt décapé
légèrement le sol pour avoir de la terre de remblai.

Cette rigole traverse les blocs de pierres accumulés le long du bord de la darse

lors du dégagement de l'édifice X

Samedi 5 Février

Visites Arrivée sur le terrain à 10 heures de messieurs et missions pho- Coloma, Barbeau, Beaudoin architecte topographiques en chef des Palais nationaux de France, Culman, Guy Poëz, Colonel Laffon, Consuls d'Amérique et d'Angleterre venus spécialement sur un Avion Bristol, dont les principaux me sont recommandés, et M^e Elisophon Chef photographe de Life. Le but de la mission photographique de ce dernier est de recueillir une série de vues des temples d'Angkor pour faire paraître en diverses Revues d'Amérique.

Le retentissement pour le tourisme qu'auront ces publications expliquant la présence de MM Barbeau, Coloma, Guy Poëz qui d'ailleurs me confient M^e Elisophon pour l'accompagner, le diriger dans les monuments et l'aider dans ses prises de vue par ma connaissance des sites.

L'arrivée devant Angkor Vat provoque une légère déception chez M^e Elisophon par une petite erreur du programme préparé

167

d'avance. Il penne sorti de l'avion ou amène M^e Elisophon sous le Banyan devant la darse d'Ankor Vat où des bouges attawaient pour chanter des prières des femmes empillassaint les bols de riz et une troupe de leng tret se disposait à danser.

Je n'insiste sur le caractère anormal de cette exécution de bouges. J'allai dire mis au sang d'un numéros d'attraction au même titre que les danseuses du leng tret. — En tout cas dès que les bouges se mirent à chanter les prières, les femmes à déplier avec leur riz et la troupe leng tret, M^e Elisophon déclara que le but était manqué ; il n'avait pas avec lui ses appareils de prises de vues, et les eut-il eus à sa disposition, M^e Elisophon qui est un véritable artiste dans l'art de la photo ne prend pas des vues ainsi au hasard, sans précaution, des emplacements et des éclairages, etc. On rentra donc immédiatement à l'Hotel préparer un programme pour les prises de vues ; M^e Elisophon Veut Voir, Visite et se rendre Compte avant d'employer la Camera, ce qu'il veulent faire qu'a bon escient.

Donc l'après-midi fut employée à une visite générale d'Ankor Vat et d'Ankor Thom pendant laquelle M^e Elie, nota tous emplacements et éclairages. Les sur les Danseuses du Roi vennent spécialement à cette occasion donner une séance sur le parvis d'Ankor Vat

Dimanche 6 Février

Visite Matin - Tournée dans Tat Som, Phnom Khan, Pre Rup puis Phnom Krom pour prendre contact avec l'ambiance et les temples khmers.

Après-midi - La troupe royale des danseuses vient à 16 heures évoluer devant l'entrée du temple


d'Ankor Vat et M^e Elisophon commence ses prises de vues - Lui seul indiquant gestes et épisodes vus à la veille et variant les emplacements

Consultation avec M^{me} Tchif

Pour associer l'architecture et les danses. On avait éliminé Poule et Curieux pour éviter la cohue qui aurait certainement gêné l'opérateur.

Pendant cette prise de vue j'ai profité de la présence de M^{me} Vernisse Tchif des T.T pour lui montrer les chantiers en cours : il m'a questionné sur la façon dont était construite la galerie tournante du 1^{er} étage et surtout sur les fondations des murs, piliers et dallage de cette galerie. Le mouvement de l'assènement, comme cela l'a été maintes fois établi et vérifié, provenant de ce que les piliers extérieurs A reposent à la base sur un mur solide (soubassement extérieur) le mur B reposant également sur un mur solide (soubassement sur la cour intérieure, le remblai ayant causé le dit assènement). M^{me} Vernisse me suggère de faire sous ces piliers intermédiaires des injections de ciment destinées à venir renforcer le sous-sol en G. Il doit me envoier des renseignements précis à ce sujet.

Lundi 7 Février.

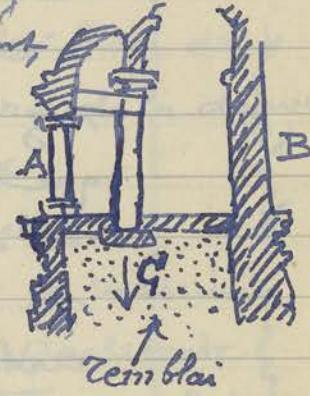

Prises de vue des danses dans le Bayon par M^{me} Elisophone.

Conférence avec M^{me} Colonna Directeur de l'Office du tourisme sur diverses questions touristiques.

On visite l'atelier d'artisanat créé par M^{me} le Gouverneur de Siem reap, d'après mes suggestions : travail de peaux décomposées (genre Nan Sbek) sur des motifs de bas reliefs d'Angkor et de Bantay Chum. L'interprétation par les artistes de ces bas reliefs me paraît très satisfaisante.

Artisanat local

artisans
locat

169

Toute à Cire perdue de statuette, lions, garnitures etc d'après des modèles pris dans les Temples Khmers; il est question de créer un atelier, situé dans le village, où les touristes pourraient voir les artisans au travail, ce qui les inciterait à l'achat de ces objets d'art. C'est un fait connu qu'un objet qu'on voit fabriqué sous ses yeux prend pour l'acheteur beaucoup plus d'intérêt que le même objet exposé dans une vitrine de magasin.

Mais M^e le Directeur du Tourisme me demande de distraire une certaine somme sur les crédits qui me sont alloués pour les Travaux touristiques pour, non pas Subventionnez, mais tout au moins pourvoir une aide pecuniaire à ces travaux.

M^e Coloma m'accompagne au dépôt de la Conservation pour choisir quelques pièces de sculptures qu'il voudrait prendre en dépôt à l'Office du Tourisme CA 3726 à Saigon; il fait choix d'un bouddha assis (n° 3726), CA 4545 d'une tête (n° 4545) et d'une stèle de Vishnu. (3990) que je vais photographier pour adresser à M^e Tan Lai en demandant autorisation de sortir ces sculptures.
CA 3990

Service
d'Information

D'un autre côté M^e Sicurani Directeur de l'Information à Phnom Penh me demande de lui faire prendre des vues de Cérémonies, fêtes ou Visites de personnalités officielles pour exposer à son Office. Il me demande également de Voulou lui bien transmettre tous les mois un résumé succinct de mes rapports de travaux en cours avec une ou deux photos accompagnant le dit Rapport. Enfin pour un exposé des travaux de l'E.F.E.O à paraître dans une revue que publiera son office, il voudrait un certain nombre des photos prises au cours de l'année 1948 et montrant au public une idée générale des dits

170

sent me
JPM 1930

J

Travaux. J'accepte, sous réserve de la décision du Directeur que je vais consulter à ce sujet mais j'objecte la difficulté de trouver des plaques et du papier, et le manque de produits. Il me promet de me faire parvenir plaques et papier d'avance, ce qui me permettra de sauvegarder intact mes réserves destinées aux travaux de l'Ecole.

171 mardi 8 Février

mission Départ à 10 heures de l'avion Bristol qui à Visites examinent les personnages énumérés


VISI

p. 166-5 sont MM^{es} Guy Toreé et le Chef Photographe Elisophon - ce dernier restant pour prendre à locir ses photos dans les temples. Il vient me rendre visite au Bureau de la Conservation pour me demander des renseignements à ce sujet: le matin il prend encore quelques sujets, isolément, du Corps de Ballet dans l'architecture du Preah Crucifix de Dikor Vat.

Boathen - On commence à déposer les assises des étages de l'édicule à l'Ouest de la tour d'angle N-E en A ci-contre de la 5^{me}

Boath

plateforme de la pyra. nide pour la remise en état de ce monument par anastylose.

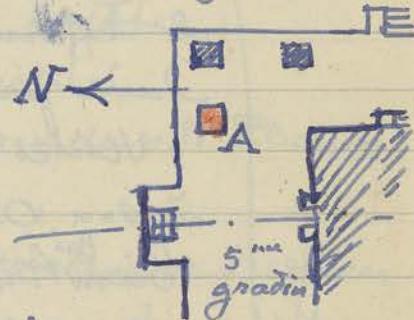


mercredi 9 Février

(Dikor Vat) La fermeture de la Voûte par le Galerie Sud (Ouest) replacement des assises déposées va bientôt être terminée. On 25^{me} pilier de la galerie en venant de l'Ouest le briques entre les 2 assises supérieures sous la dalle monolithique qui forme couvercle

A Vat
gal. S (O)
gal. S

171

n'est plus que de 38% au lieu de 0. 40 (voir p. 140 en bas) Actuellement la remise en place de la dite Voute se décompose comme ci-dessous (voir dessin 23 du mois de Juin 1948)



Parties de Voutes n'ayant pas été touchées: /////////////// à l'Ouest 7 travées = 16.47
à l'Est 4 travées = 9.27

Parties actuellement remises en place: ////////////

Côté Ouest: 18 travées = 43.20

Côté Est: 6 travées = 14.40

Il ne reste plus qu'une travée à placer pour terminer ce travail qui devra parachever un rejointoiement au point

gal. S (E) Du côté Est on continue la remise en place des assises plus ou moins morcelées, effritées de la partie en reconstruction. Le début de la reprise de la Voute part de la sixième travée, en venant de l'Ouest, mais à cet endroit le mur des bas-reliefs ne s'est pas écroulé et les parties hautes n'ont commencé à se désagréger et tomber qu'après le 9^{me} pilier / en venant de l'Ouest (Ouest) soit environ 22 m 00 du début ouest de la galerie. Encore au début 4 assises de basse étaient restées en place ($h = 1.90$), je commence à prendre une série de vues des bas-reliefs réparés, qui vers 13 heures s'éclairent au plein soleil: Ces photos comparées avec celles prises dans le Mem. Archéol. II - Angkor Val. Fasc. III galeries des Bas-reliefs pourront fournir une bonne documentation sur ces scènes eschatologiques dont l'intérêt iconographique, vu la rareté de scènes de ce genre représentées dans les bas-reliefs est

Ares grande

Jeudi 10 Février

Prah Pithu... — On transporte à pied d'œuvre les 4 buse en Ciment de 1^m 00 de longueur sur 0.40 de diamètre inter? (diamètre extérieur = 0.54)

(T) — Voir p. 126 — Buses fournies par les TP
Au lieu de sable on ~~fait~~ blocage en pierraillles comme prévu je fais placer dans la rigole aménagée pour poser les buses des blocs de latérite

sur une hauteur de 0.20 - la buse placee il restera un sommet de la dite 0. 26 de hauteur pour damer un remblai qui pourra être renforcé avec des pierres concassées

P. V — Porte de la Victoire — On remet en place trois fragments sculptés récemment retrouvés appartenant à des têtes de personnages de l'angle Sud-Ouest de cette porte l'un à l'Indra sur l'éléphant et les autres complétant des bustes des grands personnages au haut du dit angle.

Ouïgor Vat — On a coulé 5 nouvelles poutrelles du Galerie Sud (E) Jelaput et découvre les 5 précédentes déjà coulées depuis 19 jours (p. 163 en haut)
Ce qui amène à un total de 37 poutrelles correspondant à 36 travées de caissons

Vendredi 11 février

A. S. E
gal. gal.
La paye des Coulis qui suivant la norme habituelle aurait dû avoir lieu le dimanche précédent 6 Février et aurait dû être versée faute de crédits, est encore entravée du fait qu'à cette date aucun man-

dat m'a encore été reçue d'Hanoï. On a travaillé une semaine de plus, et comme il faudra néanmoins faire des avances dimanche prochain au gratté tous les fonds de caisses, de boîtes où s'égale la même monnaie. Je fais sur mon fonds de réserve en Vidian tout ce qui me reste en dépôt dans le Coffre une avance de 9000^{Fr} à l'Ecole et on pourra disposer dimanche d'une somme globale de 13 000^{Fr}

Ce qui est déplorable c'est que ces retards dans la réception des mandats ^{m'obligeant} ~~malheureusement~~, pour ne pas trop accumuler les sommes à payer, a interrompu à partir de lundi les chantiers. Le préjudice apporté aux travailleurs en cours par une interruption aussi brusque, que je n'ai pu préparer ni prévoir m'attendant toujours à recevoir les mandats retardataires, baptisé - oironier - mandats d'avance.

BatKhen - On a terminé la dépose de toutes les assises de l'édicule en cours d'anastyllose a l'Est de l'escalier Nord (A-en rouge - sur le schéma p. 170)

Le dallage s'étant effaissé très irrégulièrement à cet endroit avant de venir remplacer l'assise de litage ou l'assise inférieure qui supportera tout le reste de l'édicule on fait un renforcement en béton pour rendre égal ce niveau de base (en bleu ci-dessous).

Samedi 12 Février.

Anton Val. - C'est jour de nettoyage et les coulis prépos Galerie Ouest(s) se sont à ce travail commencé le lessivage des pilier et bas du mur des bas-reliefs, en respectant, par prudence, la surface des bas-reliefs, dans la galerie Ouest Côte Sud. Des traces blanches laissées par les mouleurs veulent prendre des

A. V.
Gal. Ouest
(Sud)

174

moulages pour l'Exposition Coloniale de Paris
résistent au lavage

Palais Royal - Le dessinateur continue un peu pensif.
Terrasse d'honneur mené le travail de relevé du milieu de
cette terrasse que je lui ai donné à faire.


Il ne sait pas lire un dessin, ne comprend
pas la différence entre un plan et une coupe.

Je dois dire à sa charge que le manque
de netteté et d'homogénéité des magouilleries
de cette terrasse centrale complique le travail
de relevé: j'indique moi-même les croquis
à prendre et à coter pour reporter sur la
planche à dessin. Il fait preuve de bonne
volonté et j'aime à croire qu'il finira par
se familiariser à la longue avec ce genre de
travail.

On a relevé et
remis en place les
morceaux de mosaïque
cassés formant
balustrade E F et
CD ci-contre.

2 petits lions sur
socles retrouvés à
l'extrémité Nord de
du massif central
surélévé ont été
ramenés en A et B
près de l'escalier Est
de ce massif central.

Ils complètent la
présentation d'ensemble de cette terrasse
centrale, faite, comme je l'ai déjà noté,
d'éléments disparates de tous styles et

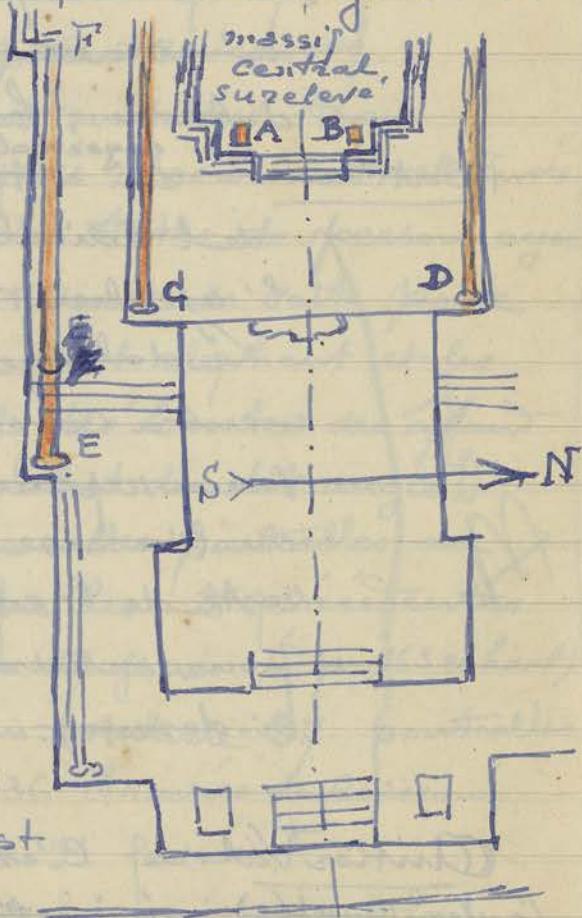

P.R

de toutes époques. C'est ainsi que l'about de naga G est de l'époque Bagan et celui du naga symétrique D de l'époque précédente.

175

Dimanche 13 Février

Paye
des
Coulis

Paye de 2 semaines de Coulis et Caporans (alors qu'en réalité il leur est dû 4 semaines) avec un petit reliquat de la Caisse de l'Ecole et une avance de 9000^{frs} prise sur mon argent personnel.

On attendra une réception de mandats d'Hanoï pour rouvrir les chantiers.

Lundi 14 Février

Arrêt
des
chantiers

Chantiers arrêtés. - Le mandat d'avance pour Janvier arrive enfin l'après-midi de ce jour 14 Février. Je peu rentrer dans mes dépenses et liquider quelques notes en retard.

B.P.Y

Le soir après dîner j'emmené M^e Elisophon, M^e Rana et deux de ses amis Contempler (sous escorte armée) le Bagan au Clandre lune.


Mardi 15 Février.

Fait prévenir les Coulis pour reprise du travail le lendemain.

Mercredi 16 Février

Prat Pitme

Les pierres de latérite sont terminées comme mise en place, à l'endroit où seront posées les buses. On prévoit de chaque côté au débouché des buses un amortissement en latérite pour recevoir une partie maçonnée à la sortie des buses. Ca à l'heure actuelle le dessin est complet dans la coupe de chaque côté du passage remblayé. Le remblai sera surélévé à son niveau définitif après la pose des

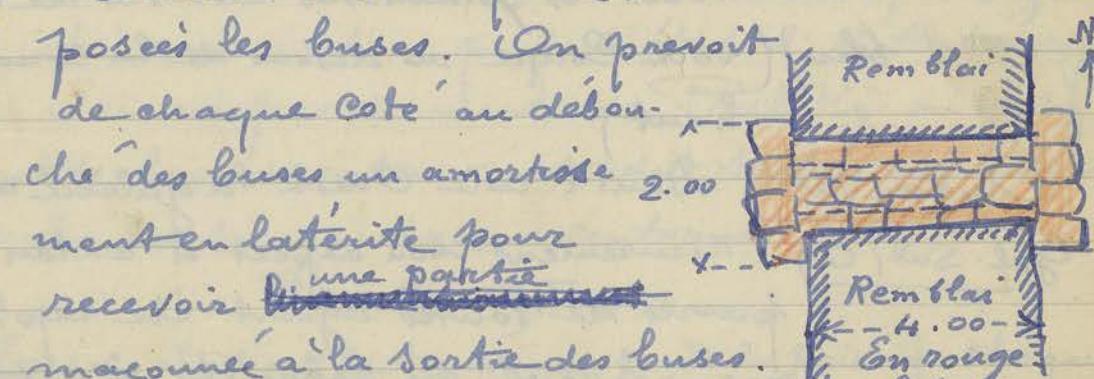

Prat
P.M.

chent est Complet dans la coupe de chaque côté du passage remblayé. Le remblai sera surélévé à son niveau définitif après la pose des

176

Buses. (Voir croquis p. 172 en haut)

Baphouon - On a terminé le mur de revêtement en

laterite, qui doit servir de base et de fondation à la fois aux assises de grès qui pourront être retrouvées du sous-bassement du 3^{me} Etage à l'Est du perron nord (Schema au bas de la p. 155 et Croquis en haut p. 129 et p. 108)

Batkhén. - On est en train de remettre en place la

Batk

8^{me} assise de l'édicule en reconstruction à l'Est du perron nord (5^{me} gradin) A sur le croquis p. 170. On a pu retrouver trois pierres moulurées d'angle qui manquaient avant la dépose de cet édicule et qui proviennent des étages supérieurs.

Jundi 17 Février

Ancor Vat En prévision des prochaines poutrelles de Gal. Sud (E) plafond à placer ou contenue, en avançant vers l'Est, de placer tous les 51 x 51 x 51 cm (alternant avec les emplacements des abouts des poutrelles sur la corniche, en rouge) de petites consoles en ciment pour remplir le vide sous les premières assises de la voûte (en bleu) (voir Coupe au dessus de la corniche p. 144 en haut)



Ancor Vat Dans l'aile Ouest la galerie a repris inté-

Gal. Sud (O) rièrement son aspect d'autan. Toutes les pierres de voûtes ayant été remplacées exté- rièrement on rebouché l'extrados aux endroits où des éclats de pierre ou des fissures entre deux assises offrent des cavités par où l'eau de pluie pourrait s'infiltrer.

Vendredi 18 Février.

177

Batkin - Accompagné m'Elisophon à Battambang, l'oleil et
Prah Ko : Battambang retient longtemps l'attention
de ce photographe. Je vais constater les dégâts
qui n'avaient été signalés il y a déjà fort long-
temps mais que je n'avais pas encore eu l'occasion
de venir voir faire d'escorte, à la chaussée
orientale d'arrivée traversant la douve

Sur une longueur N
d'environ 14'00 et sur une largeur IB
qui peut être évaluée

au $\frac{1}{4}$ de la largeur de la chaussée IA

Tout le massif intérieur de terre qui consti-

tuant cette chaussée s'est

écroulé entraînant le corps du naga rampant qui

formait balustrade à cet endroit et le mur de soutè-

nement. Du côté Sud en A le mur de soutènement

en latérite prend un dévers inquiétant qui

risque de produire un érosion et un

ravinement analogue.

Prah Ko Si Battambang où les bouges agrandissent
le bâtiment de la façade Est de l'esplanade
côté Nord, est en parfait état d'entretien
il n'en est pas de même de Prah Ko où une
petite brousse intense interdit toute circulation
entre les six sanctuaires centraux.

Samedi 19 Février. -

Bantay Srei. - Sachant le temps que prend la prise de chaque
photo par l'excellent artiste en matière de Caméra
j'avais décidé de rester à Bantay Srei pour déjeuner.
Tous les touristes qui s'étaient agglutinés
autour de cette excursion et encombraient les Véhi-

Cules disponibles étaient préservés, seuls les militaires de l'escorte ne savaient pas qu'on ne rencontrait qu'assez tard dans l'après-midi. J'avais en effet joint Bantay Srei au programme trouvant nécessaire et indispensable pour un reportage du genre de celui de M^e Elisophon de comprendre ces 2 temples des plus intéressants et assez particuliers dans sa série de prises de vue.

Le lieutenant chef de l'escorte me dit en cours de route que ayant des ordres pour rentrer à midi et demie à Siem reap, on ne pourrait rester longtemps. Je dus parlementer assez longtemps avec lui pour qu'il consentît à rester l'après-midi. J'étais ici en mission pour accompagner, d'après ordres reçus du Gouvernement, M^e Elisophon et non en promenade d'agrément comme la bande de touristes qui gravitaient autour de nous, quelques d'ailleurs je fis comprendre le but de cette visite et qui je dois le dire se préterent fort bien à la chose et n'encombreront pas.

Bantay Srei et Bantay Sorei se présentent bien dégagé.

Dimanche 20 Février.

Page
des Coulis

Page des Coulis - Reliquat de ce qui leur était dû - Voir p. 175 en haut.

Visite

Le matin visite à Aukor Thom avec M^e Elisophon, - qui doit partir le lendemain, pour lui montrer certains temples qu'ils n'avaient pas encore vu - parmi que secondaires : Pras Pithu - Chau Say - Tom manon - Tep Pranam - Pras Palilay - Batei Chau Krong. - L'après-midi j'emmené à Aukor Wat un journaliste Américain qui m'a interviewé à l'Hotel et veut prendre une photo de moi dans les ruines.


Lundi 21 Février.

179

Prab Pithu - On a terminé la pose des 4 buses traversant la chaussée remblayée sur une assise de pierres de laterite (p. 172 et 175) On calé de chaque Côté avec des blocs de laterite tailles à la demande et jointoyés en mortier de ciment.

Batkhen La remise en place des pierres déposées de l'Édicule A en cours d'anastylose est terminée.

On a retrouvé un fragment de Kalasa terminal que le Caporal a remonté au sommet pour achever la Silhouette d'ensemble.

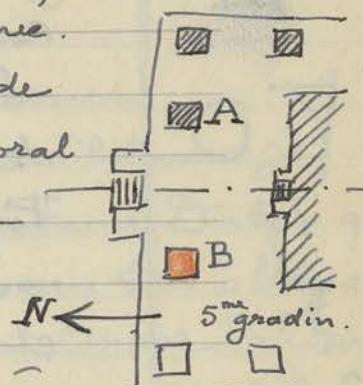

On va entreprendre le même travail d'anastylose à l'édicule symétrique à l'Ouest par rapport au pignon Nord B (en rouge) sur le schéma ci-dessus.

Le sol du dallage s'étant râillé et ayant occasionné un glissement général des mosaïques de façade, de nombreuses pierres ont été déplacées et des joints se sont ouverts assez importants par endroits.

Mardi 22 février

Citior Vat - La reconstruction de la galerie Sud Porte des Elephants Sud. (aile Ouest) étant complètement terminée je transporte cette équipe à la Porte extrême Sud (dite des Elephants) des Entrées Occidentales ; le travail en cours à cet endroit avait été interrompu par L'agisquet, quand il avait pris la direction des chantiers d'Citior Vat en Février dernier (1948) Il avait jugé qu'il fallait à cette époque concentrer tous les efforts sur la galerie Sud dont la menace de chute était inquiétante. (Voir

180

J de F. XVII - bas p. 49^{st p. 56)} le danger étant désormais
couvré je reprends le travail interrompu à l'extrême-
mité Sud des Entrées Occidentales.

Il s'agit de consolider
et redresser piliers
et architraves de
la Verandah A ci:
contre.

En rouge une partie
de fronton à relever
Piliers 1 et 2 à
remettre d'aplomb et
et $\frac{1}{2}$ fronton retrouvé dans les débris à
replacer in situ. (en bleu)


Le travail préparatoire de poser l'écha-
faudage et les potelets de soutien pour
maintenir la partie supérieure des mazon-
neries quel'on ne doit pas toucher, pendant
la consolidation et le redressement des
parties inférieures se commencera par le
transport des bois et palans utilisés à
la galerie Sud.

Reçois un télégramme de Dalet
m'avisant du décès de M^r Parmentier, les
obsèques devant avoir lieu demain à 17
heures je me dispose à prendre l'avion
qui doit gagner Phnom Penh le mercredi
matin.

Objet
de
Parmentier

mercredi 23 Février

Impossible prendre l'avion pour
aller à Phnom Penh comme presque une
panne de moteur empêchant le second
voyage qui devait avoir lieu et où on
m'avait réservé une place.

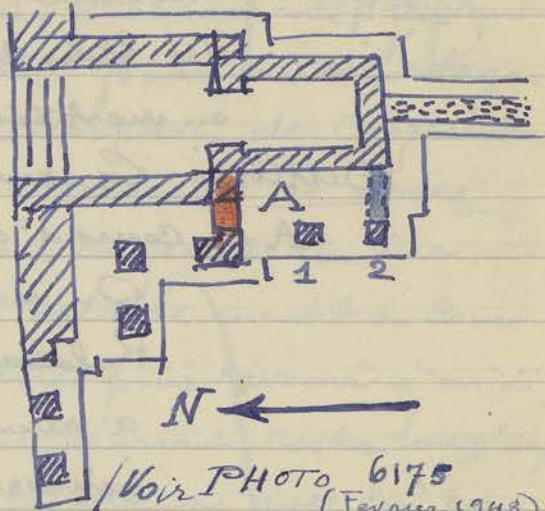

Voir PHOTO 6175
(Février 1948)

Oinkor Vat

Galerie S. (E)

181
A propos du plafond en Cement mortel

que l'on continue à reconstituer au fur et à mesure
que l'on remet en place les assises de toute à l'entrée
mité Ouest de la galerie, il n'est pas sans
intérêt de montrer que l'idée de cette reconstruc-
tion due à Lagisquet remonte assez loin.
(cf. BEFEO - 1921 - n°1 - p. 99 et BCAI
1911 - p. 239)

↑
P. S.
Gal. S.

Jundi 24 Fevrier


Visite

A la demande des autorités militaires je
consens, par égard pour le Capitaine Dubois qui
s'est montré en différentes occasions très obligeant,
d'accompagner leurs hôtes à Oinkor Zhou :
Le Général Bodet et Madame et Monsieur L'loyd
Commandant des forces aéronautiques de la Grande
Bretagne. En visitant le Bayon je reconnais
le bien-fondé de l'observation du Guide But-Sar
qui m'avait signalé sur le mur des bas-reliefs
extérieurs Sud (extrémité Est) l'envasissement
de la mousse et du lichen qui défigure complè-
tement les jangkes représentés à cet endroit.

Oinkor Vat

— Ayant remis en place toute

Chaussée Ouest. la partie hachurée ci-contre



de l'avancé Nord de la chaussée
qui avait été déposé pour
relever le niveau du dallage on entreprend
le même travail dans la partie Ouest en
rouge ci-dessus.

Porte Elep + Sud

On a retrouvé à l'extrême Ouest des
Entrées occidentales plusieurs fragments des
demi-frontons, décorés qui fermaient les demi-voutes
en verandas sur la façade ouest. Quant le
travail en cours de redressement des piliers
et consolidation des assises des 1/2 voutes sera

↑
P. Ouest
dr.
Entrées O


achevé on pourra compléter cette partie de pagode.

Vendredi 25 Février.

Pagode Les bonzes de la pagode Nord d'Ankor Vat m'ayant fait demander par soli officiel (qui m'a écrit après avoir passé par les G.P.) de démolir la fâcheuse batisse, véritable entrepot ou garage qui constitue la dite pagode, je leur donne cette autorisation avec une véritable satisfaction.

Les abords du Chef d'œuvre architectural de l'~~Ankor~~ art khmer étaient souillé par la vue de ce bâtiment. mais naturellement ils vont reconstruire une autre pagode à la place et il me faut ouvrir l'œil. Ils m'ont envoyé des plans de la pagode à reconstruire. C'est évidemment beaucoup moins laid que l'ancien bâtiment à démolir, mais il y a des corrections et améliorations à apporter aux dessins de façades pour tâcher d'obtenir un aspect de pagode. Tels que les Cambodgiens en construisaient il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire une silhouette élégante et bien proportionnée. — Je fais donc reprendre les dessins par le nouveau dessinateur, en le surveillant et le dirigeant pour obtenir un maximum de beauté.

Palais Royal On a retrouvé dans Terrasse d'honneur les débris un magnifique about de naga pentacéphale en plusieurs morceaux, la partie supérieure manque, que je fais remonter en A ci-contre sur le mur parapet Sud. Il n'est pas plus en Sita et à

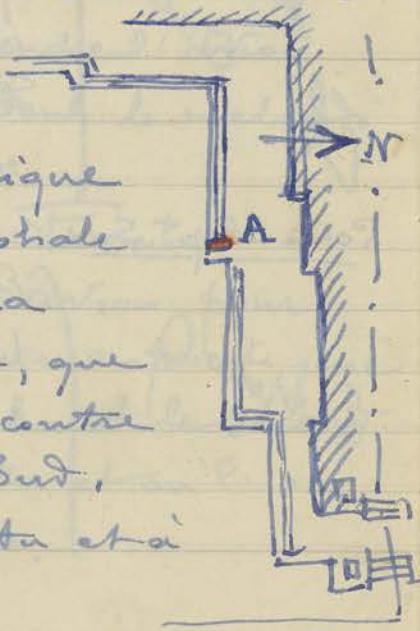

R R

P.R.

183
sa place d'origine que les autres nagas et
deungs qui on a remonté sur cette terrasse, mais
c'est un très beau morceau de sculpture et
qui contribuera à l'aspect imposant de l'ensemble
de cette terrasse centrale.

Samedi 26 Février —

Pagode Nord

d'Ainkor Vat — Je vais parlementer avec les bouzes et les
achar au sujet du projet de construction
d'un nouveau Vihara en remplacement
de l'ancien. Je leur fais part de mes obser-
vations et leur montre un plan, très légèrement
modifié de l'édifice en question. Ils acceptent
toutes mes propositions et je vais mettre à
l'étude un projet de pagode qui tâchera
d'avoir une silhouette aussi élégante que
possible, étant admis que le beau décor en
bois sculpté de jadis sera en béton moulé.

Cela va m'amuser de m'occuper de cette
édifice et d'en diriger la construction. —

Ainkor Vat

ayant remarqué que la base
Chaussée Ouest - du mur Ouest (avancé du
perron Sud) qui avait été jadis
moussé en béton ne reposait
plus sur rien, les terres
ayant dû être excavé, un vide en
A s'était produit, je fais garnir de
pierraille et béton ce vide. —



Quand les eaux sont plus hautes on
ne l'en aperçoit pas ; il faut donc
profiter de cette époque de sécheresse
pour faire ce travail de consolidation
par le dessous.

Lundi 28 Février

Ainkor Vat
Gol. S (E)

On coule 5 nouvelles poutrelles pour

184

D
Plafond

Batiment

Battu

Chitron Vat

Porte des Elephants

Sud

N
S
Porte
E

préparer 5 nouvelles travées de plaques moulées.

Actuellement 36 travées sont en place soit un nombre total de 144 dalles moulurées déjà posées.

On a terminé la dépose de toutes les assises de l'édicule B (en rouge p. 179)

On décape le sol pour le rendre régulier en remplaçant de béton les creux qui s'étaient formés par l'affaissement du sous-sol avant de venir placer les premières assises de libage et le dallage intérieur.

mardi 1 mars

Tout le soubasse-

ment et les piliers en rouge ci-contre ont été déplacés et déposés au N → S


palan à proximité pour reprendre les parties basses et resserrer les joints des assises déplacées par un affaissement du sous-sol

Des fragments de Voûte qui manquent ainsi que des morceaux de frontons décorés de bas-reliefs retrouvés dans les déblais à proximité pourront être remontés en place et compléter cet ensemble architectural.

Mercredi 2 mars

Chitron Vat

La Sécheresse a fait reculer au Nord Douve Ouest. — de la chaussée occidentale et à l'Ouest

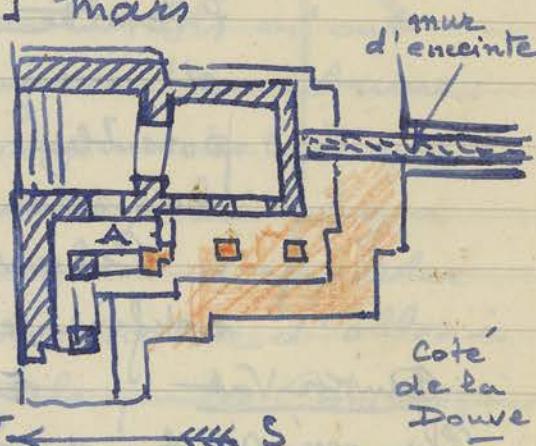

(3) 2.90

Fouwarde du personnage moyen une pierre qui a reçu
une ébauche de sculpture : tête
sur un de cubique

185



1.20

< 0.60 >

Prah Pithu - On égalise le sol par du

remblai aux endroits où des

Pr. Pithu depressions interrompent encore
le passage de la chaussée sur la douve Sud
des Temples T U et X de ce groupe.

Attentat - Je suis avisé que le Camion citernes des
Vietminh (?) Oravaux Publics avait été arrêté à 2 kilom à
l'Est de la douve Ouest du Wat et
l'Ouest le train arrière incendié, sur la route qui
va au Terrain d'aviation. Pas d'accident
de personnes. Les assaillants, Vietminh,
étaient au nombre de trois +

Jeudi 3 mars

Batkhein - Pose de la première assise inférieure de
bâtiage sur le renforçoir en béton destiné
à donner à cette assise l'horizontalité
et le niveau primitif - édicule B (p. 179)

Wat Ouest - Un certain nombre de fûts de

colonnes avec leur base et chapiteaux

(ces colonnes sont en 3 morceaux)

gisant dans la douve Sud à
proximité du parement du mur
de l'avancée du personnage Sud je
decide de les faire sortir de l'eau
pour essayer de les remonter en
bordure de la chaussée. Je rappelle que

ces colonnes rondes supportaient le naga
balustrade qui autrefois bordait cette
chaussée par l'intermédiaire

des 2 blocs A et B ci contre

Ce rebord est aujourd'hui

1


2

1

2

B

A

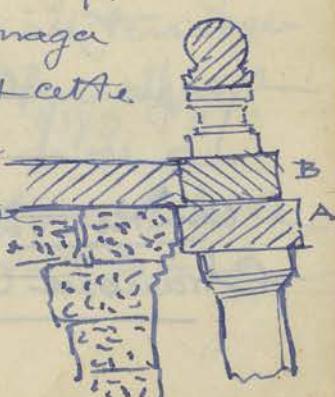


186

Tombé à peu près sur toute la longueur de la chaussée.

Vendredi 4 mars.

Palais Royal

Terrasse d'honneur

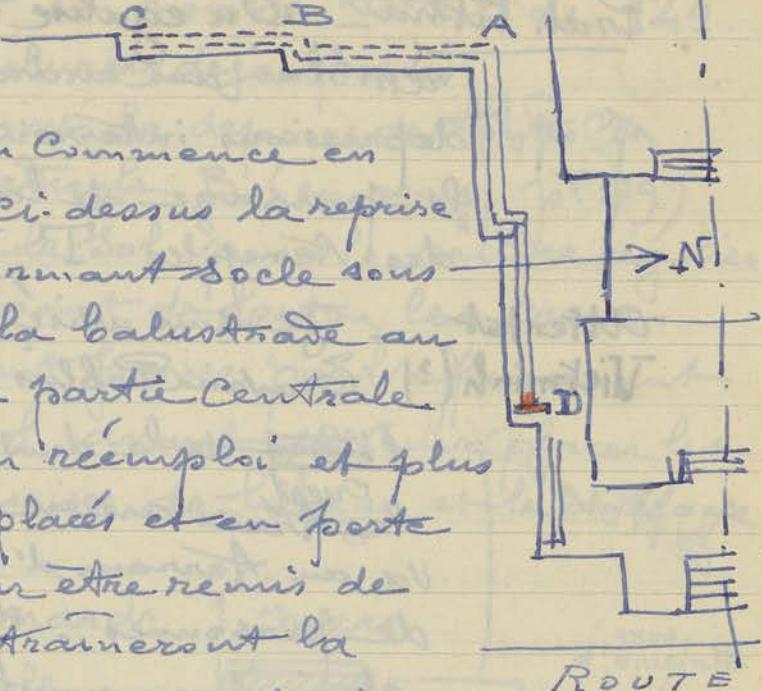

On commence en

A B C ci-dessus la reprise
des blocs formant socle sous
le naga de la balustrade au
Sud de la partie centrale.

Ces blocs en réemploi et plus
ou moins déplacés et en place
à faire pour être remis de
niveau entraîneront la
dépose et resserrement des

oints du mur de soutènement de la
Terrasse d'honneur sur lequel ils
reposent : ayant retrouvé plusieurs
morceaux des têtes du naga balustrade
je les fais replacer sur la base D ci-
dessous (en rouge)

Samedi 5 mars

Ainkor Vat

Porte Sud des Eleph's

— On a remonté les dalles du
soubassement et les 2 piliers
qui avaient été déposés à l'angle
extreme Sud de la façade Ouest
(voir croquis p. 184)

On s'occupe maintenant de
remonter les pierres d'architraves
et de demi-voutes qui pourront
être récupérées dans les déblais pour
compléter cet ensemble.

Ainkor Vat


Chaussée Ouest

On a sorti des douves et
remonté sur le dallage du

A
J
Porte Sud
Eleph's

A
T
el.
O
H
B
AK

person Central Surt des fragments des
Corps de lion qui ornaient de chaque
Côté le dit person A et B ci-
contre; on décape et prépare le-
sol en G à la base du mur en

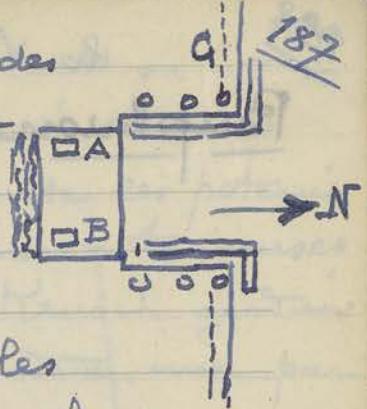


182

parment Sud pour remonter les
fragments de colonnes retrouvé dans la
doune à cet endroit (Bas de la p. 185)

Batkheli - 4 assises sont déjà reposées de l'édicule
B (p. 179) en cours de reconstruction. En
même temps on entasse les blocs sculptés
et moulurés qui encombraient ce 5^{me} gradin
de la pyramide sur la façade Est pour les
reporter sur les autres façades où ils seront
moins encombrants, et notamment pour
laisser la vue libre dans l'angle Sud Est
sur le temple d' Ointor Vat qui est un des
attrait des ~~coûts~~ Batkheli.

Je fais ranger certains de ces blocs à l'empla-
cement des bases de murs des édicules d'angles
Sud Ouest et Nord Ouest, autour du pinger
qui seul à l'heure actuel
garde le souvenir de chacun
de ces temples. Le
même travail avait
déjà été exécuté aux
édicules d'angles Sud Est et Nord Est (Voir
p. 164)



S → N

Lundi 7 mars.

Monument 487 - L'équipe qui travaillait au terrasse-
ment de la piste du Trah Tithu ayant
terminé son travail, a été mise à
faire une piste d'accès automobile
analogue entre la route de la Porte de

H 87

188

La Victoire et le temple 487 dit Mongolanthha
Baphuon - Le remontage des
 blocs sculptés et moulurés provenant du
 soubassement à l'Est
 du perron Central nord
 du 3^{me} étage a dû être
 interrompu, partie de
 retrouver dans les débris
 toutes les pierres qui
 constituaient le parement
 de ce soubassement. (Voir p. 176 en haut.
 et Croquis p. 129 en haut)

Voici l'état actuel de ce chantier
 à la date de ce jour.

Zone A (immédiatement à l'Est du
 perron Central) - 5 assises placées soit une
 hauteur de 2^m 30

Zone B - 4 assises - hauteur de 3^m 90

Zone C - 3 assises - hauteur de 1^m 42

Zone D - 2 assises - hauteur de 1^m 00

Quelques blocs moulurés sont prêts
 à reprendre leur place dès qu'on pourra
 remonter les intervalles dont les pierres
 n'ont pu être retrouvées.


Mardi 8 mars.

Conservation
Pteah Thma

Passé une partie de la journée à
 terminer le classement des débris
 de toutes sortes ramenés du Dépot
 d'Orkor Thom. (p. 97 en bas)

Toutes les poteries, tessons, fragments
 tuiles, etc sont placés sur les rayons
 étagés de l'ancien bureau et de la
 petite salle au Nord - et un grand

Pottery

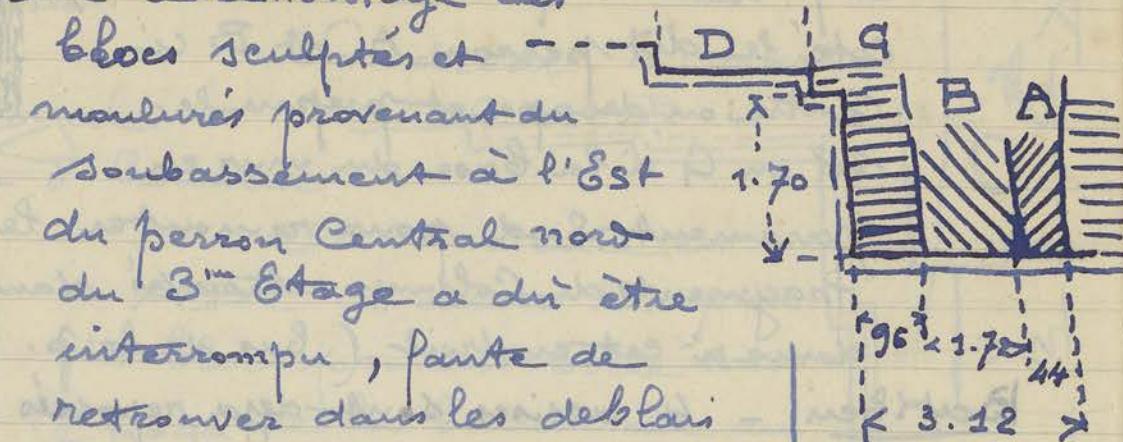

189

Résumé
nombre de fragments moins importants on
faisons double emploi seront placés dans des
caisses ; mais je constate que toutes ces poteries
n'ont du jamais être nettoyées sont terreuses
et sales. - Je recommande à Kusch gardien
de la pagode Thma, de les reprendre une par
une en les lavant, broasant, etc pour qu'on
puisse les manipuler sans se ~~faire~~ salir
les mains, ce qui est le cas présentement.

Mardi 9 mars.

Palais Royal

Terrasse d'honneur

Les fragments de têtes du naga
d'about réconstitués sur la balustrade.

Travée Sud (D sur le schéma p. 186)
après tâtonnements et essais s'avèrent
faire partie de plusieurs nagas d'about
et ne se raccordent que très mal.

Je laisse donc seulement dans cette
réconstitution, le morceau inférieur, le
ventre du naga - et tous les morceaux
supérieurs sont enlevés.

F.R.
Le Caporal ayant retrouvé plusieurs
fragments de corps de naga balustrade
au Nord de la Terrasse d'honneur
cherche à les utiliser pour une
réstitution. Cette partie centrale de
la Terrasse d'honneur a dû être
tellement remaniée qu'il est difficile
de s'y reconnaître dans les débris sculptés
qui gisent un peu de tous côtés.

Jeudi 10 mars

Baphuon - Une pierre en surplomb de la
Gopura 3 Est corniche de la façade Ouest de ce

Gopura présentant quelque danger,
cette pierre étant justement placée au

W.M.

190

dessus de la fenêtre qui sert de passage aux visiteurs (l'accès axial ayant été interdit) — en A Ci-contre

je fais enlever

une énorme racine


qui avait déplacé

cette pierre : à la suite

de quoi on a pu la

remettre en place en

supprimant le danger de chute.



passage provisoire
accès interdit AXEE-O
pour cause de danger

mais il est évident que ce gopura 3 Est montre une dislocation générale des pierres qui exigerait une reprise et consolidation de toutes les masonrys.

Tout ce qui reste encore debout du Baphuon est d'ailleurs dans un état similaire d'instabilité.

Batkhen

On replace sur l'édicule en reconstruction B (p. 179) la huitième assise qui correspond à la moulure supérieure du Reg de Chausée formant Terrasseon de l'étage suivant.

Issarak (?)

En arrivant à la Sala d'Oñiz Thom je constate que la borne Kilométrique sur le bord de la route qui contourne la face Ouest du Bayon à environ 50^m avant d'arriver à la susdite Sala a été renversée. Les Coulis avaient vu cette borne encore debout la veille au soir et l'ont vue renversée en arrivant ce matin au chantier. Le fait s'est donc passé pendant la nuit.

Oñizor Vat. — Le chef de quartier du Bungalow des Paes de Sud m'aimes (un garde national) me demande

l'autorisation de laisser ^{de laisser} l'établir des paillottes pour vente de boissons alcooliques pendant les fêtes d'incinération qui doivent avoir lieu dans quelques jours à la pagode Sud.

191

L'emplacement choisi est sur l'esplanade au Sud du monument (en rouge Ci-contre); après examen des lieux sur place j'autorise ces constructions de paillottes sur cet emplacement sur une largeur de 6^m 00 maxima et une longueur Est-Ouest de 30^m maxima avec condition que ces constructions auront un caractère provisoire et disparaîtront sans laisser de traces aussitôt après la fête qui doit durer 5 jours.

Il m'est donné comme explication que ces débits qui doivent distribuer des alcools sont interdits sur le Terrain réservé à la pagode.

Vendredi 11 mars.

Monks Vat
Porte Sud des
Elephants

On a remonté les architraves à sur les piliers remis en place de la Verandah Ouest (extrémité Sud) - Voir




Croquis Schéma p. 184 - 2 pierres de la ½ Voute ont été remplacées sur cette architrave, mais la 3^e celle qui vient s'encastrer dans le mur opposé (3 ci-dessus) n'a pas été retrouvé, sauf pour un fragment. Il faudra donc venir consolider en béton armé le triâtre (en Célon ci-dessus) pour donner un pendage stable aux assises 1 et 2.

Le ½ fronton décoré sur les 2 faces de

192 / Ces reliefs a été remonté complètement par le maz.
Ceau Central retrouvé C'est ce 1/2 fronton qui
ferme au Sud l'ouverture de la 1/2 route.
Le morceau inférieur étant cassé, une poutre
en béton armé viendra soutenir ce fronton.

Diorvat. On commence à regrouper ensemble les
Chaussée Ouest débris, très corrodés du

sang retiré de la dague sur
l'avancée médiane de la
chaussée au Sud, en A ci-dessus



Une colonne, en 3 morceaux a été
remontée contre le parement de soutien-
ment Ouest de cette avancée Sud en
B ci-dessus.

Samedi 12 mars

Opération de
Nivellement.

Ayant reçu de Saigon le niveau de
Chantier (type reconstruction) semblable à
celui utilisé par l'Ingénieur des T.I.

(cf. J.de F. XIX p 125) je lui
demande son opérateur pour
venir à la Conservation nous montrer
le maniement du dit appareil.

Sioum - qui a déjà, me dit-il, une
certaine habitude de cet instrument,
et le nouveau dessinateur assistant
à cette démonstration. Cet appareil
paraît assez simple, le plus délicat
est la mise en station pour régler
la lunette et le niveau au moyen
des vis calantes.

On décide d'aller sur le Terrain le
lundi matin faire un essai sur la
piste que l'on exécute au nord du
temple 487.



